



### **Bilag 3 Status på ibrugtagning og økonomi**

I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2013, blev udvalget præsenteret for Teknik- og Miljøforvaltningens ambitioner på anlægsområdet samt for, hvordan forvaltningen følger op på anlægsporføljen.

Som strategien beskriver, vil Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet blive orienteret om status på anlægsporføljen. Dette bilag skal derfor ses i direkte forlængelse heraf.

Bilaget gør status på anlægsporføljen samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre "Ibrugtagning" og "Økonomi".

Anlægsstrategien indeholder en målsætning om:

- at mindst 90 % af forvaltningens anlægsprojekter overholder det projekterede ibrugtagningstidspunkt samt
- at mindst 95 % af projekterne overholder budgettet eller højst overskrider budget med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget.

For de to parametre Ibrugtagning og Økonomi er der defineret følgende kategorier.

<b>Farve</b>	<b>Ibrugtagningstidspunkt</b>
Grøn	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overholdt
Gul	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med 1-6 mdr.
Rød	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med mere end 6 mdr.

<b>Farve</b>	<b>Budget</b>
Grøn	Budgettet forventes overskredet med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget.
Gul	Budgettet forventes overskredet mellem 1-5 mio. kr. eller op til 10 % af det korrigerede budget.
Rød	Budgettet forventes overskredet med over 5 mio. kr. eller mere end 10 % af det korrigerede budget.

**Sekretariat (Byens Fysik)**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

Mobil  
2937 3157


E-mail  
EF0G@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.<sup>1</sup>

På baggrund af kategoriseringen har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet to figurer, som gør status på anlægsporteføljen i forhold til de to parametre.

**Figur 1.1 Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget**




Figur 1.1 viser, at i ingen af de ikke-ibrugtagne, aktive anlægsprojekter forventes budgettet overskredet med mere end 5 mio. kr. eller med mere end 10 % af det korrigerede budget. I forhold til økonomioverskridelser forventes forvaltningen at overholde budgettet for 100 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter.

---

<sup>1</sup> De angivne kriterier for grøn, gul og rød, som modsvarer TMFs mål, er skrapere end de krav, som Økonomiforvaltningen har på anlægsområdet. Økonomiforvaltningens kriterier er følgende: Grøn – Budgettet forventes overskredet med op til 10 mio. kr. eller op til 15 % af budgettet. Gul – Budgettet forventes overskredet mellem 10-20 mio. kr. eller 16-25 % af budgettet. Rød – Budgettet forventes overskredet med mere end 20 mio. kr. eller over 25 % af budgettet.

## Opfølgning på Ibrugtagning

**Figur 2.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning**

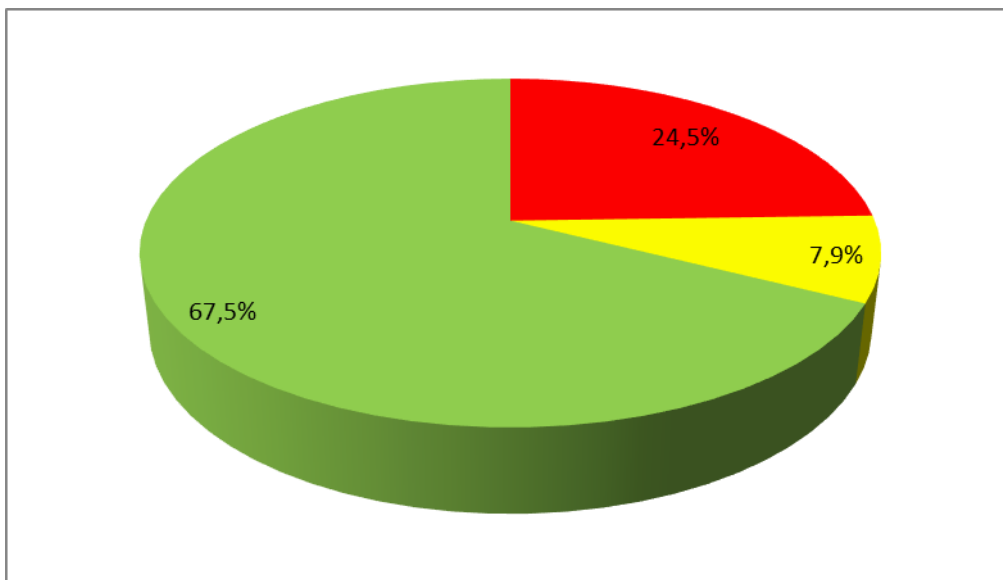

Figuren viser, at i 24,5 % (svarende til 102) af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 måneder.

På nuværende tidspunkt forventes det, at 67,5 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

- Overskridelsen af ibrugtagningstidspunktet på 52 (51 %) af de 102 projekter skyldes forhold defineret som "eksterne faktorer". Eksterne faktorer omfatter forhold, der som udgangspunkt er uden for forvaltningens kontrol. Der kan eksempelvis være, hvis de indkomne bud ikke er konditionelle, at forvaltningen ikke selv er bygherre på projektet, at ekstern myndighedsbehandling har trukket ud eller, at der er tvister med entreprenører. Teknik- og Miljøforvaltningen forsøger gennem målrettet og rettidig dialog og hensigtsmæssig eskalering til passende ledelsesniveau at imødegå ovenstående forhold.
- For de resterende 50 projekter gælder, at fem er forsinket som følge af "ændret politisk ønske", fire skyldes "projektændringer", 18 skyldes "koordinering med andre projekter", typisk med afsæt i totaløkonomiske og fremkommelighedsmæssige hensyn og 16 skyldes "interne faktorer". Endelig er syv forsinket som følge af "tidsplan for optimistisk". Med andre ord forhold som forvaltningen til en vis grad selv kan styre. Forvaltningen forsøger dog at imødegå problemerne med "koordinering med andre projekter" ved at identificere disse behov allerede i budgetnotatfasen,

samt at fortsætte de formaliserede møder med HOFOR vedr. koordinering af projekter. Koordineringsindsatsen styrkes desuden som konsekvens af anlægsanalysen 2016.

Nedenstående Tabel I.1 viser forvaltningens røde projekter fordelt på årsagsforklaring

**Tabel I.1 Projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter)**

<b>Projekt navn</b>	<b>Årsagsforklaring - kategori</b>
Amagerbrogade 1. etape	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	eksterne faktorer
Amagerbrogade, klimasikring	koordinering med andre projekter
Baldersgade-karreen 2	eksterne faktorer
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	interne faktorer
Bemandet legeplads i Mimersparksen	interne faktorer
BK 246 Dannevirkegade	eksterne faktorer
BK0983 Otto Mallings Gade	eksterne faktorer
BK1411 Svenskelejren	eksterne faktorer
Blåmejsvej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	eksterne faktorer
BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé	koordinering med andre projekter
Busheller	projektændring
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	eksterne faktorer
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	interne faktorer
CP - CFA - Husumforbindelsen	koordinering med andre projekter
CP IV - Nordhavn Station	eksterne faktorer
CP V - Cykelrute Amagerbanen	koordinering med andre projekter
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	projektændring
CP VI - Grøndalsruten	interne faktorer
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	koordinering med andre projekter
CP VI - Parkeringsforhold	interne faktorer
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	eksterne faktorer
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	ændret politisk ønske
CP VII - Rantzausegade, trafikafredeliggørelse	koordinering med andre projekter
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	interne faktorer
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	ændret politisk ønske
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	koordinering med andre projekter
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	eksterne faktorer
Enghave Brygge	eksterne faktorer
Engvej 172 - 178 m.fl.	eksterne faktorer
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	interne faktorer
Frederiksborggade BK0473	eksterne faktorer
Frederikssundsvej 27	eksterne faktorer
Gammel Jernbanevej 4-6	eksterne faktorer
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	tidsplan for optimistisk
Gothersgade 105	eksterne faktorer

Grøndals Å - Genåbning	ændret politisk ønske
Harrestrup Å, klimatilpasning	ændret politisk ønske
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	eksterne faktorer
Hørsholmsgade 24 - 25	eksterne faktorer
Ingerslevgade 192 - 198	eksterne faktorer
Ingerslevgade 112 / Godsbanegade 31	eksterne faktorer
ITS - Grøn mobilitet	eksterne faktorer
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	eksterne faktorer
K 09/002 BK1416 Cityringen	eksterne faktorer
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	eksterne faktorer
Kirkevænget BK 1398	eksterne faktorer
Kornblomstparken	eksterne faktorer
Kornblomstvej, aktivitetspark	eksterne faktorer
Langebrogade 5-5A	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	eksterne faktorer
Mindre sager - Metrohave	eksterne faktorer
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	eksterne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	interne faktorer
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	eksterne faktorer
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	ændret politisk ønske
Prinsens bro	projektændring
Renovering af Nordhavn Station	eksterne faktorer
Ryesgade 25 A-D	eksterne faktorer
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	projektændring
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	koordinering med andre projekter
Toilet ved Christmas Møllers Plads	eksterne faktorer
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	eksterne faktorer
Træer Herlufs Trolles Gade	koordinering med andre projekter
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	interne faktorer
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	interne faktorer
Udendørs dansescene v. Havneparken	eksterne faktorer
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	tidsplan for optimistisk
Webersgade 13 / Sølvgade 96	eksterne faktorer
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	interne faktorer
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	eksterne faktorer
Rantzausgade 39 m.fl.	eksterne faktorer
Korsgade 4	eksterne faktorer
Blågårdsgade 30 - 30 A	eksterne faktorer
Ny Carlsbergvej 13 m.fl.	eksterne faktorer
Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	eksterne faktorer
Vibevej, byrum	tidsplan for optimistisk
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	eksterne faktorer
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	eksterne faktorer
Herman Bangs Plads, Byrum	tidsplan for optimistisk
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	tidsplan for optimistisk
Aktivitetspark i Scandiagade	eksterne faktorer

Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	interne faktorer
Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	eksterne faktorer
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	koordinering med andre projekter
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	interne faktorer
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	koordinering med andre projekter
CP 2016 - Helsingørruten	eksterne faktorer
Bedre fremkommelighed i Bredgade	tidsplan for optimistisk
Hekla Park, kunstgræsbane	eksterne faktorer
Thomas Laubs Gade 5-9	eksterne faktorer
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	koordinering med andre projekter
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	koordinering med andre projekter
Busfremkommelighed, linje 6A	koordinering med andre projekter
Bedre fremkommelighed på vejnettet	interne faktorer
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	koordinering med andre projekter
Enghaveparken, boder (OMF)	koordinering med andre projekter
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	tidsplan for optimistisk
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	interne faktorer
