



### Bilag 3 – Status på ibrugtagning og økonomi

I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2013, blev udvalget præsenteret for Teknik- og Miljøforvaltningens ambitioner på anlægsområdet samt for, hvordan forvaltningen følger op på anlægsporteføljen.

Som strategien beskriver, vil Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet blive orienteret om status på anlægsporteføljen. Dette bilag skal derfor ses i direkte forlængelse heraf.

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre 'Ibrugtagning' og 'Økonomi'.

Anlægsstrategien indeholder en målsætning om:

- at mindst 90 % af forvaltningens anlægsprojekter overholder det projekterede ibrugtagningstidspunkt samt
- at mindst 95 % af projekterne overholder budgettet eller højst overskrider budget med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget.

For de to parametre Ibrugtagning og Økonomi er der defineret følgende kategorier.

Farve	Ibrugtagningstidspunkt
Grøn	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overholdt
Gul	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med 1-6 mdr.
Rød	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med mere end 6 mdr.

Farve	Budget
Grøn	Budgettet forventes overskredet med op til 1 mio. kr. eller op til 5 % af det korrigerede budget.
Gul	Budgettet forventes overskredet mellem 1-5 mio. kr. eller op til 10 % af det korrigerede budget.
Rød	Budgettet forventes overskredet med over 5 mio. kr. eller mere end 10 % af det korrigerede budget.


Kategoriseringen og farveskemaet følger den form som Økonomiforvaltningens Fast Track rapportering har, men varierer herfra i selve kriterierne.<sup>1</sup>

På baggrund af kategoriseringen har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet to figurer, som gør status på anlægsporteføljen i forhold til de to parametre.

Til sidst i bilaget findes en tabel, som oplister de anlægsprojekter, der har markante (røde) overskridelser i forhold til Ibrugtagning.

### Opfølgning på Ibrugtagning

**Figur 1.1 Forventet ibrugtagning i forhold til oprindelig beslutning<sup>2</sup>**

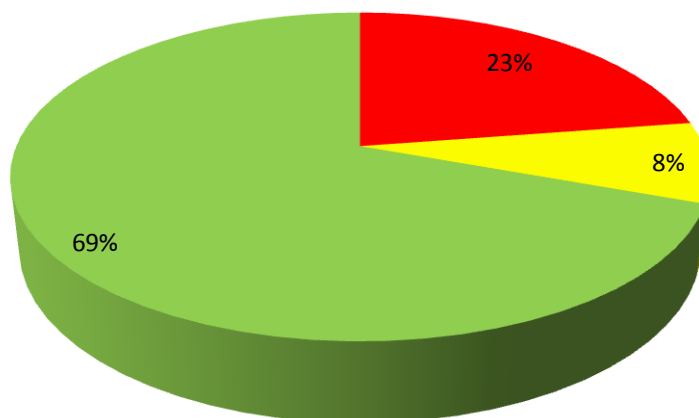


Figuren viser, at i 23 % af de aktive, ikke-ibrugtagne, anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt overskredet med mere end 6 måneder. På nuværende tidspunkt forventes det, at 69 % af alle projekter ibrugtages indenfor strategiens kriterier.

<sup>1</sup>De angivne kriterier for grøn, gul og rød, som modsvarer TMF's mål, er skrapper end de krav, som Økonomiforvaltningen har på anlægsområdet.

Økonomiforvaltningens kriterier er følgende: Grøn – Budgettet forventes overskredet med op til 10 mio. kr. eller op til 15 % af budgettet. Gul – Budgettet forventes overskredet mellem 10-20 mio. kr. eller 16-25 % af budgettet. Rød – Budgettet forventes overskredet med mere end 20 mio. kr. eller over 25 % af budgettet.

<sup>2</sup> Kongruent med Fast Track rapporteringen er de inkluderende projekter, projekterne som er ikke-ibrugtagne og aktive (Jf. Økonomiforvaltningens anlægsoversigt).

**Figur 2.1 Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget**



Figur 2.1 viser, at i ingen af de ikke-ibrugtagne, aktive anlægsprojekter forventes budgettet overskredet med mere end 5 mio. kr. eller med mere end 10 % af det korrigerede budget. I forhold til økonomioverskridelser forventes forvaltningen at overholde budgettet for 100 % af de aktive, ikke-ibrugtagne anlægsprojekter.

**Tabel 1.1 Projekter med markante overskridelser (tid)**

Projekt navn	Forklaring
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	interne faktorer
Amagerbrogade 1. etape	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade, klimasikring	koordinering med andre projekter
BP - Husum St., ny stibro	tidsplan for optimistisk
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	koordinering med andre projekter
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	interne faktorer
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	interne faktorer
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	eksterne faktorer
CP IV - Farumruten	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	koordinering med andre projekter
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	tidsplan for optimistisk
CP IV - Nordhavn Station	eksterne faktorer
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten,	interne faktorer

Frederikssundvej	koordinering med andre projekter
CP V - Gasværksvej	ændret politisk ønske
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	interne faktorer
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	interne faktorer tidsplan for optimistisk
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	eksterne faktorer
CP V - St. Kongensgade	koordinering med andre projekter
CP V - Udbedring pba. Giv et præj (Cykeltip)	interne faktorer
CP VI - Grøndalsruten	interne faktorer
CP VI - Jernbane Alle	koordinering med andre projekter
CP VI - Kronprinsessegade	koordinering med andre projekter
CP VI - Værnedamsvej	eksterne faktorer
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	projektændring
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	tidsplan for optimistisk
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	tidsplan for optimistisk
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	interne faktorer
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	ændret politisk ønske
Erstatningsparkeringspladser	eksterne faktorer
Flintholm station	eksterne faktorer
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	projektændring
Frederiksborggade BK0473	eksterne faktorer
Frederiksgården/Blytækkervej 2	eksterne faktorer
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	ændret politisk ønske
Frederiksholmsløbsbroen	interne faktorer
Frederikssundsvej 27	eksterne faktorer
Gammel Jernbanevej 4-6	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	eksterne faktorer
Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	projektændring
Grønnegade	eksterne faktorer
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	interne faktorer
Hastighedsplan 2009-2012	eksterne faktorer
Hastighedszoner Nørrebro	eksterne faktorer
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	koordinering med andre projekter
Kirkevænget BK 1398	ændret politisk ønske
Klima - ladestandere til elbiler	eksterne faktorer
Kornblomstparken	interne faktorer
Kornblomstvej, aktivitetspark	koordinering med andre projekter
Kunstgræsbaner Amager og Husum	eksterne faktorer
Kvæsthøsmøllen(Sankt Annæ Projektet)	eksterne faktorer

Ladcykelparkering (CP Ø)	interne faktorer
Langebros, åbning af p-anlæg	interne faktorer
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	ændret politisk ønske
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	eksterne faktorer
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	eksterne faktorer
Mimersgade BK0189	ændret politisk ønske
Nordhavnsvejen	koordinering med andre projekter
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	højere licitationstilbud end budget
Ny Østergade, træplantning mm.	interne faktorer
Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer	ændret politisk ønske
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	eksterne faktorer
P. D. Løvs Allé 6-8	eksterne faktorer
P-deklaration	ændret politisk ønske
P-henvisningssystem /ITS BU	koordinering med andre projekter
Prinsessegade - Trafiksanerering	projektændring
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	eksterne faktorer
Renovering af kørebaner og fortove	eksterne faktorer
Ryesgade 25 A-D	eksterne faktorer
Sankt Hans Gade BK 0956	ændret politisk ønske
Sikre skoleveje, pakke 2013-II	interne faktorer
Skråparkering	interne faktorer
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	eksterne faktorer
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	koordinering med andre projekter
Stibro over Inderhavnen	konkurs
Støjreduktion - asfalt - Amager	interne faktorer
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	koordinering med andre projekter
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	ændret politisk ønske
Tilskudsdeklaration	interne faktorer
Tofttegårds Allé 20-22	eksterne faktorer
Trafiksanerering - Holmen	koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	eksterne faktorer
Turistskilte indre by	ændret politisk ønske
Udendørs dansescene v. Havneparken	eksterne faktorer
Webersgade 13 / Sølvgade 96	eksterne faktorer
Åboulevarden - forundersøgelse	interne faktorer
