


# Anlægsstatus pr. 16. november 2012

Afrapporteringen dækker perioden august, september og oktober 2012. Projektoverblikket viser et øjebliksbillede af status på igangsatte byggeprojekter i BUF's regi.

# Anlæg


## Byggeprojekter ibrugtaget status 16.11.2012

Adresse	Pladser/spor	Bemærkninger
Fensmarksskolen	1 basislokale	Udvidelse af kapacitet
Bellahøj Skole	2 basislokaler	Udvidelse af kapacitet ved ombygning af to edb-lokaler til basislokaler og etablering af trådløst netværk.
Husum Skole	Profil	Etablering af matematisk/naturfaglig profilskole
Laurasvej 14	8 dagplejepladser	Etablering af nye pladser i flerbørnsdagpleje. Pladserne er taget i brug som planlagt
Vestre Fælledvej 100	7 grupper	Den permanente institution er taget i brug i august måned 2012 og den midlertidige pavillon som har været brugt til tidlig opstart siden efteråret 2011 er nedlagt. Pladserne er taget i brug som planlagt.
Nyborggade X (tidligere Sionsgade x)	10 grupper	Tidlig opstart med 10 grupper i midlertidige pavilloner. Den tidlige opstart skal fungere frem til den permanente nye institution i Nyborggade 23 er etableret. Den permanente institution indeholder 20 grupper og forventes ibrugtaget i januar 2014.
Øresundsskolen	1 basislokale	Udvidelse af kapacitet ved mindre ombygninger
Saxogade 104A	141 fh. pladser	Del af større rocade mellem institutioner på Vesterbro. Pladserne er taget i brug i etaper.
Centerparken 20	24 vg og 20 bh	Udvidelse af børnehuset Mælkebøtten med 3 grupper
Emdrupvænge 194/Kjeldsøvej 5	60 vg. og 110 bh.	Ny daginstitution med 10 grupper




## Nye projekter i perioden status 16.11.2012

Adresse	Pladser/spor	Bemærkninger
Christianshavns Skole	2 basislokaler	Udvidelse af kapacitet ved tidlig opstart af 2 klasser i midlertidige pavilloner. Forundersøgelser med henblik på permanent udvidelse af skolen er igangsat.
Ålekistevej 212	10 grupper	For at opfylde pladsgarantien etableres daginstitution med 10 grupper. Byggeriet er et nøglefærdigt byggeri med ekstern bygherre.
Hansted Skole	1 basislokale	Udvidelse af kapacitet ved tidlig opstart af 1. klasse i midlertidig pavillon. Permanente pladser skabes på sigt indenfor eksisterende fysiske rammer på skolerne i området.
Smedetoften 12/14		Forundersøgelser omkring mulighed for etablering af klubpladser
Klostervængets Skole		Etablering af idrætsprofil
Skolen på Islands Brygge		Forundersøgelse af muligheder for udvidelse med flere skolespor
Grønsdalsvænge Skole		Forundersøgelse af muligheder for udvidelse med flere skolespor
Christianshavns Skole		Forundersøgelse af muligheder for udvidelse med flere skolespor



## Projekter forsinket status 16.11.2012



Adresse	Pladser/spor	Bemærkninger
Bellahøjvej 48	5 grupper / 110 pladser	2 mdr. forsinket på grund af afklaring af parkeringsproblematik . Ibrugtagning rykket fra marts 2014 til maj 2014. Pladsgarantien kan opretholdes. En forsinkelse kan betyde, at afstanden mellem bopæl og institution vil øges for nogle børn, fordi etableringen af en institution i nærområdet bliver forsinket og børnene indskrives i en institution længere væk fra bopælen. Andre børn vil vente med at starte i daginstitution til den nye institution åbnes.
Gammeltoftgade 13	Sammenlægning /genhusning	Aflevering forsinket på grund af oversvømmelse af byggegrund samt arkæologiske fund. Der er tale om et projekt som udelukkende er genhusning, og forsinkelsen har derfor inden indflydelse på nuværende kapacitet eller på pladsgarantien. Ibrugtagning rykket fra marts 2013 til september 2013.




## Projekter opgivet status 16.11.2012

Adresse	Pladser/spor	Bemærkninger
Rejsbygade	10 grupper	Nøglefærdigt byggeri til daginstitution. Projektet er opgivet, da øvrig lejer i ejendommen har modsat sig daginstitutionsprojetet. De juridiske forhandlinger vedrørende projektet har været langvarige og der er derfor arbejdet med alternative muligheder sideløbende. Kapaciteten søges dækket via øvrige projekter.
Skolen i Peder Vedelsgade	1 basislokale	Afhjælpende foranstaltning i forhold til kapacitet. Der er fundet en alternativ løsning indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer.

# Tidslinje over ibrugtagning af daginstitutionspladser, status 16.11.2012

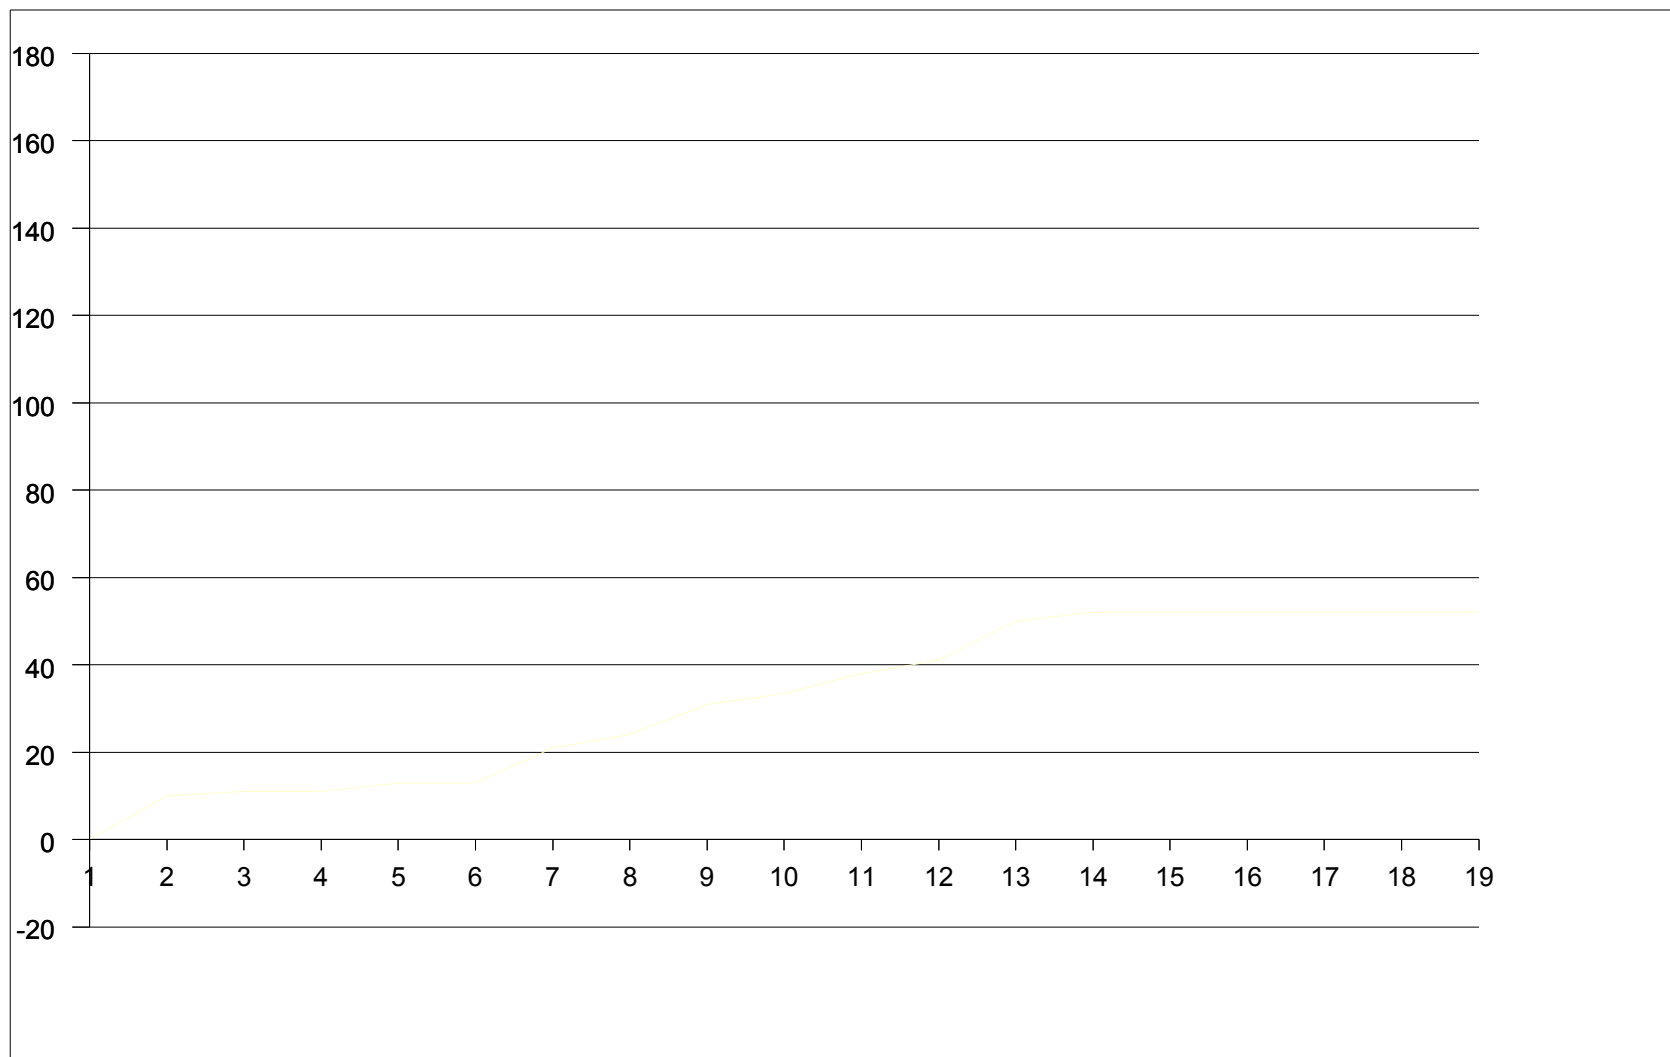

# Årsager til eventuelle forsinkelser/standsning af anlægssager



Nedenstående omhandler risikoelementer i forhold til anlægshastighed for byggeprojekter, som medfører forsinkelse i forhold til ibrugtagning af byggerier eller i enkelte tilfælde opgivelse af projekter. Listen er ikke udtømmende:

- Forhandlinger - Køb, lejekontrakter, nøglefærdigt byggeri m.m.
- Byggetekniske forhold – forurening, byggesagsbehandling, trafik, kloak, støj, bevaringsværdighed, fredning, lokal/kommuneplaner, arkitekturpolitik m.m.
- Interessenter – naboer, brugere, lokaludvalg m.m.
- Økonomi – fordyrelse pga af ovennævnte forhold eller for dyr i forhold til licitation m.m.
