



Notat

Afrapporteringer over helhedsrenoveringer på skoler

1. Kvartal 2021

Baggrund

I forbindelse med Coronaepidemien blev anlægsloftet for kommunerne løftet i 2020. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 31. marts 2020 blandt andet at genoptage/sætte gang i helhedsrenoveringer på følgende skoler:

- Hanssted Skole
- Nyboder Skole
- Heiberg Skole
- Strandvejsskolen
- Korsager Skole
- Strandparkskolen
- Tingbjerg Skole
- Bavnehøj Skole
- Blågård Skole
- Nørre Fælleds Skole
- Skolen i Peder Vedelsgade*
- Damhusengens Skole*
- Fensmarkskolen

* Peder Vedels Gade Skole er ikke en egentlig helhedsrenovering, men et mindre genopretningsprojekt, mens der i Damhusengens Skole tilfælde er tale om en skolesammenlægning/kapacitetsudvidelse. Der er også HHR midler i projektet - dog blev det besluttet at nedrive Hyltebjerg Skoles bygninger, i stedet for at renovere

Ovenstående helhedsrenoveringer blev besluttet i henholdsvis Budget 2017, Overførelsessagen 16/17 og Budget 18.

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2019 at udskyde en lang række byggeprojekter i København forårsaget af regeringens anlægsloft. Dette indebar også de helhedsrenoveringer, som var planlagt på skolerne. Processerne blev derfor stoppet, selvom enkelte helhedsrenoveringer allerede var opstartet på daværende tidspunkt.

Som følge af covid 19-epidemien besluttede regeringen i foråret 2020 imidlertid at hæve anlægsloftet, hvorfor Byggeri København atter kunne påbegynde planlægningen og eksekveringen af ovenstående projekter.

Forvaltningen vil løbende give en kvartalsvis status på fremdrift i disse sager til Børne- og Ungdomsudvalget.

1 februar 2021

Sagsnummer
2021-0007759

Dokumentnummer
2021-0007759-1

Administrativt Ressourcecenter
Kapacitet
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009380012

Afrapporteringens indhold

Af bilag 1 fremgår følgende oplysninger om hvert projekt:

- Hvilke fase processen og byggeriet befinder sig i
- Hvordan projektet forholder sig til tidsplanen
- Specifikke opmærksomheder

Derudover, vil der fremgå information om:

- Skolen
- Bevillinger
- Projektets omfang
- Genhusningsplaner

Status 1. kvartal 2021

Efter at arbejdet med alle projekter blev igangsat igen i 2020 befinder projekterne sig for nuværende i forskellige faser ift. planlægning og udførelse. Tidsplanerne er blevet opdateret på de fleste projekter (se bilag). Der er igangsat en dialog med alle de berørte skoler og har været opstartsmøder, hvor både Byggeri København og BUF har medvirket.

Generelt er det en stor opgave for alle parter at starte projekterne op – i udgangspunktet inden for den økonomi, der i sin tid blev besluttet. Byggeri København og Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID, som er bestiller på helhedsrenoveringerne) har ved fire af projekterne, som er længst fremme i planlægningen, Nørre Fælled Skole, Nyboder Skole, Hanssted Skole og Blågård Skole, vurderet, at der er behov for at søge ekstra midler, bl.a. til bygningsarbejder og genhusningsløsninger. Der bliver derfor søgt om midler i henholdsvis bygherrerereserven (til bygningsarbejder) og i Overførselssagen 20/21 (til genhusninger) til at dække disse ekstra udgifter.

For de øvrige HHR-projekter, der endnu ikke har afsluttet planlægningsfasen, kan der ligeledes være behov for finansiering fra Bygherrerereserven, og det vurderes sandsynligt, at det vil blive nødvendigt at indstille en udvidelse af bygherrerereserven ifm. Budget22.

Selve planlægningen af genhusningsopgaven er på mange skoler stadig undervejs, da der ikke i alle projekterne foreligger endeligt godkendte projekter.

Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet ved tidsplanerne, men på nuværende tidspunkt, har alle projekterne udarbejdet udkast til overordnet tidshorisonter for forventelig udførelse og færdiggørelse. Tre projekter er på nuværende tidspunkt frem mod april 2021 i udbud. Det drejer sig om Strandvejsskolen, Heiberg Skole og Korsager Skole.

Herunder forventelige tidsplaner for udførelse:

Skole	Forventet start på udførelse	Forventet aflevering
Bavnehøj Skole	1. kvartal 2021	1. kvartal 2023

Damhusengens Skole (skolen, ikke DI)	2. kvartal 2021	2. kvartal 2025
Nyboder Skole	4. kvartal 2021	1. kvartal 2023
Hanssted Skole	4. kvartal 2021	2. kvartal 2023
Blågård Skole	1. kvartal 2022	1. kvartal 2024
Nørre Fælled Skole	1. kvartal 2022	2. kvartal 2025
Guldberg Skole	2. kvartal 2022	4. kvartal 2024
Skolen på Peder Vedels-gade	3. kvartal 2022	3. kvartal 2023
Strandparksolen	3. kvartal 2022	3. kvartal 2023
Fensmark Skolen	4. kvartal 2022	Under afklaring
Korsager Skole	1. kvartal 2023	1. kvartal 2024
Strandvejsskolen	1. kvartal 2023	1. kvartal 2024
Heiberg Skole	1. kvartal 2023	1. kvartal 2024
Tingbjerg Skole	1. kvartal 2023	3. kvartal 2024

1. Februar 2021

Team Kapacitet
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Status

**Status på fremrykkede
helhedsrenoveringer af skoler**



**Overordnede projektledere:
ØKF, Byggeri København**


**Understøttende forvaltning:
Børne-og Ungdomsforvaltningen**

Proces og faser i helhedsrenoveringen



Proces: I en helhedsrenovering er processen, som i anlægssager, opdelt i flere faser. Projektstyringen omhandler; Økonomi, aftaleforhold, myndigheder og proces. Ansvar for dette er hos Byggeri København. Undervejs i processen, indgår BUF for at kvalificere projektet.

Herunder en illustration af faserne i en helhedsrenovering:

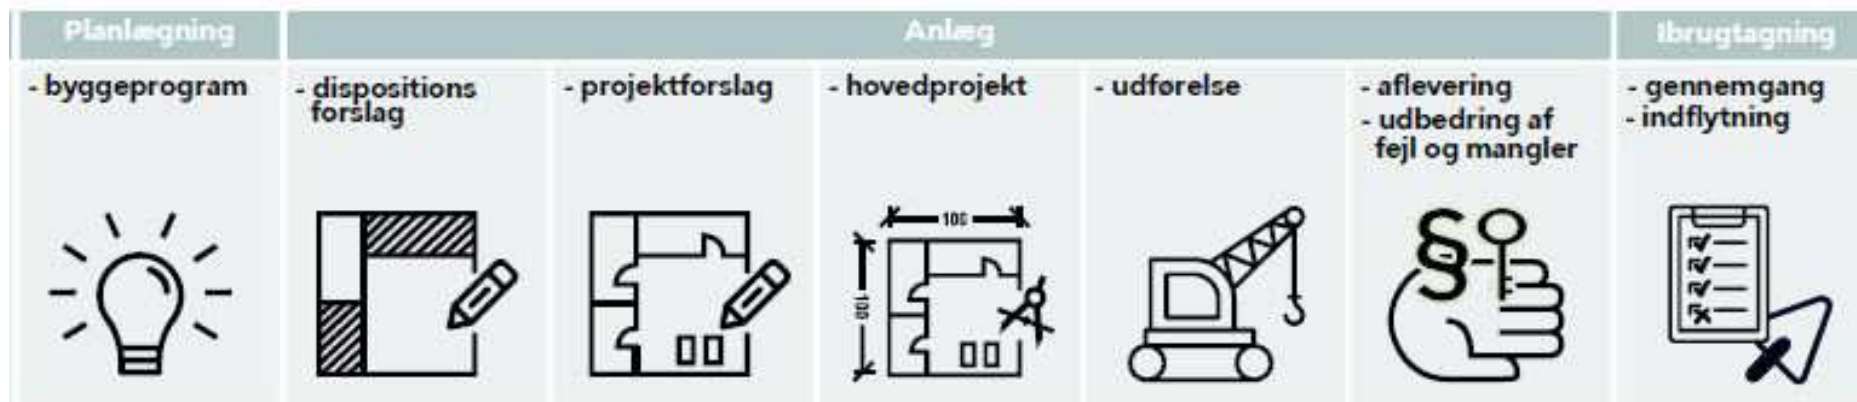

Tidsplan: Alle projekterne omfattet af dette statusnotat vil få tids- og procesplaner efterhånden som planlægningen kommer i gang. Ved denne status er der mange projekter, som stadig er i gang med opstart, hvorfor tids- og procesplanen ikke foreligger endnu. Det fremgår eksplicit under hvert projekt, hvor tids- og procesplanen foreligger.




Lokalforankring: Byggeri København har ansvaret for al kommunikation til brugerne ang. anlægsprocessen og renoveringen. Under processen vil BUF supportere ved at rammesætte projektet for brugerne og sikre relevant inddragelse af aktører. Foruden at bistå i de generelle forandringsprocesser, skal BUF sikre at processen for indflytning og genhusning tager hensyn til brugerne og den daglige drift af skolerne.



Opmærksomhedspunkter: BUF har stor erfaringen med renoveringer af skoler, og især hvordan processerne påvirker slutbrugerne. Derfor er der stor fokus på opmærksomhedspunkter og særlige forhold, som kan bliver udfordrende i processen. Herunder eksempelvis; interne flytninger, genhusning og løbende drift. Under helhedsrenoveringer kan der opstå mange spørgsmål fra skolens ledelse, skolebestyrelserne, forældre og politikere. I samarbejde med Byggeri København vil BUF løbende indsamle viden om processen, så der bedst muligt kan udarbejdes svar til de spørgsmål og bekymringer der måtte opstå.

Kort over skoler med fremrykkede renoveringsprojekter

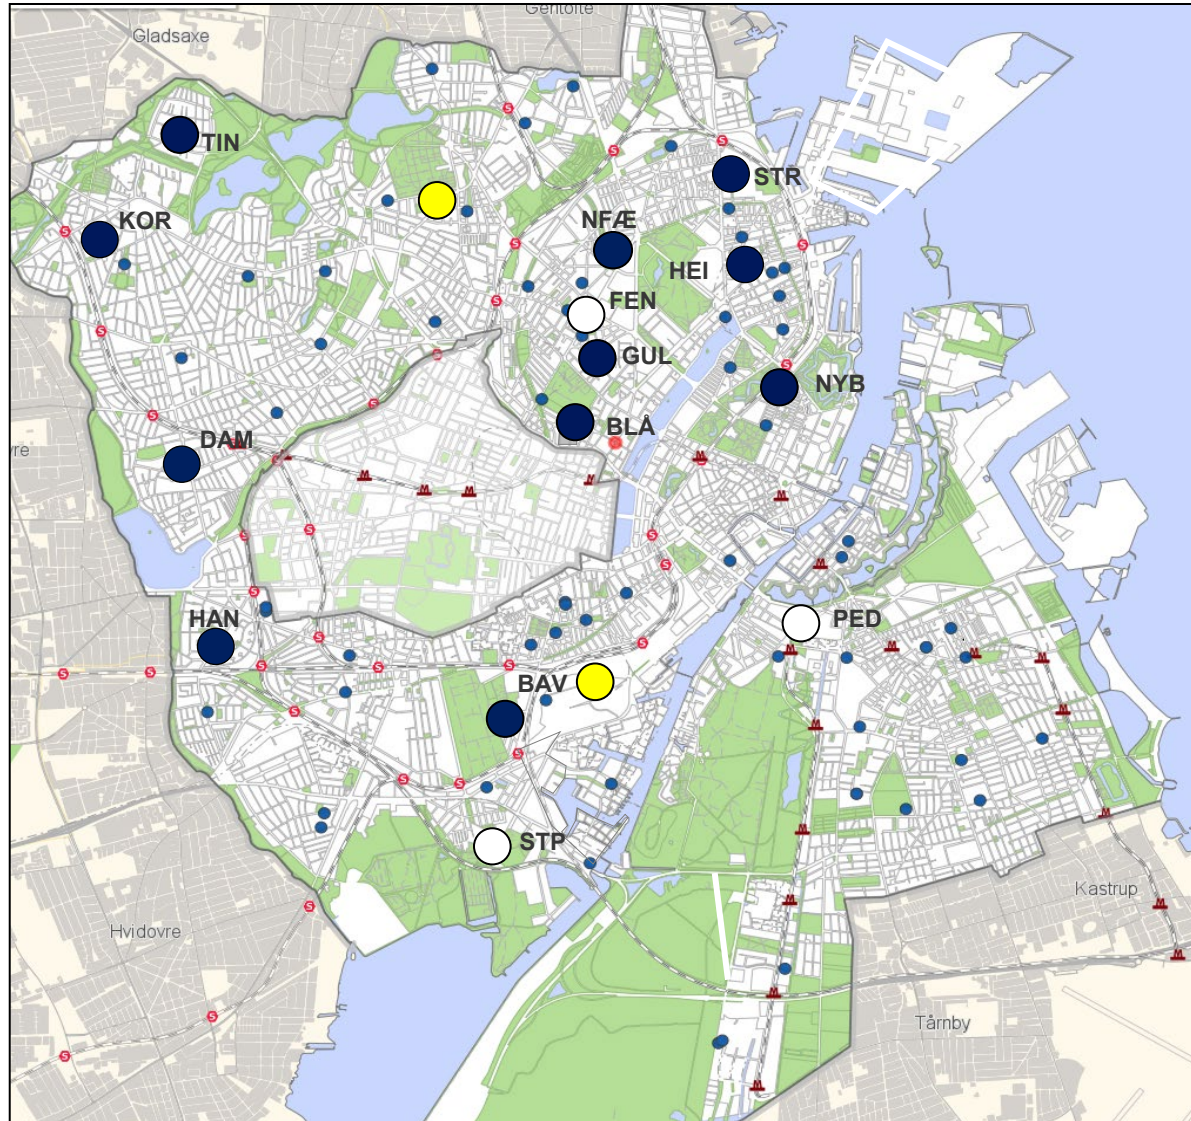

Projekter:

- Helhedsrenoveringer/Genopretningsprojekter
- Special skoler med fremrykkede renoveringsprojekter
- (Mulig genhusning)

Status på Helhedsrenoveringer

Grundprincippet for helhedsrenoveringer er, at skolerne skal renoveres og opfylde de nutidige funktionskrav.



Bavnehøj Skole

	<p>Hovedprojektet afsluttes ultimo 2020. Myndighedsandragende sagsbehandles i TMF</p>
	<p>Udførelsesfasen forventes opstartet 1. kvartal af 2021. Der arbejdes med fire etaper.</p> <p>Byggeperioden forventes afsluttet 1. kvartal 2023.</p> <p>Med udgangen af december afventer man stadig myndighedsbehandlingen. Det er derfor ikke muligt at sige noget nyt om opstart.</p>
	<p>BYK har sammen med BUF en dialog med skolen om projektet, byggeplads og genhusningsløsningen</p>
	<p>Keid udfører et mindre renoveringsprojekt koordineret med byggesagen. Skolebestyrelsen på Bavnehøj skole har kontaktet Borgmesteren ang. en tillægsbevilling til Helhedsrenovering.</p>


<p>Info om skolen:</p> <p>Nathalie Zahles Vej 9, 2450 Kbh SV Byggeår, 1930</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p> <p>Udvidelse af eksisterende fritidsinstitution</p>
<p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>103,4 mio. kr.</p> <p>OBS:</p> <p>Anlægsbevillingen er inkl. Tilførte midler fra bygherrereserven.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Genhusning løses via interne rokader</p>

Blågård Skole

	<p>Anlægsfasen er i gang:</p> <p>TRUST er i gang med disponering af HHR, madskole og byrumsprojekt i skolegårdene.</p> <p>Prioritering af renoveringsindsatser indenfor HHR er ved at blive fastlagt. I dialog med brugerne prioriteres indsatserne af moderniseringen.</p>
	<p>Projektering under udarbejdelse frem til efterår 2021. Færdigtegning af projekt og myndighedsbehandling efterår 2021 - primo 2022. Udførsel primo 2022-ultimo 2023. Ibrugtagning januar 2024</p>
	<p>Der er dialog om disponeringen i projektet. Dialogen om kommende genhusningsbehov forventes opstartet 1. kvartal 21.</p>
	<p>Byrumsprojektet i skolegården, er skabt i samspil med skybrudsprojektet Hans Tavsens Park(TMf). Der koordineres løbende mellem de to projekter for at sikre ét sammenhængende byrum til gavn for skole og borgere.</p> <p>Genhusningen af dele af skole som forventes løst i nærområdet. Der etableres en stiforbindelse som sikker skolevej mellem indskoling og fritidsinstitution Capella</p>





<p>Info om skolen:</p> <p>Hans Tavsens Gade 4, 2200 Kbh N Byggeår, 1895/1972</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR Madskole Byrumsprojekt Sti til sikker skolevej</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>117,6 mio. kr.</p> <p>OBS:</p> <p>Anlægsbevillingen er inkl. Bevillingen fra TMF (8,8 mio. kr.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsplan.</p>

Nørre Fælled Skole

	<p>Planlægningsfase:</p> <p>TRUST har opstartet sagen i oktober 2020 efter, at der blev afgivet anlægsbevilling til idrætshal og spiseområde ved budget 21. HHR-planlægningen er startet op igen, efter ændret bestilling uden kapacitetsudvidelse. I planlægningsfasen, prioriteres renoveringsindsatser og modernisering fastlægges.</p>
	<p>Færdiggørelse af planlægning samt dispositionsforslag pågår, forventes afsluttet i slutningen af marts 2021.</p> <p>Projektforslag udarbejdes i forår 2021 til efterår 2021. Myndigheds- og hovedprojekt forventes udført fra efterår 2021 til forår 2022.</p> <p>Udførelse forventes forår 2022 til forår 2025.</p>
	<p>Der har været afholdt genopstart-/orienteringsmøder med skolebestyrelse samt personale.</p> <p>1. arbejdsgruppemøder vedr. kvalificering af moderniseringsmidler, spiseområde samt skoleidrætshal har været afholdt</p>
	





<p>Info om skolen:</p> <p>Biskop Krags Vænge 7, 2100 Kbh Ø Byggeår: 1932/1998</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p> <p>Idrætshal</p> <p>Spiseområde</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>149,7 mio. kr.</p> <p>OBS: Hertil kommer bevillingen til idrætshallen og spiseområdet.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsplan.</p>

Nyboder Skole

	<p>Planlægningsfase</p> <p>I planlægningsfasen prioriteres renoveringsindsatser og moderniseringsindsatser fastlægges.</p>
	<p>Udvidet byggeprogram/idéoplæg forventes afsluttet primo 2021. Projektforslag udarbejdes primo 2021 til medio 2021. Forventet projekteringsperiode, Myndigheds- og Hovedprojekt: medio 2021 - ultimo 2021. Forventet udførsel: ultimo 2021-2023.</p>
	<p>Der har været afholdt indledende møde med skolen, samt første møder ang. kvalificering af moderniseringsmidler</p>
	


<p>Info om skolen:</p> <p>Øster Voldgade 15, 1350 Kbh K Byggeår: 1918-20/2006 (Multisal)</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>51,7 mio. kr.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsbehov</p>

Hanssted Skole

	<p>Planlægningsfase</p> <p>I planlægningsfasen prioriteres renoveringsindsatser og moderniseringsindsatser fastlægges.</p>
	<p>Udvidet Byggeprogram/idéoplæg forventes afsluttet i starten af 2021. Projektforslag udarbejdes i starten af 2021 til midten af 2021. Forventet projekteringsperiode, Myndigheds- og Hovedprojekt: Midten af 2021 – i slutning af 2021. Forventet udførelse: i slutningen af 2021-2023</p>
	<p>Der har været afholdt indledende møde med skolen, samt første møder ang. kvalificering af moderniseringsmidler</p>
	

<p>Info om skolen:</p> <p>Rødbyvej 2, 2500 Valby Byggeår, 1955</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsmidler inkl. Moderniseringsmidler: 63,6 mio.kr.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Der arbejdes med forskellige muligheder på egen matrikel samt undersøges brug af nærliggende lokalitet</p>

Tingbjerg Skole

	<p>Planlægningsfase:</p> <p>Opstart med gennemførelse af planlægningsfase, hvor prioritering af renoveringsindsatser og modernisering fastlægges. Der udarbejdes byggeprogram med indpasning af KKFO-pladser. Der udarbejdes byggeprogram for ny Daginstitution med 10 grupper.</p>
	<p>Tidsplan udarbejdes i , indeholder projektering, anlægsarbejder og evt. genhusning. Byggeprogram er opstartet tredje kvartal 2020. Der bliver i planlægningsfasen udarbejdet et fælles byggeprogram for HHR, ny DI og indflytning af KKFO-pladser.</p>
	<p>Der har været afholdt indledende møde med skolen.</p>
	<p>Der arbejdes sideløbende med en ny lokalplan for Daginstitutionen.</p>

<p>Info om skolen:</p> <p>Skolesiden 2, 2700 Brønshøj Byggeår, 1934-70</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p> <p>Indpasning af KKFO-pladser i skolens bygninger</p> <p>Daginstitution, nybyg</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsmidler inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>116,7 mio.kr</p> <p>OBS: Bevillingen er kun på HHR, dertil ligger der en planlægsbevilling på KKFO og Daginstitution</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsplan.</p>

Strandparkskolen

	<p>Fortsat i planlægningsfasen. Prioritering af renoveringsindsatser + moderniseringsindsatser afstemmes i samspil med KEID, BUF og brugerne</p>
	<p>Forventet udførelse: i midten af 2022-2023. Detaljeret tidsplan udarbejdes i planlægningsfasen.</p>
	<p>Der har været afholdt indledende møde med skolen. Afholdt indledende møde med BUF.</p>
	<p>Afklaring af behov for genhusning under hensyntagen til den særlige målgruppe (specialskoleelever). Dette medtages i overvejelserne om processen for udførelsesdelen</p>

<p>Info om skolen:</p> <p>Thomas Koppels Alle 10, 2450 Kbh SV Byggeår, 1981</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler: 21.1 mio. kr.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsbehov, men er ompmærksom på brugerne - specialskole.</p>

Strandvejsskolen

	<p>Planlægningsfase</p> <p>Totalrådgivning er udbudt i NOV 20 Forventet kontraktindgåelse i APR 21</p>
	<p>Forventet projekteringsperiode: maj 2021 - oktober 2022, Udbudsperiode: november 2022 - februar 2023 Udførelsesperiode: forår 2023 - forår 2024</p> <p>Længden af udførelsesperioden afhænger af evt. behov for etapedeling</p>
	<p>Der har været afholdt opfølgende møder med skolen vedr. tidligere udført screeninger vedr. renovering i august 2020 og om modernisering i november 2020.</p>
	

<p>Info om skolen:</p> <p>Sionsgade 1, 2100 Kbh Ø Byggeår, 1897 /2000/2008</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>54,3 mio. kr.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsbehov.</p>

Heiberg Skole

	<p>Planlægningsfase</p> <p>Totalrådgivning er udbudt i november 2020 Forventet kontraktindgåelse i april 2021</p>
	<p>Forventet projekteringsperiode: maj 2021 – oktober 2021 Udbudsperiode: november 2022 – februar 2023 Udførelsesperiode: forår 2023 – forår 2024</p> <p>Længden af udførelsesperioden afhænger af evt. behov for etapedeling</p>
	<p>Der har været afholdt opfølgende møder med skolen vedr. tidligere udført screeninger vedr. renovering i august 2020 og modernisering i november 2020.</p>
	


<p>Info om skolen:</p> <p>Randersgade 10, 2100 Kbh Ø Byggeår: 1932, 1998, 2001</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>49,6 mio. kr.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsbehov</p>

Korsager Skole

	<p>Planlægningsfase</p> <p>Totalrådgivning er udbudt i NOV 20 Forventet kontraktindgåelse i APR 21</p>
	<p>Forventet projekteringsperiode: maj 2021 – oktober 2022 Udbudsperiode: november 2022 – april 2023 (EU udbud) Udførelsesperiode: forår 2023 – forår 2024</p> <p>Længden af udførelsesperioden afhænger af evt. behov for etapedeling</p>
	<p>Der har været afholdt opfølgende møder med skolen vedr. tidligere udført screeninger vedr. renovering i august 2020 og modernisering i oktober 2020</p>
	

<p>Info om skolen:</p> <p>Grevinge 15, 2700 Brønshøj Byggeår: 1948, 2012</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsmidler inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>73,7 mio. kr.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsbehov</p>

Guldberg skole

	<p>Genbesøg af byggeprogram – revidering grundet strukturændring</p>
	<p>Projektering og myndighedsprojekt frem til medio 22. Foreløbig tidsplan for udførelse er medio 22 - til ultimo 24.</p>
	<p>Dialogen med skolen er genoptaget. Der bygges videre på de tidligere processer.</p>
	<p>Renoveringen af Guldberg hænger sammen med GABY. Tilpasses ny skolestruktur.</p>

<p>Info om skolen:</p> <p>Sjællandsgade 10 & Stevnsgade 28 2200 Kbh N Byggeår: 1914/1921</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>HHR Strukturændring</p> <p>Guldberg Skole udbygges med en udskolingsafdeling, 6 spor i De Gamles B. Inkl. Madskole, idrætshal og ungdomsfaciliteter. Skolens nuværende bygninger skal fungere som basisafdeling for 7 spor.</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Modernisering:</p> <p>179,1 mio. kr.</p> <p>OBS: Anlægsbevillingen er inkl. Tilførte midler fra bygherrerenserven, madskole og supplerende midler til HHR og FFT.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer konkret behov</p>

Projekter med afgrænsede renoveringsopgaver eller kapacitetsudvidelser

Skolen i Peder Vedelgade

	<p>Fortsat i planlægningsfasen. Prioritering af renoveringsindsatser + moderniseringsindsatser afstemmes i samspil med KEID, BUF og brugerne.</p>
	<p>Forventet udførelse: i midten af 2022-2023. Detaljeret tidsplan udarbejdes i planlægningsfasen.</p>
	<p>Der har været afholdt indledende møde med skolen og afholdt indledende møde med BUF.</p>
	<p>Afklaring af behov for genhusning under hensyntagen til den særlige målgruppe (specialskolerelev). Dette medtages i overvejelserne om processen for udførelsesdelen</p>

<p>Info om skolen:</p> <p>Peder Vedels Gade 8-10. 2300 Kbh S Byggeår: 1928</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>Renovering Modernisering</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler: 27,4 mio. kr.</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsbehov, men er opmærksom på brugerne - specialscole.</p>

Fensmark Skole

	<p>I planlægningsfasen. Prioritering af renoveringsindsatser + moderniseringsindsatser afstemmes i samspil med KEID, BUF og brugerne.</p>
	<p>Forventet udførelse: I midten af 2022-2023. Detaljeret tidsplan udarbejdes i planlægningsfasen.</p>
	<p>Der har været afholdt indledende møde med skolen og afholdt indledende møde med BUF.</p>
	<p>Afklaring af behov for genhusning under hensyntagen til den særlige målgruppe (specialskoleelever). Dette medtages i overvejelserne om processen for udførelsesdelen.</p>

<p>Info om skolen:</p> <p>Stevnsvej 34, 2200 Kbh N Byggeår: 1889</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>Renovering - ingen moderniseringsmidler.</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. moderniseringsmidler:</p> <p>20,3 mio. kr.</p> <p>OBS: Der er i tillæg en planbevilling på modernisering af basisområder og udeareal</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Afventer genhusningsbehov, men er opmærksom på brugerne - specialskole.</p>

Damhusengens Skole

	<p>Projektforslagsfase</p>
	<p>Udførselsperiode: Fritidsinstitution (etape 1): Afsluttet efterår 2020 Skolen og resterende fritidsinstitution (etapeopdelt byggeperiode): Sommer 2021 - sommer 2025 DI: Sommer 2025 - sommer 2027.</p>
	<p>BYK har sammen med BUF en dialog med skolen om projektet og genhusningsløsningen. Der er dialog med Vanløse Lokaludvalg og KFF</p>
	<p>Midlerne til helhedsrenoveringen givet til Hyltebjerg Skole i OFS 16/17, indgår i projektet om at nedrives og genopbygge skolen, besluttet i Budget 17</p>

<p>Info om skolen:</p> <p>Hanstholmvej 10, 2720 Vanløse</p>	<p>Hvad omfatter projektet:</p> <p>Nybyg Daginstitution Fritidsinstitution</p>
<p>HHR Midler og bevillinger:</p> <p>Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler:</p> <p>662,5 mio. kr.</p> <p>Bevillingen dækker både skole, daginstitution og KKFO</p>	<p>Genhusning:</p> <p>Genhusningsplan er under udarbejdelse</p>

Oversigt over projekterne

Distrikt / Skolenavn	HHR	Fritidsinstitution	EAT / Madskole	Kapacitetsudvidelse	Andet
Område Amager					
Område Brønshøj/Vanløse					
Damhusengens Skole (DAM)	Helhedsrenovering	Indplacering af KKFO pladser på skolen.	Madskole	Genopbygning	Daginstitution
Korsager Skole (KOR)	Helhedsrenovering				
Tingbjerg Heldagsskole (TIN)	Helhedsrenovering				Daginstitution
Område Indre By/Østerbro					
Heibergskolen (HEI)	Helhedsrenovering				
Nyboder Skole (NYB)	Helhedsrenovering				
Strandvejsskolen (STR)	Helhedsrenovering				
Område Nørrebro/Bispebjerg					
Blågård Skole (BLÅ)	Helhedsrenovering		Madskole		Klimaprojekt TMF
Nørre Fælled Skole (NFÆ)					Etablering Idrætshal + nyt spiseområde
Guldberg Skole (GUL)	Helhedsrenovering				Strukturskole
Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave					
Bavnehøj Skole (BAV)	Helhedsrenovering	Fremtidens fritidstilbud			
Hansted Skole (HAN)	Helhedsrenovering				
Specialskoler					
Skolen i Peter Vedels Gade (PED)	(Helhedsrenovering)				afgrænset renoveringsprojekter
Strandparkskolen (STP)	(Helhedsrenovering)				afgrænset renoveringsprojekter
Fensmarkskolen (FEN)	(Helhedsrenovering)				afgrænset renoveringsprojekter
