



Bilag 6 Nye forsinkede projekter

Bilaget viser udviklingen i antal røde projekter de seneste tre år. Herudover redegøres for nye røde anlægsprojekter siden seneste anlægsoversigt, dvs. de nye anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede. I bilaget redegøres for 14 nye forsinkede projekter.

Bilaget indeholder ligeledes årsagsforklaringer på de to af forvaltningens projekter, der betragtes som de væsentligste forsinkelser. Projekterne er indmeldt til Økonomiudvalgets tredje anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 23. august 2023.

24. juni 2023

Sagsnummer i F2
2022-13395

Dokumentnummer i F2
2076993

Sagsnummer i eDoc
2022-0132460

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S


EAN-nummer
5798009809452

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Udvikling i antal røde projekter	3
Vigtigste forsinkede projekter	4
Harrestrup Å.....	4
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	4
Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt	5
Bispebjerg	5
Bispebjerg Torv (OMF)	5
Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	5
Lersøparken, grundvand foranalyse.....	5
Indre By	5
BK 0732 Bartolinsgade	5
Nørrebro	6
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	6
Mimersgade, skybrudssikring	6
Østerbro	6
Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	6
Strandboulevarden, træer.....	6
Strandboulevarden, begrønning.....	6
Flere Bydele	7
Sigurdsgade m.fl., byrum	7
Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H	7
Emissionsfri arbejdsmaskiner	7
Sigurdsgade, skybrudssikring.....	7
Forbedrede offentlige toiletter	7

Udvikling i antal røde projekter

Figur 1. Udviklingen i antal forsinkede (røde) projekter 2020-2023

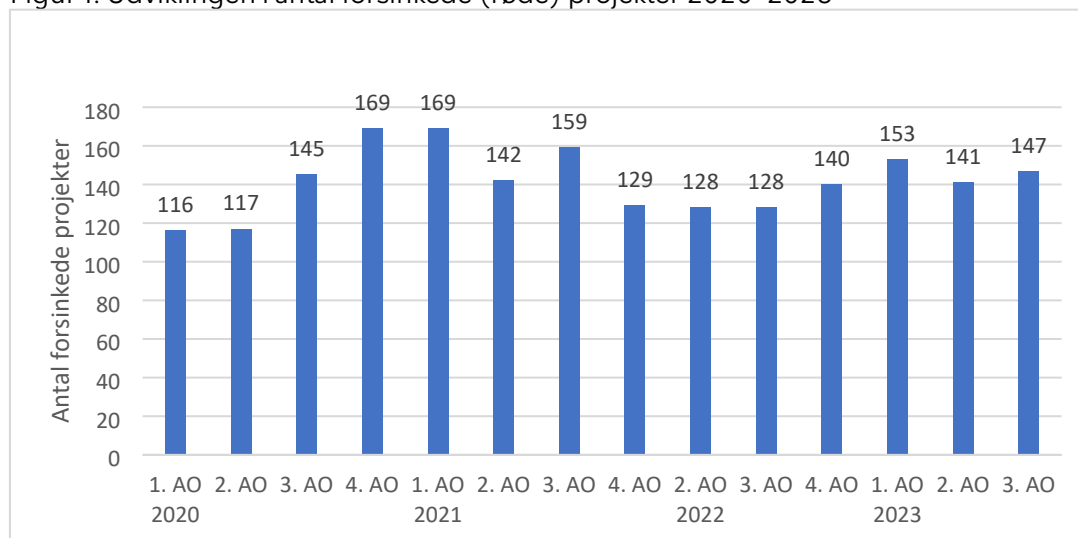

Note 1. Figuren viser udviklingen over røde projekter fra 2020 til 2023 i de kvartalsvise anlægsoversigter. Da første anlægsoversigt fra 2022 gennemføres i en reduceret udgave uden opfølgning på antal røde projekter, fremgår denne ikke.

Note 2. Antallet af aktive projekter har været nogenlunde konstant omkring 600 projekter i perioden, så evt. udsving skyldes ikke varierende størrelser på porteføljen.

Vigtigste forsinkede projekter

Forvaltningen skal i forbindelse med anlægsoversigten indmelde til Økonomiforvaltningen, hvilke projekter forvaltningen vurderer, er de to vigtigste forsinkede projekter på nuværende tidspunkt. Projekterne udvælges på baggrund af en samlet vurdering af projekternes økonomi, tidsplan og sammenhæng med øvrige projekters eksekvering. De to projekter er:

Projekt	Harrestrup Å
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2011
Vedtaget ibrugtagning	Juni 2026
Forventet ibrugtagning	December 2027
Forsinkelse i mdr. revideret	42
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes at projektet forventes at blive væsentligt dyrere end den afsatte bevilling. På baggrund af fordyrende forhold fremlagt for TMU i indstillingen "Tillægsbevilling til gennemførelse af Harrestrup Å i Vigerslevparken naturgenopretning og skybrudssikring, Valby" (TMU 12. juni 2023) har udvalget besluttet at der henvises tillægsbevilling til det fulde anlægsprojekt til forhandlingerne om Budget 2024 Hvis projektet opnår tillægsbevilling i budgetaftale 2024 Forventes Projektforslag og endelig politisk godkendelse af miljøvurderingen godkendt ultimo 2023. I 2024 udarbejdes et udbudsprojekt og gennemføres et EU-entrepriseudbud, så anlægsarbejderne kan igangsættes i 2025 til 2027. Den nærmere planlægning kan betyde, at anlægsarbejderne strækker sig ind i 2028.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Der søges om tillægsbevilling til projektet i budgetaftale 2024.

Projekt	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2017
Vedtaget ibrugtagning	August 2020
Forventet ibrugtagning	Oktober 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	62
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at der ikke oprindeligt var indtænkt tid til en fredningssag, hvilket der viste sig at blive behov for. Projektet afventede en fredningsafgørelse, som kom den 15. april 2021. Afgørelsen muliggjorde, at anlægget kunne opstartes og ibrugtages i 2023. Men Fredningsnævnets afgørelse blev i maj 2022 påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet kom i starten af juli 2022, hvor fredningsforslaget blev hjemvist til ny behandling i Fredningsnævnet, og projektet afventer derfor en ny fredningssag, som forventes at tage omkring to år.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt

I det følgende fremgår de projekter, som siden seneste anlægsoversigt er blevet mere end seks måneder forsinkede.

Bispebjerg

Projekt	Bispebjerg Torv (OMF)
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedttaget ibrugtagning	Oktober 2021
Forventet ibrugtagning	December 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	50
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedttaget ibrugtagning	December 2024
Forventet ibrugtagning	December 2028
Forsinkelse i mdr. revideret	48
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Lersøparken, grundvand foranalyse
Opr. Budgetgodkendelse	Overførselssag 2021-2022
Vedttaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet afventer evt. godkendelse i privat ejerforening, andelsforening el. lignende.

Indre By

Projekt	BK 0732 Bartolinsgade
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedttaget ibrugtagning	Oktober 2023
Forventet ibrugtagning	Maj 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	7
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at myndighedsbehandling, fx tilladelse fra Politi, fredningssag, byggesags- eller lokalplansbehandling, har taget længere tid end forventet.

Nørrebro

Projekt	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)
Opr. Budgetgodkendelse	Overførselssag 2014-2015
Vedtaget ibrugtagning	Juli 2023
Forventet ibrugtagning	Juni 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes uforudseelige forhold i jorden, bl.a. fund af uregistrerede ledninger og evt. behov for koordinering med HOFOR ledningsejere mv.

Projekt	Mimersgade, skybrudssikring
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2026
Forventet ibrugtagning	Juni 2028
Forsinkelse i mdr. revideret	18
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Østerbro

Projekt	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2020
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Strandboulevarden, træer
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Strandboulevarden, begrønning
Opr. Budgetgodkendelse	Overførselssag 2020-2021
Vedtaget ibrugtagning	Juni 2024
Forventet ibrugtagning	December 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	30

Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.
---------------------------	---

Flere Bydele

Projekt	Sigurdsgade m.fl., byrum
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2023
Vedtaget ibrugtagning	November 2026
Forventet ibrugtagning	Juni 2028
Forsinkelse i mdr. revideret	19
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	Marts 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	15
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes mangel på medarbejderressourcer evt. som følge af rekrutteringsvanskeligheder eller behov for prioritering mellem projekter.

Projekt	Emissionsfri arbejdsmaskiner
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2022
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Sigurdsgade, skybrudssikring
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2026
Forventet ibrugtagning	Juni 2028
Forsinkelse i mdr. revideret	18
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.

Projekt	Forbedrede offentlige toiletter
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2023

Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.
