



Notat

Til Børne – og Ungdomsudvalget

Afrapportering på Helhedsrenoveringer (HHR) på skoler, september 2022, 3. kvartal

I dette notat afrapporteres der på de igangværende helhedsrenoveringssager på skolerne i Københavns Kommune. Afrapporteringen forelægges til udvalgets orientering hvert kvartal. Der orienteres i notatet om tidsplanerne i projekterne, inddragelsen af brugere og hvilke projekter, der har fået supplerende midler bevilget.

Status på tidsplanerne og processerne er, at de forløber planmæssigt. Før sommeren blev fire byggeprogrammer godkendt på kontorchefniveau af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Byggeri København (ByK), Københavns Ejendomme og Indkøb og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og går nu ind i næste fase. Skolebestyrelsen på Hanssted Skole har besluttet, at genhusningen forsætter med samme fordeling af eleverne som før sommeren. På Korsager skole er der udført Asbest og PCB-undersøgelser, som ikke giver anledning til bekymring. På Strandparkskolen har skolebestyrelsen kontaktet borgmesteren ang. de bevilgede midlers størrelse, som resulterer i et møde i september imellem skoleledelsen, skolebestyrelsen, BUF og Økonomiforvaltningen (ØKF).

Der er indsendt ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) om brug af Prinsesse Charlottes Gade som udeareal ifm. genhusning af Guldberg Skole.

I forbindelse med Budget 2023, er der bevilget midler til genhusninger af Peder Vedel Gades skole og Strandparkskolen.

Tidsplaner og proces

Projekterne er enten i planlægnings- eller anlægsfase. I planlægningsfasen bliver projekteringen udarbejdet, og det er her, at inddragelsen af brugerne sker. Jo nærmere projekterne er til hovedprojekt, des flere detaljere vil fremgå i projektet – herunder prioriteringen af indsatserne, tidsplanen og økonomien (se proces oversigt i bilag 1). Projekterne holder overordnet deres tidsplaner, som udfoldes i bilag 2. Der er dog fortsat en risiko for, at tidsplanerne vil rykke sig – og de skal derfor ses som forventelige tidsplaner.

13-09-2022

Sagsnummer i F2
47373

Dokumentnummer i F2
1589721

Sagsnummer i eDoc
2022-0204193

Sagsbehandler
Emilie Kroon Lang Eltzholtz

Godkendelse af Byggeprogrammer

Før sommeren blev følgende byggeprogrammer godkendt af BUF, ByK, KEID og KFF: Strandparkskolen, Frejaskolen, Skolen i Peter Vedels Gade og Korsager Skole. Dermed vil byggeprojekterne nu gå ind i næste fase, dispositionsfasen.

Genhusning af Hanssted Skolen, Fase 2

Efter påske 2022 blev grundskolen (0.-5. klasse) genhuset på Otto Busses Vej i pavilloner. Udskolingen (6.-9. årgang) forblev på Hanssted Skole ved dobbeltanvendelse af faglokaler, bibliotek og PLC. Det blev i Overførelsessagen 21/22 besluttet at bevilge midler (5,3 mio. kr.) til en delvis lokal genhusning med seks pavilloner, hvor en udvidelse af genhusningen på Hanssted skole skal sikre bedre forhold for eleverne.

Efter et evalueringsmøde med forældre den 16. juni 22 er det besluttet, at skolen fra efteråret 2022 til projektets afslutning i sommeren 2023 vil forsætte opdelingen, hvor grundskolen køres i bus til Otto Busses Vej, og udskolingen er på Hanssted Skole. 5. klasserne vil dog få en dag på Hanssted skole, da der er brug for adgang til faglokalerne Madkundskab og Håndværk & Design. Denne løsning vil give nogle lokaleudfordringer for skolen, indtil de seks aflastningspavilloner er opsat. Der er fokus på dette fra skoleledelsen og forvaltningen side.

Asbest og PCB-undersøgelser på Korsager Skole

I forbindelse med renoveringen af Korsager Skole er der udført miljøscreeninger for miljøskadelige stoffer, som er normal procedure. I de ældre bygninger ses det ofte, at der findes miljøgifte i gamle byggematerialer. På Korsager Skole er der blevet fundet asbest og PCB-støv i begrænset omfang i kælderen. Asbesten vil saneres ifm. med renoveringen. Skolen har været orienteret før sommeren, og der har været afholdt møde med en konsulent fra EKJ Rådgivning Ingeniører. Fundet af resultaterne af PCB støvprøverne gav grundlag til bekymring på skolen, og det blev at beslutte at igangsætte supplerende undersøgelser i stueetagen, hvor både personale og elever befinder sig på skolen. Der er ved undersøgelsen udtaget 19 luftprøver og 7 støvprøver, der tilsammen fastslår, at der ikke er anledning til bekymring om forhøjede koncentrationer af PCB i indeluften på Korsager skole.

Strandparkskolen

Skolebestyrelsen har kontaktet borgmesteren med bekymringer angående indeklima samt omfanget af renovering og modernisering (herunder gruppearealer, faglokaler, toiletter og udeareal). Der blev den 12. september 2022 afholdt møde imellem skolebestyrelsen, skoleledelsen, ØKF, BUF samt Rasmus Steenberger (SF). Der blev orienteret om forløbene iht. påbud, HHR-sagen samt screeningen af faglokalerne på skolen. Det er aftalt, at der holdes tæt dialog ang. udbedringer af akutte forhold på skolen, samt den kommende renoveringsproces.

Det er besluttet at igangsætte en screening af faglokaler på specialskolerne i Københavns Kommune, hvor også Strandparkskolen vil indgå, så de pædagogiske og undervisningsmæssige forhold vurderes.

Guldberg Skoles udeareal

På Guldberg Skole har der ifm. planerne for genhusningen været løbende dialog om arbejdet med at sikre supplerende udearealer på Prinsesse Charlottes Gade. Den 30. juni blev skoleledelsen informeret om status efter et møde på Guldberg Skole 20. juni med deltagelse af BUU, skolebestyrelsen og lokaludvalget. Status er, at der er indsendt materiale til godkendelse i TMF med ansøgning om tilladelse til at anvende en del af Prinsesse Charlottes Gade til udeareal, når etableringen af pavillonerne er færdig. Dette resulterer i, at boldbanen ikke vil være tilgængelig i en periode.

Ekstra midler til Genhusninger af specialskoler

Der er i Budget 2023 bevilget midler til at håndtere genhusningsbehov i forbindelse med helhedsrenovering af specialskolerne Skolen i Peder Vedels Gade og Strandparkskolen. Det er i aftaleteksten noteret, at der skal afsøges løsninger med mindst muligt indgreb i børnenes hverdag, og at der også er afsat midler til kompenserende pædagogiske tiltag.

Proces og tidsplan i helhedsrenoveringen




Proces



I en helhedsrenovering er processen, som i anlægssager, opdelt i flere faser. Projektstyringen omhandler; Økonomi, aftaleforhold, myndigheder og proces. Ansvar for dette er hos Byggeri København. Undervejs i processen, indgår BUF for at kvalificere projektet.

Tidsplan

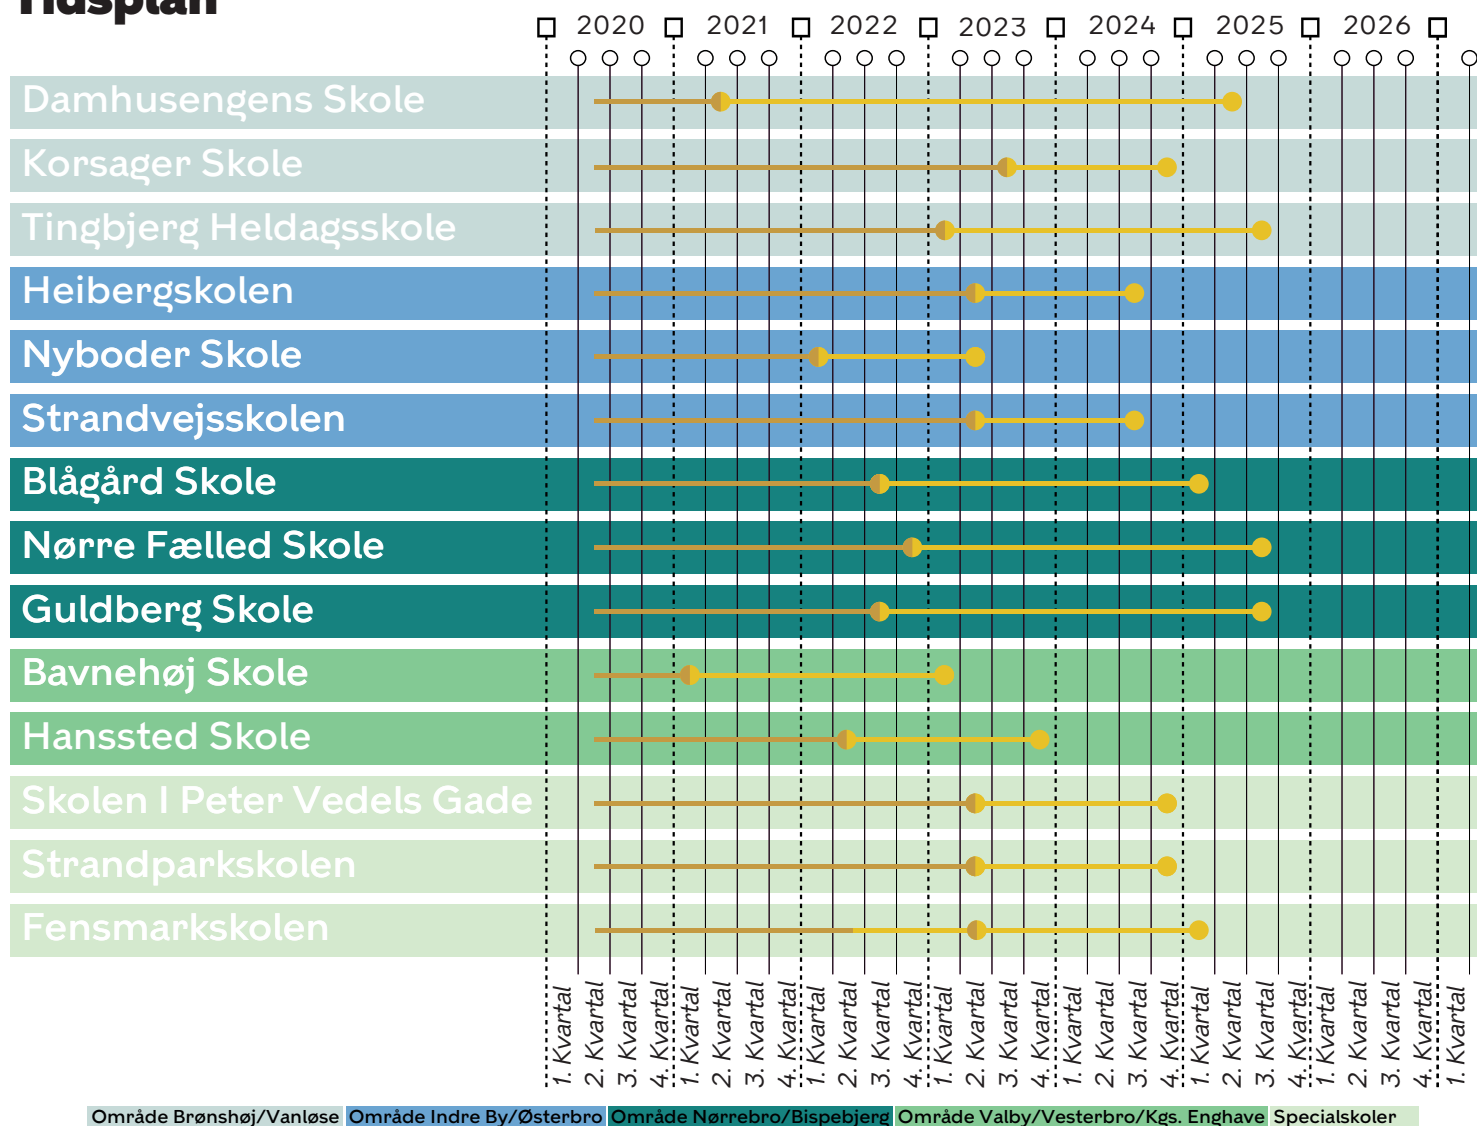


Alle projekterne omfattet af dette statusnotat vil få tids- og procesplaner efterhånden som planlægningen kommer i gang. Det fremgår eksplicit under hvert projekt, hvor tids- og procesplanen foreligger.

Damhusengens Skole



TIDSPLAN

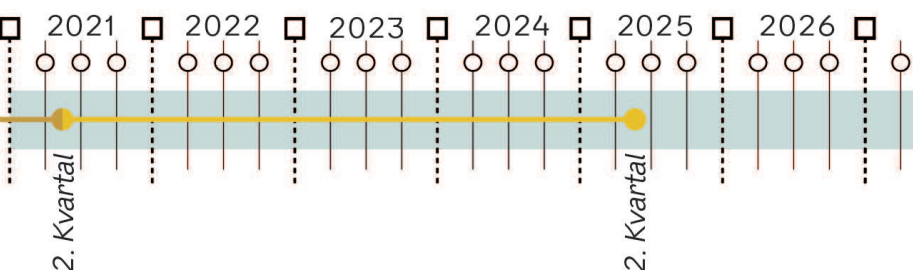

LOKALFORANKRING

BYK har sammen med BUF en dialog med skolen om projektet og genhusningsløsningen. Der er etableret hjemmeside og udstilling på skolen. Yderligere er der opsat et banner med en kort forklaring på byggeaktiviteten.

GENHUSNING

Løses ved anvendelse af eksisterende pavilloner, der rykkes lidt sammen på skolen, og der laves midlertidige klasserum i nybygget spisesal.

INFO OM SKOLEN

Hanstholmvej 10,
2720 Vanløse

Område Brønshøj/Vanløse/ Helhedsrenovering/Indplacering af KKFO pladser på skolen/madskole/Genopbygning/Daginstitution/Nybyg/ Fritidsinstitution/tandklinik

ØKONOMI

Anlægsbevilling inkl. Modernisering-smidler:
662,5 mio. kr.

Bevillingen dækker både skole, daginstitution og KKFO


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Oprindeligt var der givet midler til en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole (OFS 17/18). Da det senere blev besluttet at nedrive skolen er midlerne til helhedsrenoveringen overgået til det samlede projekt om Damhusengens Skole

Korsager Skole



TIDSPLAN

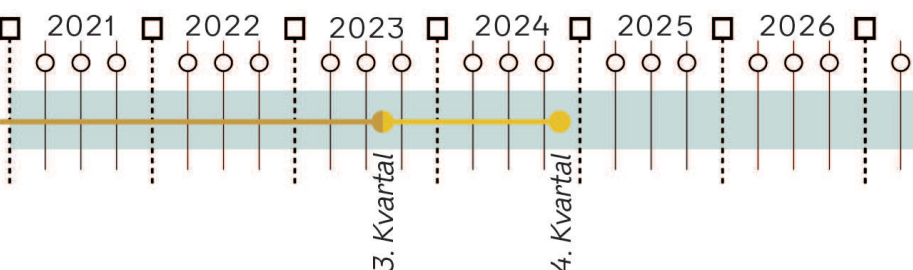

LOKALFORANKRING

Skolen har været orienteret før sommeren, og der har været afholdt møde med en konsulent fra EKJ Rådgivning Ingeniører, ang. miljøundersøgelserne.

GENHUSNING

Genhusning i pavilloner på egen matrikel.

INFO OM SKOLEN

Grevinge 15,
2700 Brønshøj
Byggeår: 1948, 2012

Område Brønshøj/Vanløse/ Helhedsrenovering

ØKONOMI

Anlægsmidler inkl. Moderniseringsmidler:
73,7 mio. kr.

Der er bevilget midler til genhusningsløsning i OFS 21/22, samt supplerende midler til asbestsanering (kælder) og renovationsløsning.


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

BUF igangsætter en oprydning af kælderen i samarbejde med skolen, når processen ang. asbesten er afklaret.

Tingbjerg Heldagsskole



TIDSPLAN

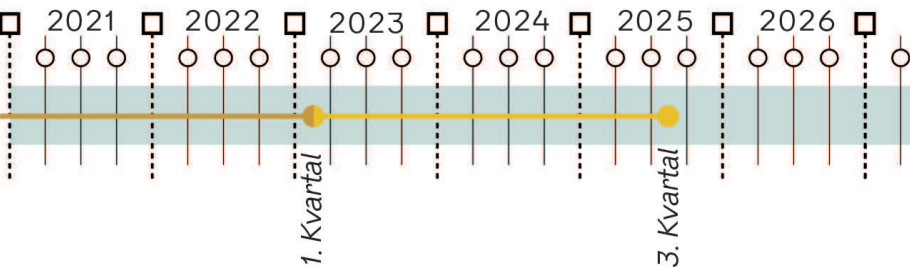

LOKALFORANKRING

Der har været afholdt møder med skolen. Ifm. HHR og KKFO. Skolen er involveret igennem byggeudvalget. Skolebestyrelsesrepræsentanter deltager i byggeudvalgs møderne

GENHUSNING

Skolen genhuses i pavilloner på egen matrikel. KKFO bliver i eksisterende lokaler, indtil de nye er indflytningsklar

INFO OM SKOLEN

Skolesiden 2,
2700 Brønshøj
Byggeår, 1934-70

Område Brønshøj/Vanløse/ Helhedsrenovering/Daginstitution/ Nybyg / Indpasning af KKFO pladser

ØKONOMI

Anlægsmidler inkl. Moderniseringsmidler:
116,7 mio.kr

OBS: Bevillingen er kun på HHR, der til ligger der en planlægsbevilling på KKFO og Daginstitution


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

HHR og KKFO projekt hænger sammen, da de begge har mange gensidige afhængigheder.

Heibergskolen



TIDSPLAN

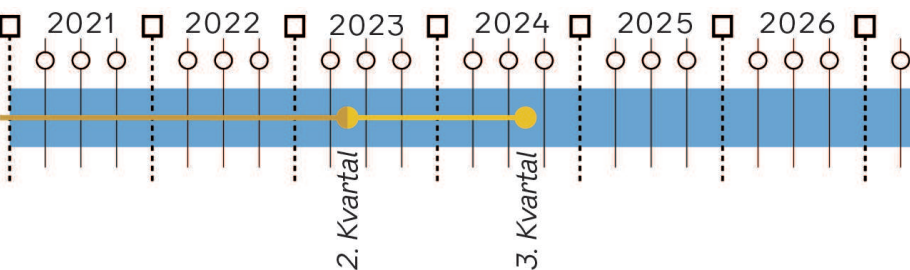

INFO OM SKOLEN

Randersgade 10,
2100 Kbh Ø
Byggear: 1932, 1998, 2001

Område Indre By/Østerbro/ Helheds-
renovering

LOKALFORANKRING

Der er afholdt møde med skolen den 25 maj ang. projektforslaget. Skolen er præsenteret for de første skitser til faglokalebygningen.

ØKONOMI

Anlægsbevilling inkl. Modernisering-
smidler:
49,6 mio. kr.

Der er bevilget anlægsmidler i OFS
21/22 til genhusning og ny faglokale-
bygning (madkundskab), samt nedtag-
ning af ældre pavillon stående i gården

GENHUSNING

Der arbejdes med en lokal løsning, enten pavilloner eller benyttelse af KKFO lokaler. Begge er afhængige af myndighedsbehandling.


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Tidsplan for endelig aflevering forventes udvidet til 3. kvartal 2024 for HHR projektet, bl.a. grundet snævre pladsforhold i gård + myndighedsbehandling ifbm. genhusningsløsninger.

Nyboder Skole



TIDSPLAN

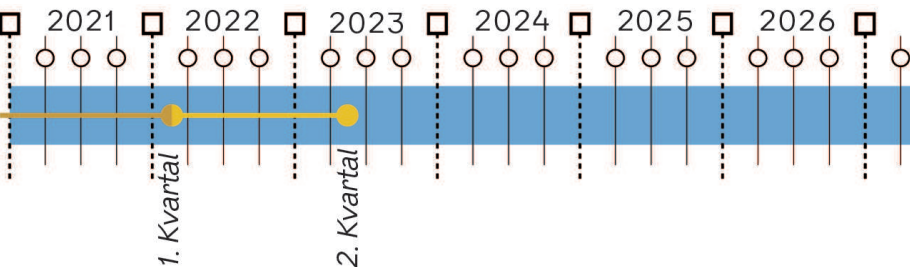

LOKALFORANKRING

Specialklasserækken er flyttet til Ryparken 81. Der planlægges et informationsmøde med forældre på Ryparken 81. Opstartsmøde med skoleleder er afholdt i uge 12.

Der udsendes nyhedsbreve, efter aftale med skoleledelsen og når der er nyt i byggesagen. Der er løbende kommunikation mellem byggeledelse og udvalgte personer fra skolen.

GENHUSNING

Genhusning af taleklasserækken er på Ryparken 81.

INFO OM SKOLEN

Randersgade 10,
2100 Kbh Ø
Byggeår: 1932, 1998, 2001

Område Indre By/Østerbro/ Helhedsrenovering

ØKONOMI

Anlægsbevilling inkl. Modernisering-smidler:
51,7 mio. kr.

Bevilling BHR:
6,02 mio. kr.


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

I Teknik-og Miljøforvaltningen område for klimatilpasning har man udarbejdet en masterplan for gennemførsel af skybrudsprojekterne i Indre By. Et af projekterne benævnes "Sti ved Nyboders Skole", det er efterfølgende besluttet i TMF at projektet ikke udføres.

Strandvejsskolen



TIDSPLAN

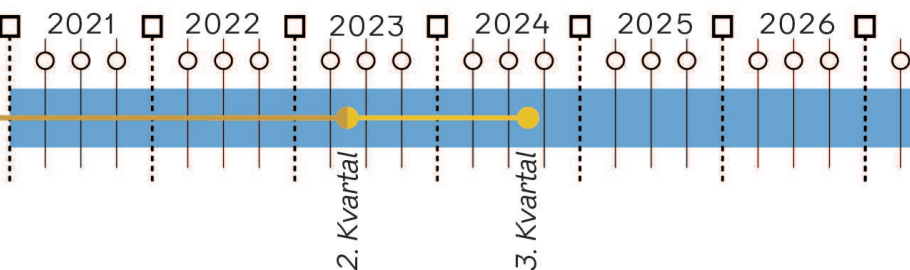

INFO OM SKOLEN

Sionsgade 1,
2100 Kbh Ø
Byggeår, 1897 /2000/2008

Område Indre By/Østerbro/ Helheds-
renovering

LOKALFORANKRING

Den 24. maj blev der afholdt møde med skolen, ang. projektforslag.

Den 31. maj blev der afholdt møde med skolebestyrelsen, hvor de udtrykte stor bekymring for indsatsen for udeareal i forbindelse med moderniseringstiltaget. Det er aftalt at igangsætte en inddragelsesproces med skolen og bestyrelsen, ang. udearealet for især mellemtrinnet, parallelt med HHR projektet.

ØKONOMI

Anlægsbevilling inkl. Modernisering-
smidler:
54,3 mio. kr.

Der er bevilget midler på OFS 21/22
til genhusningsløsning på skolens
matrikel.

GENHUSNING

Der arbejdes med en lokal løsning med pavilloner.


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Tidsplan for endelig aflevering forventes udvidet til 3. kvartal 2024 for HHR projektet, grundet forventet kompleksitet ifbm. genhusningen.

Blågård Skole



TIDSPLAN

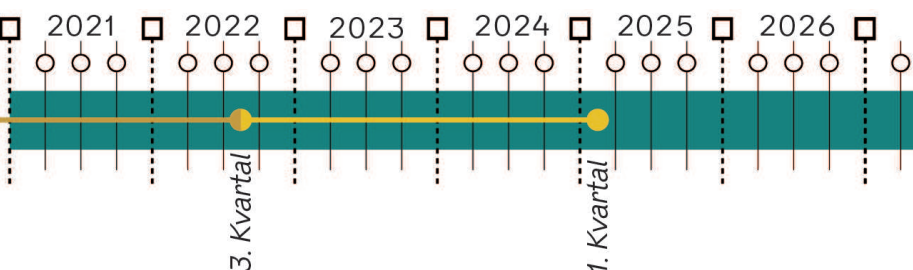

LOKALFORANKRING

Skolebestyrelsen er positiv overfor, at der peges på en løsning i umiddelbar tilknytning til skolen. De har fokus på, at der sikres gode trafikale forhold, og at eleverne skærmes bedst muligt for støj, når de skal være tæt på byggepladsen.

Brugerne vil blive inddraget i forbindelse med tilpasning af genhusningsløsninger for faglokaler som er berørt af byggeriet. Forberedelse forud for kommende flytning er i gang i samråd med Flytteenheden og byggeprojektets flytterådgiver.

GENHUSNING

Genhusningsløsningen er valgt i umiddelbar tilknytning til skolen. Byggeplads og genhusning er ved at blive etableret. Toiletbygning er nedrevet. Der er fokus på, at opretholde gode trafikale forhold, og at eleverne skærmes bedst muligt for støj, når de skal være tæt på byggepladsen.

Brugerne har været inddraget i forbindelse med tilpasning af genhusningsløsninger for faglokaler, som er berørt af byggeriet. Der er valgt løsninger ved skolen og i lokalområdet. Forberedelse forud for kommende flytning er i gang i samråd med Flytteenheden og byggeprojektets flytterådgiver.

INFO OM SKOLEN

Hans Tavsens Gade 4,
2200 Kbh N
Byggeår, 1895/1972

Område Nørrebro/Bispebjerg/ Helhedsrenovering/Madskole/Klimaprojekt TMF/ Byrumsprojekt/ Sti til sikker skolevej

ØKONOMI

Anlægsbevilling inkl. Moderniseringsmidler og madskole:
128,5 mio. kr.

OBS: Anlægsbevillingen er inkl. bevillingen fra TMF:
8,8 mio. kr.

Bevilling Bygherrerenserven (BHR):
6,4 mio. kr. Genhusning (BHR) 17,3 mio.kr.

Der er bevilget tillægsbevilling fra KEID til renovering tekniske anlæg og resterende midler til renovering betondæk p-kælder 13,3 mio. kr.

Der er bevilget midler i OFS 21/22 til renovering af tandlægeklinik til KKFO på 4 mio. kr.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER


Der er fortsat koordinering af byrumprojektet i skolegårdene til skybrudsprojektet Hans Tavsens Park (TMF). **De bemandede legepladser skal genhuses, og der er derfor dialog med skolen, byrums (skybrudsprojekt)- og byggeprojektet.**

Der etableres en stiforbindelse som sikker skolevej mellem indskoling og fritidsinstitution Capella.

Nørre Fælled Skole



TIDSPLAN

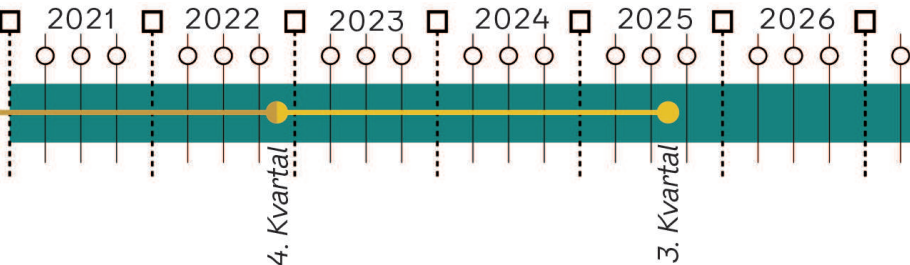

INFO OM SKOLEN

Biskop Krag's Vænge 7,
2100 Kbh Ø
Byggeår: 1932/1998

Område Nørrebro/Bispebjerg/ Etablering af Idrætshal/Nyt Spiseområde

LOKALFORANKRING

Der er afholdt møde med skolebestyrelsen den 4. april ang. byggesagen.

Der er afholdt opstartsmøde den 2. maj med skolen, ang. genhusning og flytning.

ØKONOMI

Anlægsbevilling inkl. Modernisering-smidler, spiseområde og idrætshal: 149,7 mio. kr.

Bevilling BHR: 34,2 mio. kr.

GENHUSNING

Genhusning af størstedelen af skolen vil være på Bispebjerg Skole. Indskoling, 0.-2. klasse forbliver på Nørre Fælled Skole. Det har tidligere været tænkt at 0. klasser skulle være i KKFO, dette er ændret efter dialog med TMF


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Der har været afholdt møde vedr. genhusning med besigtigelse og erfaringsudveksling på Bispebjerg Skole med deltagelse af repræsentanter fra Nørre Fælled Skole, Kildevæld Skole og BUF.

Guldborg Skole



TIDSPLAN

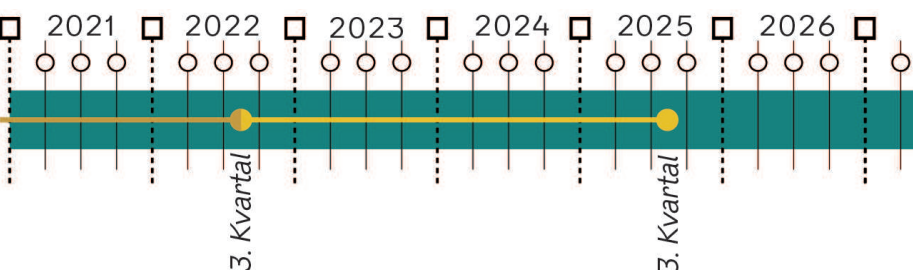

LOKALFORANKRING

Der er afholdt møde med skolen, skolebestyrelsen, direktionen, BUU og lokaludvalget den 20. juni 22. Herefter er der udsendt orientering ang. status af drøftelserne på mødet den 30. juni 22.

GENHUSNING

Der er i Budget 2022 afsat anlægsmidler til en genhusningsløsning med pavilloner på boldbanen på Sjællandsgadematriklen, suppleret med midler til pædagogiske aktiviteter uden for matriklen i form af øget udeskole mm. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det ligeledes besluttet at undersøge muligheden for at tilvejebringe ekstra udearealer på Prinsesse Charlottes Gade eller et andet sted i nærområdet.

Der er indsendt ansøgning til TMF ang. tilladelse om at bruge Prinsesse Charlottes Gade som udeareal.

INFO OM SKOLEN

Sjællandsgade 10 & Stevnsgade 28
2200 Kbh N
Byggeår: 1914/1921

Område Nørrebro/Bispebjerg/
Helhedsrenovering/Strukturskole/
Madscole / Idrætshal / Ungdomsfaciliteter

ØKONOMI

Anlægsbevilling inkl. Modernisering:
179,1 mio. kr.

OBS: Anlægsbevillingen er inkl. Tilførte midler fra bygherrerenserven, madscole og supplerende midler til HHR og FFT.

Midler afsat i Budget 22 til
Genhusning: 41 mio. kr.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER


Der er afsat midler i anlægsbudgettet til udeskole, ekstra bemanning i frikvarterer o. lign.

TMF har igangsat partshøring af skolens naboer, der afsluttes i august. Der forventes desuden at blive udsendt en naboorientering om projektet fra Byggeri København i august måned.

Bavnehøj Skole



TIDSPLAN

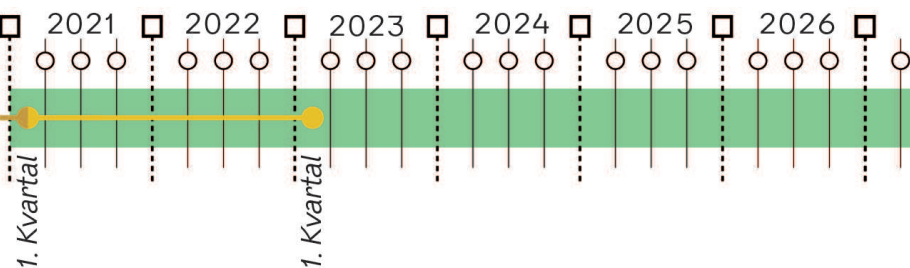

LOKALFORANKRING

ByK Har sammen med BUF en dialog med skolen om projektet, byggeplads og genhusningsløsning. Etape 2 er ibrugtaget og etape 3 er under opførelse.

GENHUSNING

Sidste etape: bygning 2, er igangsat i sommerferien. Denne bygning indeholder alene idræts- og faglokalefaciliteter.

INFO OM SKOLEN

Nathalie Zahles Vej 9,
2450 Kbh SV
Byggeår, 1930

Område Valby/Vesterbro/ Kgs. Eng-
have/ Helhedsrenovering/Fremtidens
fritidstilbud

ØKONOMI

Anlægsbevilling inkl. Modernisering-
smidler:
103,4 mio. kr.


OBS:
Anlægsbevillingen er inkl. tilførte
midler fra bygherrerenserven.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hanssted Skole



TIDSPLAN

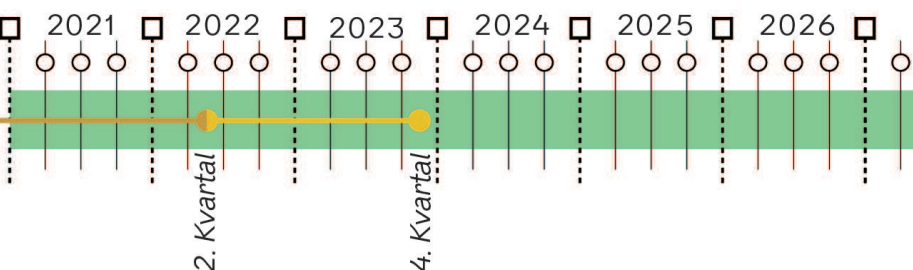

LOKALFORANKRING

Genhusningen efter sommerferien 22 og frem til ibrugtagning af skolen i 23 vil skulle løses i fællesskab med skoleledelsen og skolebestyrelse. Efter et evalueringsmøde med forældre den 16. juni 22 er det besluttet, at fase 2 (fra efteråret 22 – sommer 23) vil forsætte som fase 1.

Der udsendes ugentlige nyhedsbreve til forældregruppen.

GENHUSNING

Det er i OFS 21/22 besluttet at give ekstra midler til pavilloner på skolen der betyder, at fagfløjen til oktober 22 vil suppleres med basislokaler.

INFO OM SKOLEN

Rødbyvej 2,
2500 Valby
Byggeår, 1955

Område Valby/Vesterbro/ Kgs. Eng-
have/ Helhedsrenovering

ØKONOMI

Anlægsmidler inkl. Modernisering-
smidler:
63,6 mio.kr.

Bevilling BHR:
20,3 mio kr.

Anlægsbevilling givet i OFS 21/22 til
delvis lokal genhusning.


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Der er fokus på at opretholde en god dialog med forældregruppen, samt udarbejde sikkerhedsprotokoller mht. transporten til Otto Busses Vej af grundskolen.

Skolen i Peter Vedels Gade



TIDSPLAN

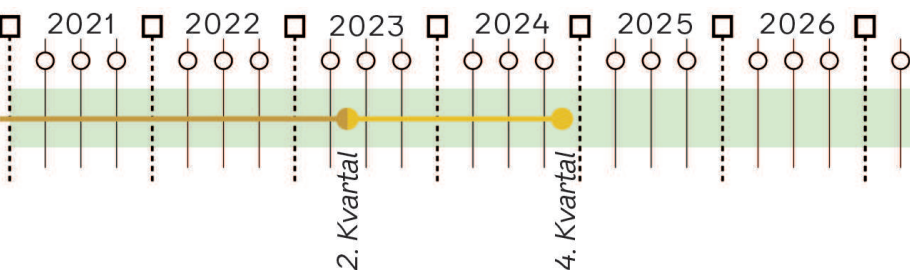

LOKALFORANKRING

Der har været afholdt møder i inden sommerferien med skoleledelsen vedrørende renoveringsprocessen og tidsperspektivet samt ønsker til moderniseringstiltag."

GENHUSNING

Afventer endelig afklaring af etapeopdeling af renoveringen. Omfanget af genhusning søges minimeret mest muligt under hensyntagen til brugernes særlige behov.

INFO OM SKOLEN

Peder Vedels Gade 8-10.
2300 Kbh S
Byggeår: 1928

Specialscole/ Helhedsrenovering/
Afgrænset renoveringsprojekt/ Mod-
ernisering

ØKONOMI

Anlægsmidler inkl. Modernisering-
smidler:
27,4 mio. kr.


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Det skal afklares med myndighederne, om der skal etableres elevator på skolen.

Strandparkskolen



TIDSPLAN

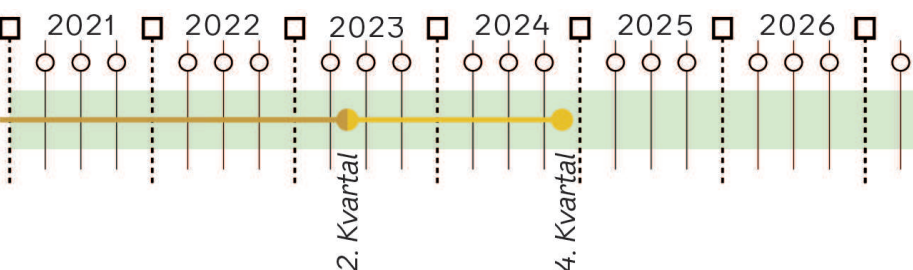

LOKALFORANKRING

Skolebestyrelsen har kontaktet borgmesteren, med bekymringer ang. indeklima og renoveringsomfanget af Strandparkskolen.

Borgmesteren har bedt BUF og ØKF om at arrangere et møde mellem forvaltningerne og skolens bestyrelse i september 22, så udfordringerne kan belyses. Skoleledelsen og områdeledelsen vil ligeledes deltage i mødet.

GENHUSNING

Afventer endelig afklaring af etapeopdeling af renoveringen. Omfanget af genhusning søges minimeret mest muligt under hensyntagen til brugernes særlige behov. Det forventes, at genhusning vil ske på skolens egen matrikel.

INFO OM SKOLEN

Thomas Koppels Alle 10,
2450 Kbh SV
Byggeår, 1981

Specialscole/ Helhedsrenovering/
Afgænsset renoveringsprojekt

ØKONOMI

Anlægsmidler inkl. Modernisering-
midler:
21,1 mio. kr.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER


Skoleledelsen er bekymret for om renoveringen kan dække omfanget af behov på skolen.

BUF vil igangsætte screening af faglokaler, som er givet til specialschooler ifm. OFS 21/22.

Fensmarkskolen



TIDSPLAN

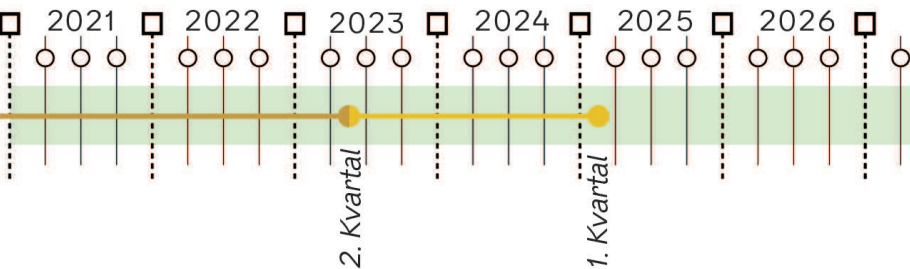

LOKALFORANKRING

Brugerne har været inddraget i programfasen, så moderniseringen rammer de pædagogiske mål.

GENHUSNING

Der er aftalt genhusning på Julius Andersens vej. BUF, BYK, skolen og skolebestyrelsen har sammen været ude for at besøge genhusningslokaliteten.

INFO OM SKOLEN

Stevnsgade 34,
2200 Kbh N
Byggeår: 1889

Specialscole/ Helhedsrenovering/
Afgænsset renoveringsprojekt

ØKONOMI

Renovering bevilling KEID:
20,3 mio. kr.

Planlægningsbevilling til modernisering, BUF: 1, 6 mio. kr.

Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarksskolen bevilget i OFS 21/22.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Fensmarksskolen har i dag en utidssvarende indretning, der begrænser skolens muligheder for at understøtte elevernes pædagogiske behov. Eleverne i målgruppen har meget forskellige specialpædagogiske behov, og en variation i de fysiske rammer vil understøtte elevernes mangeartede behov og læringsstile.
