


Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om processen vedrørende Samskabelsesprojektet på Vestvolden

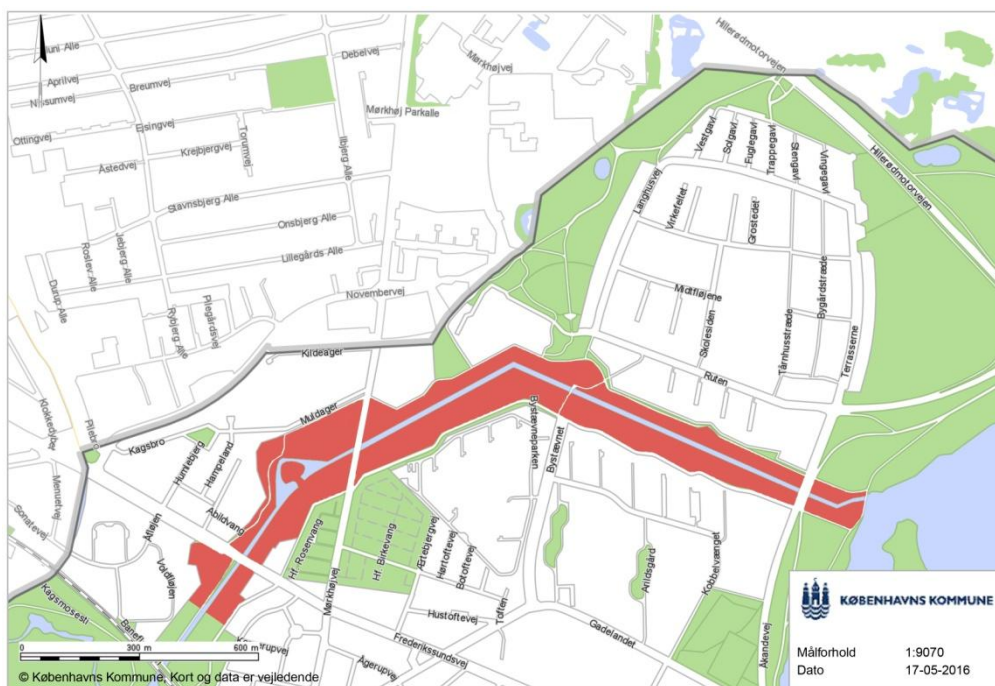

Kortet viser den del af Vestvolden, der omfattes af projektet

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V), at der skal laves et Samskabelsesprojekt på Vestvolden.

I forbindelse med opstarten af arbejdet med Samskabelsesprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget en plan for projektførløbet til orientering. Dette notat beskriver processen for projektførløbet.

Teknik- og Miljøudvalget vil i foråret 2017 få forelagt et idékatalog for de mulige indsatser i det samlede projekt.

Procesplan for Samskabelsesprojekt på Vestvolden

Samskabelsesprojektet på Vestvolden udgår fra Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum, som er besluttet af BR (BR 20. august 2015) (A, B, C, F, I, O, V og Ø). Samskabelsesprojektet har følgende målsætninger:

- at gøre Vestvolden mere attraktiv for lokalområdets beboere og gæster

13-05-2016

Sagsnr.
2016-0222644

Dokumentnr.
2016-0222644-3

Sagsbehandler
Anne Louise Banke
Kristensen

Udvikling af anlægsprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2498 4899

E-mail
FL8J@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

- at få bundet Tingbjerg bedre sammen med Husum og resten af København gennem forbedrede færdselsmuligheder og attraktioner på Vestvolden
- at binde den del af Vestvolden, der ligger i Københavns Kommune sammen med den øvrige del af Vestvolden

Samskabelsesprojektets slutprodukt er et idékatalog, som præsenterer en række fysiske anlægsprojekter, der understøtter visionerne i tilgrænsende strategier og planer: Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum, Revitaliseringen af Vestvolden og den reviderede Pleje og Anlægsplan for Vestvolden. Derudover skal idékataloget udvikles med udgangspunkt i de lokales ønsker til områdets funktionalitet.

Samskabelsesprojektet skal kombinere de forskellige visioner for området med omverdenens behov samtidig med, at der tages hensyn til fredningerne og de kulturhistoriske værdier i området. Samskabelsesen vil ske i tæt dialog med relevante interne og eksterne interessenter. Outputtet fra det indledende arbejde vil blive brugt til dialog og samskabelse med lokale kræfter og fagpersoner med det formål at finde frem til deres behov, ønsker og barrierer. Målet er at præsentere realistiske bud på fysiske anlægsprojekter, der vil gøre Vestvolden mere inviterende og synlig for omverdenen.

Alle aktiviteterne i Samskabelsesprojektet vil blive udført i 2016, TMU vil få fremlagt idékataloget primo 2017 og siden vil det blive spillet ind til budgetforhandlingerne for 2018.

Samskabelsesprojektet falder i fem faser, der alle rummer en række aktiviteter, som er beskrevet i denne procesplan.

Fase 1 – Kontakt og information

Den indledende fase igangsættes i april 2016. I denne fase afholdes møder med relevante medarbejdere fra TMF, som har et særligt kendskab til området – enten på baggrund af arbejde med stedets fredningsforhold, driften af Vestvolden eller igangværende og kommende anlægsprojekter.

Samskabelsesprojektets historik og afdækning af tilgrænsende projekter

Samskabelsesprojektets tilgrænsende projekter afdækkes og der afholdes løbende møder med relevante parter fra disse projekter. Der er tale om Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum, Revitaliseringen af Vestvolden og den reviderede Pleje og Anlægsplan for Vestvolden, samt medarbejdere fra den nu afsluttede områdefornyelse i Husum. Målsætningen er at få overblik over de processer og strategier som kommunen arbejder efter.

Afdækning af fredningsudfordringer

Vestvolden er et dobbeltfredet område – det er fortidsmindefredet og arealfredet. Disse fredningsforhold har betydning for, hvilke metoder der vælges for Samskabelsesprojektet og i sidste ende har fredningsforholdene stor betydning for valget af, hvilke fysiske anlægsprojekter der skal indgå i idékataloget. Det tilstræbes at præsentere så realiserbare projekter som muligt for at imødekomme målsætningen om at gøre Vestvolden mere attraktiv. Ambitionen er således, at 80 % af projekterne er umiddelbart realiserbare, og de resterende 20 % vil kræve særlig dispensation hos Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen.

Fase 2 – Analyse af projektområdet

Fase 2 er ligeledes påbegyndt i april 2016 og har til formål at besigtige projektområdet og i den forbindelse undersøge, hvor projektets geografiske afgrænsning skal være.

Besigtigelse af projektområdet

Hovedformålet med denne fase er, at forvaltningen laver en række registreringer og analyser med det formål at afdække potentialer og udfordringer i projektområdet. Analyserne vil være grundlaget for den senere samskabelse med interne og eksterne interessenter. Samskabelsesprojektet vil besigtige hele Vestvolden i sin fulde strækning og undersøge de aktiviteter som er etableret på den øvrige del af Vestvolden for at sikre, at idékataloget peger på både realiserbare og anderledes funktioner til volden.

Baggrundsinformation for området

Der er igennem en årrække gennemført forskellige processer i området, heriblandt af Områdefornyelsen Husum. Derfor er det vigtigt at have en forståelse for beboersammensætningen i området, og hvilke processer omverdenen allerede har deltaget i for på den måde at undgå gentagelser. Det er vigtigt for planlægningen af de kommende aktiviteter i området – både i forhold til rekruttering og rammesætning for aktiviteterne.


Analyse af det grønne cykelnet i København

Vestvolden skal blive en destination, men samtidig skal naturområdet også kobles til det øvrige grønne cykelnet i København, så cyklister kommer naturligt igennem området og dermed får øjnene op for Vestvoldens mange muligheder. Det kræver en analyse af sammenhængen i København og at udpege potentielle geografiske nedslagspunkter, der kan forbedre cykelnettet og gøre Vestvolden til en del af den rekreative rute.

Fase 3 – Omverdensinddragelse

Omverdensinddragelsen kan opdeles i to overordnede delelementer – den specifikke brugergruppe og den specifikke lokalitet. Samskabelsesprojektet vil have fokus på nogle geografiske nedslagspunkter, hvor der inviteres bredt ud, mens andre aktiviteter er tematisk betinget af hvilken brugergruppe, der ønskes inddraget.

Vestvolden udgør et stort geografisk areal, så de potentielle brugere af Vestvolden ved Utterslev Mose er formentlig ikke de samme som dem, der potentielt indtager arealer i retning mod Rødovre. Derfor vil Samskabelsesprojektet lave nogle adskilte geografiske aktiviteter.

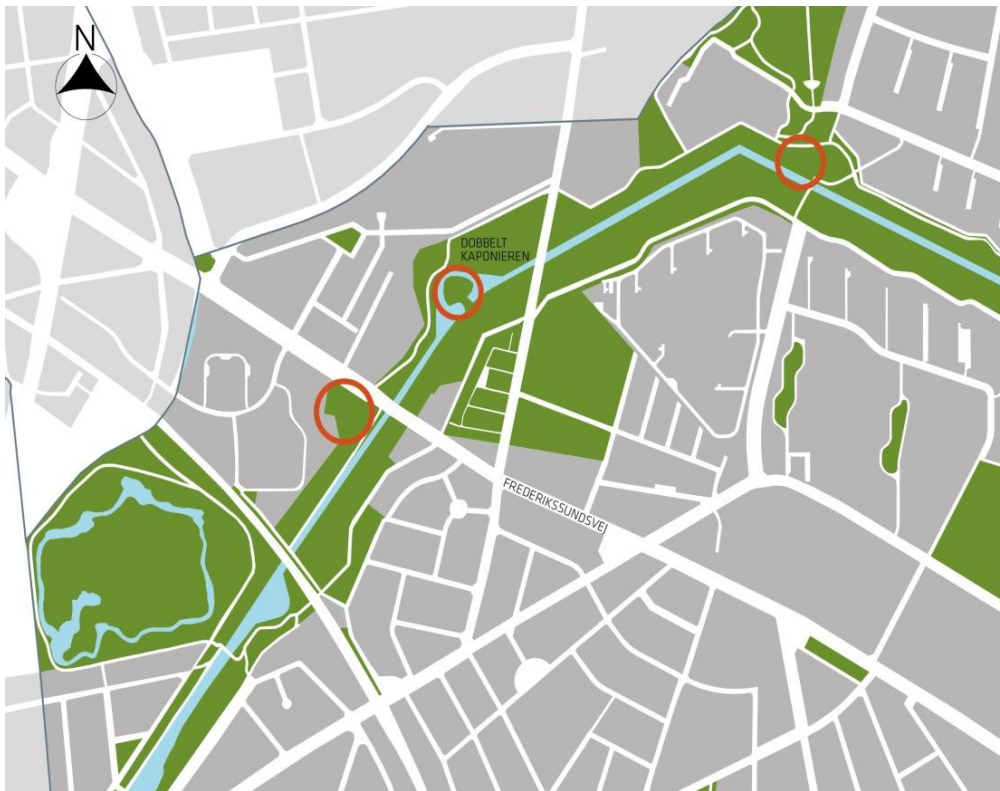

Området ved Frederikssundsvej

Den vestlige del af Vestvolden, der vender ud mod Frederikssundsvej, er et af de steder på Vestvolden, der rummer uudnyttede potentialer. Arealet er fladt, når man ser bort fra bunkeren på stedet. Først og fremmest er der tale om et stort græsareal, hvor der kun er placeret en bæk med udsigt til den trafikerede vej, men ellers inviterer arealet ikke til ophold. Det er Samskabelsesprojektets intention at lave en event på arealet og i den forbindelse afdække og teste de lokales input. Eventen planlægges, så der på dagen produceres prototyper af en række af de deltagendes idéer til stedets fremtidige funktionalitet.

Området mellem Tingbjerg og Bystævnet-broen

Med målsætningen om at gøre Vestvolden mere attraktiv og at få flere Tingbjerg-borgere til at bruge Vestvolden vil Samskabelsesprojektet bringe arealet mellem Tingbjerg og Bystævnet-broen i spil. Der er tale om en lokalitet, der har potentiale til at blive en oplevelsesdriver, der kan trække borgerne ned til Vestvolden. Samskabelsesprojektet vil afholde en event på stedet med det formål at få de lokale input til, hvilken funktionalitet arealet skal indeholde og hvad skal der til for at gøre Vestvolden mere attraktiv for dem. Eventen planlægges, så der på dagen produceres prototyper af en række af de deltagendes idéer.

Dobbeltkaponieren og indgangene til Vestvolden

Samskabelsesprojektet vil afholde en workshop om dobbeltkaponierens fremtidige funktion. En række visualiseringer af mulige funktioner i dobbeltkaponieren vil blive brugt som et dialogredskab til denne workshop. På workshoppen skal dobbeltkaponierens fremtidige brug afdækkes og udfordres. Vestvolden ligger i dag skjult i krat, så mange ikke kender det naturskønne område. Det kan en bearbejdning af indgangene ændre på. Derfor bringes potentielle indgange i spil i den samme workshop for professionelle faglige interessenter.

Skoleprojekt

Der ligger tre folkeskoler og et gymnasium i umiddelbart nærhed af Vestvolden. Skolerne er en god indgang til elever og deres forældre i nærområdet. Skolerne bør derfor inddrages for at udbrede kendskabet til Vestvoldens mange muligheder og få input til, hvad der i fremtiden kan få de potentielle brugere til at opholde sig på de fredede grønne arealer.

Københavns Naturskole, BUF, tilbyder skoleforløb for alle klassetrin – naturvejlederne har blandt andet gode erfaringer fra Amager Naturcenter. I samarbejde med projektgruppen strikker de forløb sammen på Vestvolden, så de i løbet af efteråret 2016 kan få erfaringer derude samtidig med, at eleverne får til opgave at komme med bud på initiativer, der kan få dem ned på volden alene eller sammen med venner og familie.

Lærere og pædagoger fra områdets skoler og institutioner

Vestvolden har mange potentialer som læringsrum – stedet tilbyder allerede leg, mulighed for bevægelse og er i sig selv en fantastisk ramme for historieundervisningen med sin spændende kulturhistorie.

Samskabelsesprojektet vil afholde en workshop for områdets lærere og pædagoger og benytte anledningen til at afdække om Vestvolden bruges af denne brugergruppe, hvordan og hvornår de bruger stedet, og hvad der skal til

for at understøtte Vestvolden som læringsrum. Denne workshop planlægges i samarbejde med Københavns Naturskole.

Kollegiet i Tingbjerg

Tingbjerg Kollegiet har omtrent 290 studerende boende. Samskabelsesprojektet vil planlægge en event på Vestvolden, der henvender sig specifikt til de unge. Målet er at få en dialog om, hvad der i deres øjne skal til for at gøre Vestvolden mere attraktiv.

Plejhjemmet i Tingbjerg

Plejhjemmet i Tingbjerg besøges af Samskabelsesprojektet for at få input fra beboerne og særligt plejepersonalet. Der vil i interviews blive spurgt ind til, hvorvidt de allerede bruger Vestvolden og om der er nogle barrierer, der afholder dem fra det, som idékataloget kan bringe i spil.

Folkekøkkener på Energicenter Voldparken

Ifølge den afsluttede Områdefornyelse i Husum er det muligt at komme i dialog med de ressourcerstærke borgere fra Husum på de folkekøkkener, som afholdes af frivillige i Energicenter Voldparken hver tirsdag og torsdag.

Samskabelsesprojektet vil deltage i enkelte folkekøkkener og i den forbindelse give de spisende gæster anledning til at komme med deres oplevelse af området og idéer til, hvordan Vestvolden gøres mere attraktiv.

Boligorganisationerne fsb, SAB/KAB og AAB

Samskabelsesprojektet vil tage kontakt til boligorganisationernes ansatte og derefter de enkelte afdelingsbestyrelser, der grænser op til Vestvolden – både på Tingbjerg- og Husum-siden. Disse forventes at være en vigtig kanal til lokale beboere i området. Den videre dialog vil blive fastlagt i samarbejde med disse.

Fase 4 – Kvalificering af projekter

Workshop med faglige interessenter

Samskabelsesprojektet skal pege på en række initiativer, der skal udvælges blandt de mange potentialer, som processen peger på. For at sikre, at det er de rigtige projekter, der udpeges, og at de er så realiserbare som muligt, afholdes en workshop for faglige interessenter, som skal kvalificere projekterne ud fra en række forskellige parametre – designmanual, drift, fredningsforhold, uudnyttede potentialer, de lokales ønsker etc.

Fase 5 – Udarbejdelse af idékatalog

Samskabelsesprojektets slutprodukt er et idékatalog med bud på en række anlægsprojekter, der kan medvirke til at gøre Vestvolden mere attraktiv. En ekstern rådgiver vil få til opgave at visualisere de beskrevne initiativer for på den måde at illustrere målet med de enkelte indsatser. Idékataloget fremlægges for TMU i maj 2017 og vil indgå som bilag ved budgetforhandlingerne 2018. Idékataloget udarbejdes af projektgruppen.

Input til fundraising

Sideløbende med Samskabelsesprojektet varetager Byens Udvikling et fondsarbejde med det formål at skaffe eksterne midler til realisering af dele af projektet. Nogle fonde kan have interesse i at medvirke i Samskabelsesprojektet, andre har brug for visualiseringer af konkrete projekter. Samskabelsesprojektet understøtter Byens Udviklings arbejde med fundraising og leverer, hvad der måtte være nødvendigt i det arbejde.

Tidsplan

