



## Orientering

### Halvårlig status på Ressource- og Affaldsstrategi 2030

#### Resume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres halvårligt om status på Ressource- og Affaldsstrategi 2030 i strategiperioden 2025-2030. Der gøres status for målsætningerne om genbrugsmængderne og genanvendelsesprocenten for 1. halvår 2025, udmøntning af økonomien for strategien, samt igangsættelsen af den nye strategi. Strategien blev igangsat d. 1. januar 2025 og forløber planmæssigt, med enkelte projekter, som starter i 2026.

#### Sagsfremstilling

Ressource- og Affaldsstrategi 2030 blev politisk vedtaget i Borgerrepræsentationen d. 7. november 2024. Strategien har følgende målsætninger:

- 10.000 ton genbrug fra Københavns genbrugsstationer
- 60 % reel genanvendelse af husholdningslignende affald
- 30.000 ton erhvervsaffald til genanvendelse
- 60.000 ton bygge- og anlægsaffald til genanvendelse

Projekterne i Ressource- og Affaldsstrategi 2030 strækker sig fra anlæg af nye nærgenbrugsstationer, over værdikædepartnerskaber i byggebranchen, udvikling af ny genanvendelsesteknologi i samarbejde med industrien, til adfærdsløsninger og datadrevet kommunikation for at understøtte borgernes affaldssortering.

Opgørelsen af målsætningen for erhvervsaffald vil blive fremlagt én gang årligt i den halvårlige status i foråret. Forvaltningen arbejder fortsat på opgørelse af målsætningen for bygge- og anlægsaffald. Status på målsætningerne for genbrugsmængder og reel genanvendelse af husholdningslignende affald følger nedenfor.

#### *Status på målsætningerne for genbrug og genanvendelse*

I første halvår 2025 er den reelle genanvendelsesprocent af det indsamlede affald i Københavns Kommune 39,8 %, jf. figur 1.

Med opstarten af Ressource- og Affaldsstrategi 2030 er opgørelsesmetoden for genanvendelse ændret til opgørelse af reel genanvendelse. Det er den metode, der nu bruges i EU-sammenhæng, og derfor gør opgørelsen af genanvendelse sammenlignelig med resten af EU. Se bilag 2 for opgørelsesmetoden.

19-11-2025

Sagsnummer I F2  
2025 - 17845


Dokumentnummer i F2  
215138

Sagsnummer eDoc  
2025-0267922

Rådhussekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452


Figur 1. Reel genanvendelse af husholdningslignende affald i Københavns Kommune fra 2019 til første halvår 2025.

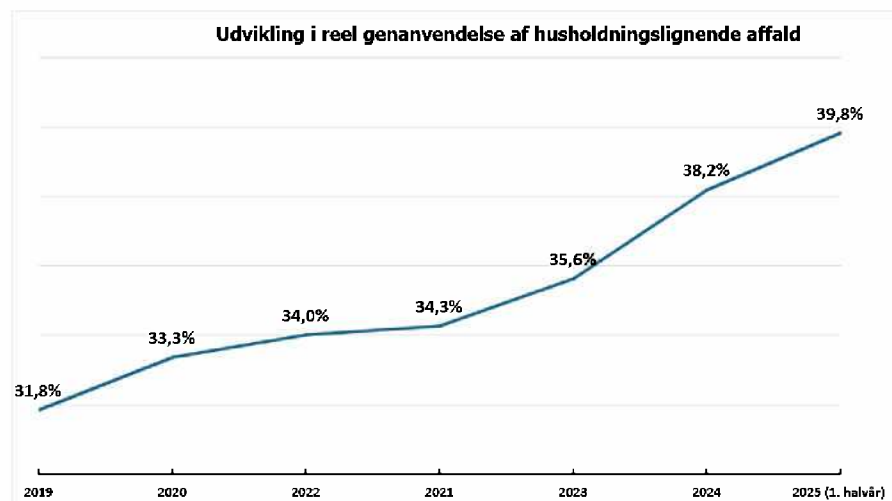

Der er i første halvår af 2025 afsat 3.150 ton genbrug fra Københavns Kommunes genbrugs- og nærgenbrugsstationer. Det er 624 tons højere end første halvår 2024. Se figur 2.

De stigninger vi ser i både genanvendelsesprocenten og mængder genbrug skyldes forventeligt forsinkede effekter af initiativer fra Ressource- og Affaldsplan 2024 implementeret sent i planperioden.

Figur 2. Ton genbrug afsat fra København Kommunes genbrugs- og nærgenbrugsstationer fra 2019 til første halvår 2025.

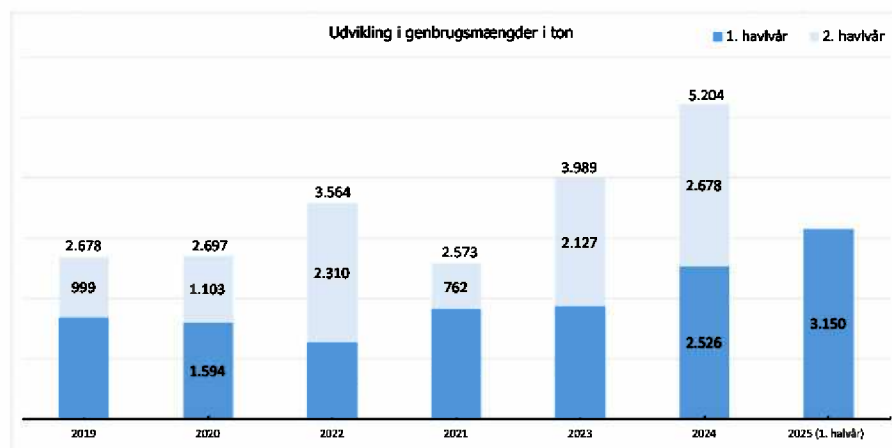

#### Status på Ressource- og Affaldsstrategi 2030's økonomi og påvirkning af affaldstaksten

Der er afsat i alt 471 mio. kr. til Ressource- og Affaldsstrategi 2030 fordelt jf. nedenstående tabel. Da vi er i starten af strategiperioden, er økonomien uforandret og der er ingen ændringer at give en status på.

Tabel 3. Økonomisk bevilling til Ressource- og Affaldsstrategi 2030

| <b>Økonomi for Ressource- og Affaldsstrategi 2030</b> |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Projektmidler                                         | 263 mio. kr. |
| Årsværk                                               | 188 mio. kr. |
| Anlægsmidler                                          | 20 mio. kr.  |

Affaldstaksten for det kommende år (2026) vil være 3.370 kr. årligt pr. gennemsnitlig husstand. Affaldstaksten var i 2024 på 3.478 kr. og steg med 22 kr. i 2025 til 3.500 kr. Fra 2025 til 2026 vil der være et fald i affaldstaksten på 130 kr. årlig pr. gennemsnitlig husstand.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder løbende med at finde veje til at sænke affaldsgebyrerne i København, samtidig med indfrielse af de politiske målsætninger for en grønnere ressource- og affaldshåndtering og opretholdelse af et højt serviceniveau for borgere og erhvervsliv. Se bilag 3 for et overblik over den forventede udvikling i affaldsgebyrerne 2026-2031.

Se i øvrigt bilag 4 for en oversigt over tidligere og kommende Ressource- og affaldsstrategi 2030-relaterede sager til Teknik- og Miljøudvalget, der kan have indvirkning på taksten og den forventede udvikling i affaldsgebyrerne.

#### *Status på igangsættelse af Ressource- og Affaldsstrategi 2030*

Af bilag 5 fremgår et komplet overblik over Ressource- og Affaldsstrategi 2030's projekter, status og eventuelle projektændringer.

Strategiens 49 projekter er underopdelt i foreløbigt 64 konkrete projekter. 45 projekter er igangsat og kører efter planen. Ét projekt er gennemført. 18 projekter afventer ansættelser, finansiering eller evalueringer af andre projekter. Der er foretaget to mindre projektændringer i 1. halvår 2025.

Strategiens tema 5 om recirkulering af byggeaffald (4 projekter) forventes at starte op fra 1. kvartal 2026 efter at der er afsat midler hertil i Budget 2026.

Der er yderligere to skattefinansierede projekter i Ressource- og affaldsstrategien 2030, hvor der endnu ikke er afsat finansiering. Der vil blive udarbejdet et budgetnotat frem mod Budget 2027.

13 af Ressource- og Affaldsstrategi 2030's projekter er toårige pilotprojekter, der enten tester nye løsninger eller evaluerer eksisterende løsninger. Samtlige pilotprojekter afrapporteres i første halvdel af strategiperioden, hvor der skal der tages politisk stilling til hvert projekt. Det vil forventeligt have betydning for taksten, hvis projekterne permanentgøres, men samtidig positiv indvirkning på målsætningerne.

11 pilotprojekter er igangsat i 2025. 4 pilotprojekter forventes afrapporteret i maj 2026. Se bilag 4 for et overblik over, hvornår de forskellige pilotprojekter afrapporteres.

**Politisk handlerum**

Et eller flere udvalgsmedlemmer kan hæve sagen til en beslutningssag, så den behandles på et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

**Videre proces**

Udvalget orienteres om næste halvårige status på Ressource- og Affaldsstrategi 2030 2. kvartal 2026.

Vicedirektør

Karsten Biering Nielsen

**Bilag**

Bilag 1 Overblik over politisk behandling

Bilag 2 Opgørelsesmetoder i Ressource- og Affaldsstrategi 2030

Bilag 3 Overblik over forventet udvikling i affaldsgebyrer 2026-2031

Bilag 4 Overblik over tidligere og kommende Ressource- og Affaldsstrategi 2030-relaterede sager til Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 5 Overblik over Ressource- og Affaldsstrategi 2030's projekter, status og ændringer



## Bilag 1 Overblik over politisk behandling

### Teknik- og Miljøudvalget den 27. maj 2024, Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2030 i høring

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 1. at-punkt:

"dog således, at det i høringsperioden undersøges, om pilotprojektet på s. 18 vedr. stort affald kan løses ved en ordning hvor der afhentes/gives refusion på afhentning af stort indbo med dags varsel frem for en støt-teordning til byggeri af overdækkede løsninger."

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) som tilføjelse til 1. at-punkt:

"dog således, at det i høringsperioden undersøges, hvordan pilotprojektet om pay-as-you-throw på s. 23 kan kombineres med en bydækkende kommunikation til alle byens borgere om, hvilke besparelspotentialer der er på deres affaldstakst, hvis de kan reducere antallet af beholdere med restaffald ved at sortere mere."

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

"Partierne støtter de overordnede tanker i planen, men er af den opfattelse at der er tale om en meget dyr plan og vi ønsker derfor ekstra fokus på omkostningerne i forbindelse med planen – affaldsgebyret er en stor omkostning der især belaster københavnere med en lav indkomst, derfor er det vigtigt at omkostningsniveauet, og derved betalingen for den enkelte københavnere, ikke bliver højere end højst nødvendig."

### Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2023, Drøftelse af scenarier for Ressourceplan 2030

Teknik- og Miljøudvalget drøftede en overordnet skitse for scenarier i Ressource- og Affaldsplan 2030.

er."

04-11-2025

Sagsnummer I F2  
2025 - 17845

Dokumentnummer i F2  
215138

Sagsnummer eDoc  
2025-0267922

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452



## Bilag 2

### Opgørelsesmetoder i Ressource- og affaldsstrategi 2030

#### Resume

Ressource- og Affaldsstrategi 2030 har fire hovedmål. Ét for genbrugs-mængder, ét for reel genanvendelse af husholdningslignende affald, ét for genanvendelse af erhvervsaffald og ét for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Opgørelsesmetoderne, der anvendes i de løbende og den endelige afrapportering af Ressource- og Affaldsstrategi 2030 beskrives i dette notat.

#### Sagsfremstilling

Ressource- og Affaldsstrategi 2030 måles på følgende fire målsætninger:

1. 10.000 ton genbrug fra Københavns Kommunes genbrugsstationer
2. 60 procent reel genanvendelse af husholdningslignende affald
3. 30.000 ton erhvervsaffald til genanvendelse
4. 60.000 ton bygge- og anlægsaffald

De fire målsætninger vurderes halvårligt ved afrapporteringer til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Der vil derudover være en afsluttende afrapportering, når de relevante opgørelser er klar til afrapportering.

Målsætningerne måles jf. nedenstående opgørelsesmetoder, som afspejler EU's opgørelsesmetode for at skabe et bedre sammenligningsgrundlag. Opgørelsesmetoden for genanvendelse er en anden end den, der har været anvendt i tidligere Ressource- og Affaldsplaner.

I det følgende er opgørelsesmetoderne beskrevet for hver af de fire målsætninger.

Tabel 1. Oversigt over opgørelsesmetoder anvendt i Ressource- og Affaldsstrategi 2030.

| Målsætning                                             | Målemetode                                                                                                                                | Opgørelsesmetoder                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.000 ton genbrug                                     | Direkte genbrug og forberedelse til genbrug                                                                                               | Stikprøvemålinger og besøgstal                                                      |
| 60 % reel genanvendelse af husholdningslignende affald | <i>Municipal waste</i> , der dækker hhv. husholdningsaffald fra private husholdninger og husholdningslignende affald fra erhvervsdrevende | Data fra Miljøstyrelsens affaldsdatasystem<br>Data indsamlet i kommunale ordninger. |

04-11-2025

Sagsnummer I F2  
2025 - 17845

Dokumentnummer i F2  
215138

Sagsnummer eDoc  
2025-0267922

Rådhussekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452

|                           |                            |                                             |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 30.000 ton erhvervsaffald | Tilsyn og vejledningsbesøg | Estimat på baggrund af antal positive besøg |
| 60.000 tons byggeaffald   | -                          | -                                           |

## Opgørelse af genbrugsmængder

Genbrugsmålet i Ressource- og Affaldsstrategi 2030 er fastsat til 10.000 tons årligt i 2030. Målet omfatter både direkte genbrug og forberedelse til genbrug, som faciliteres af Københavns Kommune gennem genbrugsstationer, nærgenbrugsstationer, og særlige behandlingsaftaler.

Forberedelse til genbrug defineres som affald, der forberedes, således at det kan genbruges uden anden forbehandling ([bkg. 1749 af 30/12-2024](#)). Der er af EU endnu ikke fastsat nogen metode til opgørelse af genbrug på hverken nationalt eller kommunalt plan ([Gennemførelsesafgørelse - 2021/19 - EN - EUR-Lex](#)).

### Metode til beregning af genbrugsmængder

I dag beregnes genbrugsmængderne primært ud fra stikprøvemålinger foretaget af Københavns Kommune på nærgenbrugsstationerne og i genbrugsområderne på genbrugsstationerne og via indrapportering af andet genbrug fra Amager Ressource Center (ARC) og behandlingsaftaler.

Stikprøvemålinger beregnes som genbrug pr. besøgende kombineret med besøgstal. På sigt arbejdes der på at indføre nye automatiserede metoder med test fra 2026.

### Kilder

- **Genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer:** Direkte genbrug og forberedelse til genbrug, opgjort ved stikprøvemålinger og besøgstal. I disse tal indgår også genbrug fra erhverv på genbrugsstationerne.
- **Behandlingsaftaler:** Fx mursten, tekstiler og hårde hvidevarer. Flasker er undtaget, mens andre fremtidige aftaler kan indgå.
- **Partnerskabsaftaler:** Eksisterende og kommende partnerskaber i forbindelse med Ressource- og affaldsstrategien 2030. Datagrundlaget baseres på partnerskabsleverancer efter særskilte mål og målinger.

### Afgrænsninger:

- **Kommunens eget genbrug:** Fx interne møbelordninger indgår ikke i den nuværende opgørelsesmetode. Disse er heller ikke takstfinansieret via affaldsgebyret.
- **Genbrugsområde på Bispeengen Genbrugsstation:** Genbrugsområdet på Bispeengen Genbrugsstation drives sammen med Frederiksberg Kommune, og derfor tilskrives 50% af genbrugsmængderne fra Bispeengen Genbrugsstation Københavns Kommunes målsætning for genbrug.

- **Events på nær-og genbrugsstationer:** Der regnes ikke med særskilte mængder fra events på genbrugsstationerne. Men besøgende ved events indgår i estimatet for genbrugsmængder per besøgende.


Den samlede genbrugsmængde opgøres halvårligt, som summen af direkte genbrug og forberedelse til genbrug.

## Opgørelse af reel genanvendelse af husholdningslignende affald

Københavns Kommunes målsætninger om 60 procent reel genanvendelse af husholdnings- og husholdningslignende affald er en EU-målsætning for genanvendelse i EU's affaldsdirektiv fra 2018.

EU-målsætningen dækker både husholdningsaffald fra private husholdninger og husholdningslignende affald fra erhvervsdrivende. De omfattede affaldstyper fremgår af Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2019, bilag 8, og er reguleret af EU's affaldsdirektiv (2018/851), hvor det går under betegnelsen "Municipal waste", herefter kaldet MW-affald (figur 1).

*Figur 1: De røde markeringer i modellen er de dele af det københavnske affald, som går under EU's definition af municipal waste (MW-affald)*

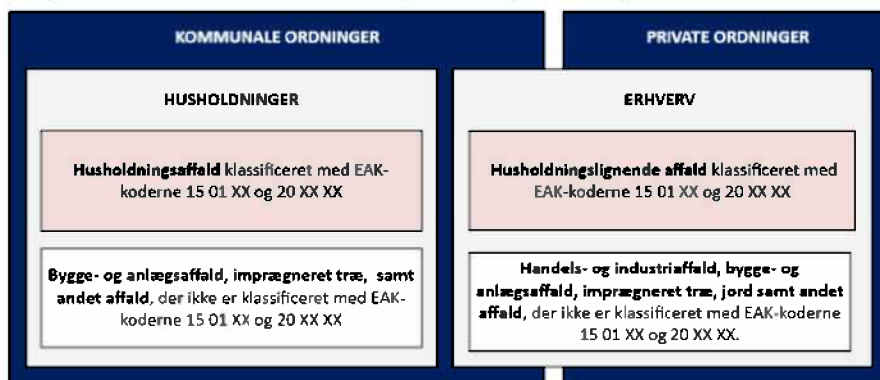

En opgørelse af det samlede MW-affald bygger på data fra Miljøstyrelsens affaldsdatasystem. Kvalitetssikret data fra Miljøstyrelsen kommer typisk med to års forsinkelse. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vil derfor få forelagt den reelle genanvendelsesprocent for alt MW-affald i Københavns Kommune én gang årligt ved udgangen af året og med to års forsinkelse. Ved afrapporteringen i november 2025 forelægges således data for 2023, i 2026 for 2024 og så fremdeles.

Københavns Kommune modtager imidlertid løbende data for den del af affaldet, der indsamles i de kommunale ordninger. For at få en tidligere indikation på udviklingen af reel genanvendelse af husholdnings- og husholdningslignende affald, forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget derfor, i tillæg til den årlige opgørelse af det totale MW-affald, halvårligt den reelle genanvendelse for *husholdningernes* andel af MW-affaldet.

## **Opgørelse af erhvervsaffald til genanvendelse**

Ressource- og Affaldsstrategi 2030 har en målsætning om, at genanvendelsen af erhvervsaffald skal øges med 30.000 tons årligt gennem en vejledningsindsats og det nye udvide tilsyn.

Tidligere havde Københavns Kommune en målsætning om, at erhvervsaffald skulle nå det samme niveau af genanvendelse som for husholdningsaffaldet. Men Københavns Kommune har ikke selv data for erhvervsaffald og er derfor afhængig af data fra Miljøstyrelsen. Datakvaliteten fra Miljøstyrelsen er dels af for dårlig kvalitet, da den ofte justeres bagudrettet, og er derfor svær at regne med over tid, og den er to år forsinket.

Københavns Kommune har derfor i stedet opstillet en målsætning for, hvor mange tons erhvervsaffald, som skal flyttes fra usorteret restaffald til at være sorteret til genanvendelse.

Målsætningen opgøres som et estimat baseret på antal positive tilsyns- og vejledningsbesøg. Den estimerede effekt af tilsyns- og vejledningsbesøg opgøres en gang årligt ved den halvårige afrapportering til Klima-, Miljø og Teknikudvalget i foråret. Her vil også tal fra Miljøstyrelsen præsenteres, med de tidligere nævnte forbehold.

## **Opgørelse af bygge- og anlægsaffald**

Ressource- og Affaldsstrategi 2030 har en målsætning om, at der skal genanvendes 60.000 ton bygge- og anlægsaffald årligt som følge af kommunens indsats på området.

Indsatserne til at nå målsætningen blev finansieret i Budget 2026, og der arbejdes derfor på at lave en opgørelse af effekten af indsatserne, som fremover vil fremgå af de halvårige statusser på Ressource- og Affaldsstrategien, i en takt som er mulig og giver mening.

## Bilag 3

### Overblik over forventet udvikling i affaldsgebyrer 2026-2031

Dette bilag giver en status på den forventet udvikling i affaldsgebyrerne 2026-2031 med afsæt i nye politisk besluttede tiltag samt relevante eksterne faktorer.

Affaldstaksten for det kommende år (2026) vil være 3.370 kr. årligt pr. gennemsnitlig husstand.

Teknik- Miljøforvaltningen arbejder løbende med at finde veje til at sænke affaldsgebyrerne i København, samtidig med indfrielse af de politiske målsætninger for en grønnere ressource- og affaldshåndtering og opretholdelse af et højt serviceniveau for borgere og erhvervsliv.

17-11-2025


Sagsnummer I F2  
2025 - 17845

Dokumentnummer i F2  
215138

Sagsnummer eDoc  
2025-0267922

Sagsbehandler  
Nanna Fiskaali

Figur 1. Forventet udvikling i affaldsgebyrer 2026-2031

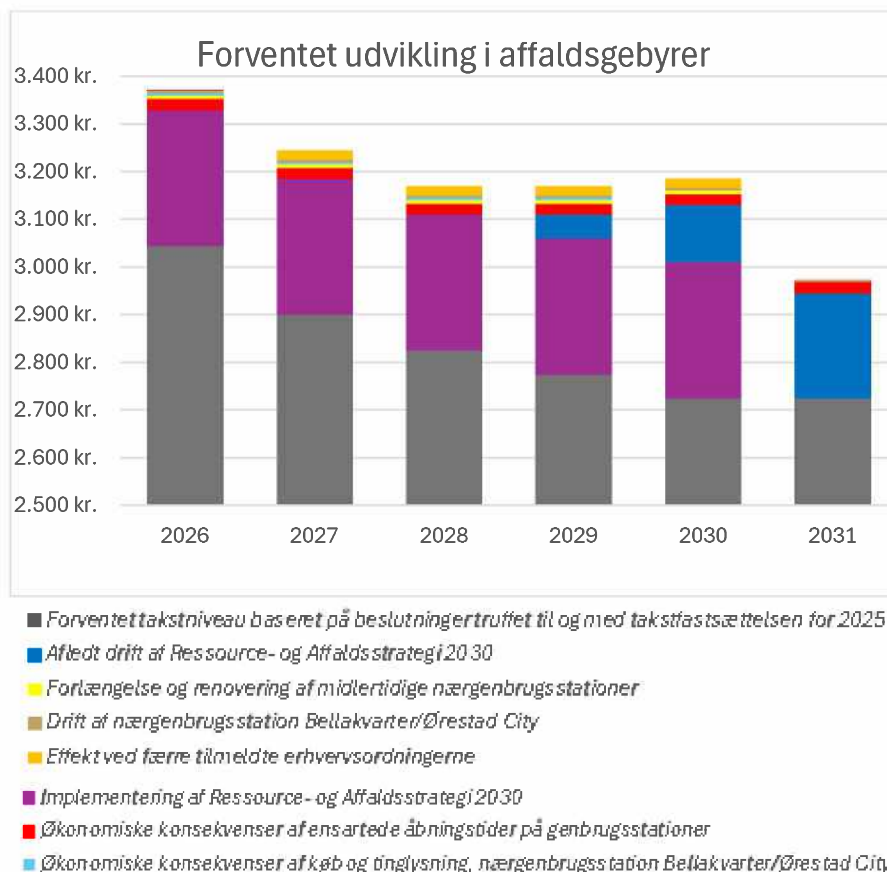

Rådhussekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452

**Note:** Beløbene er uden pris- og lønregulering

**Note:** Forventet takstniveau baseret på beslutninger truffet til og med takstfastsættelsen for 2025 dækker ligeledes de første 2500 kr., der ikke er taget med i denne figur for læsevenlighedens skyld.

Se bilag 4 for et overblik over kommende Ressource- og Affaldsstrategi 2030-relaterede sager, der kan indvirke på den forventede udvikling i affaldsgebyrerne 2026-2031.



## Bilag 4

### Overblik over tidligere og kommende Ressource- og Affaldsstrategi 2030-relaterede sager til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt forventet udvikling i takstgebyret 2026-2031

#### Planlagte, kommende Ressource- og Affaldsstrategi 2030-relaterede sager til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2025, 2. halvår

- 1. december 2025. Nærgenbrugsstation i Indre by og samarbejde om genbrugstekstiler, RAP24 projekt 11.2 (*indstilling*)
- 1. december 2025. Omlægning af Sydhavn Genbrugscenter til nærgenbrugsstation, Vesterbro / Kongens Enghave

2026, 1. halvår

- Maj 2026. Ressource- og affaldsstrategi 2030 halvårlig status
  - Afrapportering af første pilotprojekter
  - Afrapportering af forsinkede Ressource- og Affaldsplan 2024 projekter, herunder regnskabsopgørelse for sorteringspunkter
  - Affaldsdatakortlægning 2024

Se nedenstående tabel for forventet afrapportering af Ressource- og affaldsstrategi 2030's pilotprojekter i strategiperioden

Tabel 1. Overblik over afrapportering af Ressource- og Affaldsstrategi 2030's pilotprojekter

| Ressource- og affaldsstrategi 2030's pilotprojekter         | 2025   | 2026   | 2027   |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.1.2 Genbrugsemballager i København                        |        | Afrap. |        |
| 1.1.5 Grønne Ildsjæle                                       |        | Afrap. |        |
| 1.2.4 Støtte til flere overdækkede arealer til stort indbo* |        |        |        |
| 1.2.7.1 Genbrugsspottere                                    |        | Afrap. |        |
| 1.2.7.2 Udvidet åbningstider (nærgenbrugsstationer)         | Afrap. |        |        |
| 2.1.3 Hjælp til københavnernes i ifm. flytninger            |        |        | Afrap. |
| 2.1.5 Test af økonomiske incitamenter til sortering         |        |        | Afrap. |

03-11-2025

Sagsnummer I F2  
2025 - 17845

Dokumentnummer i F2  
215138

Sagsnummer eDoc  
2025-0267922

Rådhussekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452

|                                                    |  |        |        |
|----------------------------------------------------|--|--------|--------|
| 2.2.3 Bemandet mail og telefonlinje                |  | Afrap. |        |
| 2.2.4 Test af feedback fra renovationsmedarbejdere |  |        | Afrap. |
| 2.3.3.1 Forbedret indsamling af glas               |  |        | Afrap. |
| 2.3.3.3 Fleksibel ordning for stort indbo          |  |        | Afrap. |
| 3.3.4 Sensorer til dataindsamling                  |  |        | Afrap. |
| 4.2.7 Test af genbrug/reparation i KK**            |  |        |        |

\* Afventer evaluering

\*\* Ikke finansieret (Budgetnotat 2027)

Ressource- og Affaldsstrategi 2030's 13 pilotprojekter løber i den første halvdel af strategiperioden og afrapporteres i henholdsvis 2025, 2026 og 2027 jf. oversigt ovenfor. Tabellen viser, hvilke pilotprojekter der løber henholdsvis et, to og tre år før afrapportering.

Ved afrapportering af hvert pilotprojekt, forelægges en opsamling på projektet samt indstilling til enten idriftsættelse, afslutning eller fortsættelse af pilot i samme eller ændret format, alt efter resultaterne og effekten af pilotprojektet. Afrapporteringer af pilotprojekter vedlægges halvårlig status på Ressource- og Affaldsstrategi 2030.

### Ressource- og Affaldsstrategi 2030-relaterede sager på Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til og med oktober 2025

- 27/01. Finansiering og tidsplan for udrulning af sorteringspunkter (*godkendt*).
- 24/2. Behandlingsløsning for bleaffald (*godkendt*)
- 14/3 Affaldstakst og finansiering af ny sorteringsordning med bleaffald (*orientering*)
- 26/5. Afrapportering og evaluering af Ressource- og Affaldsplan 2024 (*orientering*).
- 25/8. Fortsættelse af to midlertidige nærgenbrugsstationer og ensartede åbningstider på alle byens nærgenbrugsstationer, Ressource- og Affaldsstrategi 2030 projekt 1.2.2 og 1.2.7.2 (*godkendt*).
- 25/8. Køb og etablering af nærgenbrugsstation i Kvarteret ved Bella Center Nord, Amager Vest (Fællesindstilling), Ressource- og Affaldsstrategi 2030-projekt 1.2.2 (*godkendt*).
- 15/9. Frigivelse af anlægsmidler til permanentgørelse af Vermelandsgade genbrugsområde (Amager Øst), Ressource- og Affaldsstrategi 2030-projekt 1.2.5 (*godkendt*).
- 27/10. Udrulning af 14-dages tømning af mad- og restaffald i hele byen fra 2026 (*Godkendt som forsøg i hele byen i 2026*).



## Bilag 5

### Overblik over Ressource- og Affaldsstrategi 2030 projekter, status og ændringer

03-11-2025

Sagsnummer I F2  
2025 - 17845

Dokumentnummer i F2  
215138

Sagsnummer eDoc  
2025-0267922

Læsevejledning, status for projekt:

|              |              |
|--------------|--------------|
| I gang       | 45 projekter |
| Færdig       | 1 projekt    |
| Ikke startet | 18 projekter |

I Ressource- og Affaldsstrategi 2030 var der oprindeligt 49 projekter, herunder 12 pilotprojekter. Efter projekterne er foldet ud gennem projektbeskrivelser og milepælsplaner, er det besluttet at opdele nogle projekter i flere særskilte projekter. Derfor er der nu 64 projekter, hvoraf 13 af disse er pilotprojekter.

| Ressource- og affaldsstrategien 2030 projekt                   | Status       | Note                |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1 Minimering af madspild, tøj-, møbler og elektronikaffald | I gang       |                     |
| 1.1.4 Affaldsforebyggelse og genbrug målrettet børn og unge    | I gang       |                     |
| 1.2.1 Udvikling og nye genbrugstiltag på genbrugsstationerne   | I gang       |                     |
| 1.2.2.1 Drift af alternative nærgenbrugsstationer              | I gang       | Projektændringer*   |
| 1.2.2.2 Strategiske pejlemærker for genbrug                    | I gang       |                     |
| 1.2.2.3 Etablering af nye nærgenbrugsstationer                 | I gang       |                     |
| 1.2.3 Flere cykler til genbrug og genanvendelse                | I gang       |                     |
| 1.2.5 Optimere genbrugsmuligheder på genbrugsstationerne       | I gang       |                     |
| 1.2.6 Miljøproblematiske stoffer                               | Ikke startet | Opstart 1/1 2026    |
| 1.2.7.3 Ny metode til opgørelse af genbrug                     | I gang       |                     |
| 1.2.8 Mere genanvendelse på genbrugsstationerne                | I gang       |                     |
| 1.2.9 Forbedret indsamling af elektronik                       | I gang       |                     |
| 2.1.1. Adfærdsrettede løsninger - madaffald og målgrupper      | I gang       |                     |
| 2.1.2 Skilte i gårdene                                         | I gang       |                     |
| 2.2.1 Styrket service til affaldsansvarlige                    | I gang       |                     |
| 2.3.1.1 Tilpasning af beholderløsninger                        | I gang       |                     |
| 2.3.1.2 Tilpasning af mobilsug                                 | I gang       |                     |
| 2.3.1.3 Tilpasning af skaktejendomme                           | I gang       |                     |
| 2.3.3.2 Vask af madaffaldsbeholder                             | Ikke startet | Afventer evaluering |

|                                                                                                |              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 2.3.3.4 Sorteringsløsning til sækkeadresser                                                    | I gang       |                                                           |
| 2.3.3.5 Løft af sortering på kvarterniveau                                                     | Ikke startet | Afventer evaluering                                       |
| 2.3.4 Opsøgende indsats for styrket sortering i boligforeninger                                | I gang       |                                                           |
| 2.4.1 Evaluering og udvikling af bedre sammenhæng i sorterings-løsninger                       | I gang       |                                                           |
| 2.4.2 Udvikling af test af beholdere og materiel                                               | Ikke startet | Projektændringer*                                         |
| 2.5.1 Vejledning og tilsyn af virksomheder i København                                         | Ikke startet | Opstart d. 1/1 2026                                       |
| 2.5.2 Vejledning målrettet virksomheder i blandet bolig/erhverv                                | Ikke startet | Opstart d. 1/1 2026                                       |
| 3.1.1 Bedre kvalitet i behandlingen af bioressourcer                                           | I gang       |                                                           |
| 3.1.3.1 Genanvendelse af madrasser                                                             | I gang       |                                                           |
| 3.1.3.2 Genanvendelse af bleaffald                                                             | Ikke startet | Opstart d. 1/1 2026                                       |
| 3.1.3.3 Øget kvalitet i behandlingen af stort indbo                                            | I gang       |                                                           |
| 3.1.3.4 Bedre kvalitet i behandling af sorterede fraktioner fra sorteringsanlæg til restaffald | Ikke startet | Opstart d. 1/1 2026                                       |
| 3.1.4.1 Udvikling af et genanvendelseshierarki                                                 | I gang       |                                                           |
| 3.1.4.2 Nyt udbuds- og kontraktopfølgingsparadigme                                             | I gang       |                                                           |
| 3.2.1 Innovationsplatformen "Circular Copenhagen"                                              | I gang       |                                                           |
| 3.2.2.1 Innovation i håndtering/behandling/afsætning, tekstilaffald                            | I gang       |                                                           |
| 3.2.2.2 Optimering af indsamlingsordningen for tekstilaffald                                   | I gang       |                                                           |
| 3.2.2.3 Deltagelse i organisering af producentansvar, tekstilaffald                            | Ikke startet |                                                           |
| 3.3.1 Datadrevet kommunikation                                                                 | I gang       |                                                           |
| 3.3.2 Løbende data om restaffaldssammensætningen                                               | I gang       |                                                           |
| 3.3.3 Udvikling af et materialestrøms-regnskab for København                                   | I gang       |                                                           |
| 4.1.1 Netværk for øget genbrug i København                                                     | Ikke startet | Opstart 1/1 2026                                          |
| 4.1.2 Sydhavn Genbrugscenter som testplatform                                                  | I gang       |                                                           |
| 4.1.3 Monitorering af genbrug i København                                                      | I gang       |                                                           |
| 4.1.4 Udvikling af årlige genbrugstraditioner i København                                      | Ikke startet | Opstart 1/1 2026                                          |
| 4.1.5 Byens nærgenbrugsstationer som samlingspunkt                                             | I gang       |                                                           |
| 4.1.6 Inspirationskvarterer og lokale, grønne fællesskaber                                     | I gang       |                                                           |
| 4.2.6 KK ansatte som rollemodeller for genbrug og genanvendelse                                | Ikke startet | Afventer finansiering (Budgetnotat 2027)                  |
| 5.1.1 Samarbejde om genanvendelse/genbrug af byggematerialer                                   | Ikke startet | Finansiering afsat i Budget 2026. Opstart 1. halvår 2026. |
| 5.2.1 Styrket tilsyn med bygge- og anlægsaffald                                                | Ikke startet |                                                           |
| 5.2.2 Bedre datagrundlag for bygge- og anlægsaffald fra Kbh                                    | Ikke startet |                                                           |
| 5.2.3 Digital løsning til mere effektiv tilsynsindsats                                         | Ikke startet |                                                           |

## Pilotprojekter

Pilotprojekterne i Ressource- og Affaldsstrategi 2030 har til formål at teste nye mulige løsninger eller evaluere løsninger, som blev udviklet i Ressource- og Affaldsplan 2024. Fælles for alle pilotprojekter er, at de gennemføres i begyndelsen af strategiperioden, og at der ikke er afsat finansiering til en fuld udrulning af den testede løsning. Hvis et pilotprojekt viser, at den testede løsning er effektiv, vil en fuld udrulning samt finansiering heraf blive indstillet til politisk vedtagelse.

| Ressource- og Affaldsstrategi 2030 pilotprojekter                | Status       | Note                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1.1.2 Genbrugsemballager i København                             | I gang       |                                             |
| 1.1.5 Grønne ildsjæle                                            | I gang       |                                             |
| 1.2.4 Støtte til flere overdækkede arealer til stort indbo i Kbh | Ikke startet | Projektændringer*                           |
| 1.2.7.1 Genbrugsspottere                                         | I gang       |                                             |
| 1.2.7.2 Udvidede åbningstider                                    | Færdig       | Afreporteret 25/8 2025                      |
| 2.1.3 Hjælp til københavnere i forbindelse med flytninger        | I gang       |                                             |
| 2.1.5 Test af økonomiske incitamenter til sortering              | I gang       |                                             |
| 2.2.3 Bemandet mail og telefonlinje                              | I gang       |                                             |
| 2.2.4 Test af feedback fra renovationsmedarbejdere               | I gang       |                                             |
| 2.3.3.1 Forbedret indsamling af glas                             | I gang       |                                             |
| 2.3.3.3 Fleksibel ordning for stort indbo                        | I gang       |                                             |
| 3.3.4 Sensorer til dataindsamling                                | I gang       |                                             |
| 4.2.7 Test af genbrug og reparation i KK                         | Ikke startet | Afventer finansiering<br>(Budgetnotat 2027) |

#### \*Projektændringer 1. halvår 2025

- 1.2.2.1 Drift af alternative nærgenbrugsstationer  
Projektet afsluttes i 2025 jf. Teknik- og Miljøudvalg-sag d. 25. august 2025.
- 1.2.4 Pilotprojekt: Støtte til flere overdækkede arealer til stort indbo i København  
Projektets afdækning af om indsamling af genbrugseget stort indbo kan fremmes via udvidelse af henteordningen, fremfor via overdækning af standpladsen, er rykket til pilotprojekt 2.3.3.3.
- 2.42 Udvikling af test af beholdere og materiel  
Projektet, der oprindeligt var et pilotprojekt, overgår i stedet til at være et almindeligt Ressource- og Affaldsstrategi 2030 projekt og løber i hele planperioden.
