

Oplæg til møde i Teknik- og Miljøudvalget 13.03.23

Vejarbejder i Københavns Kommune

Peter Højer

Vicedirektør

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Hvorfor tager vejarbejder længere tid i København end andre steder?


Overordnet en række forskellige faktorer:

- Mange forskellige ledningsejere
- Begrænset areal til alles vejarbejder
- Genopretning af vejkasse fra facade til facade
- Fornyelse af forsyningsnettet
- Hensyn til den trafikale afvikling




Fordelinger af antal gravearbejder

Graveart i hhv. 2021 og 2022

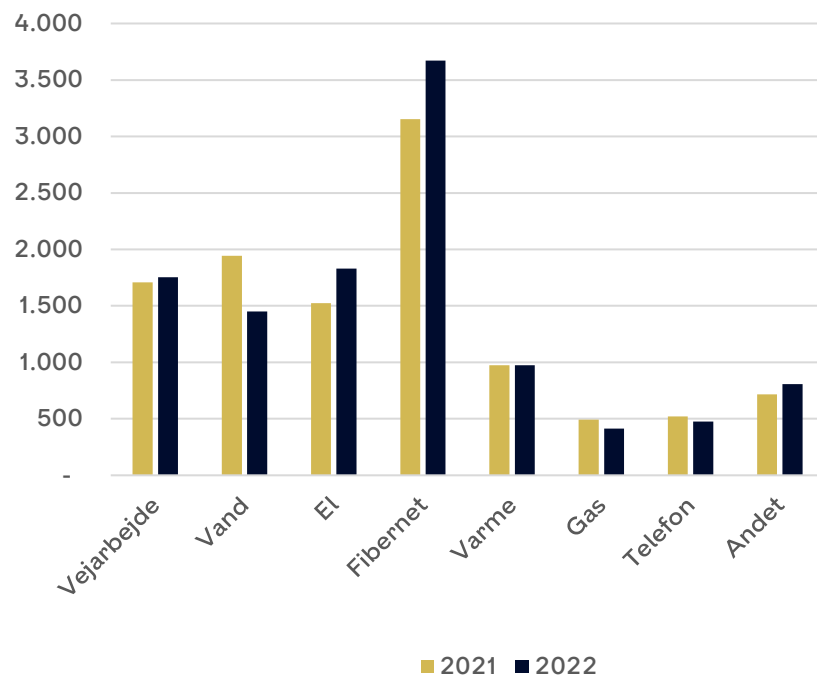

Fordeling af vejarbejde pr. bydel for 2021 og 2022

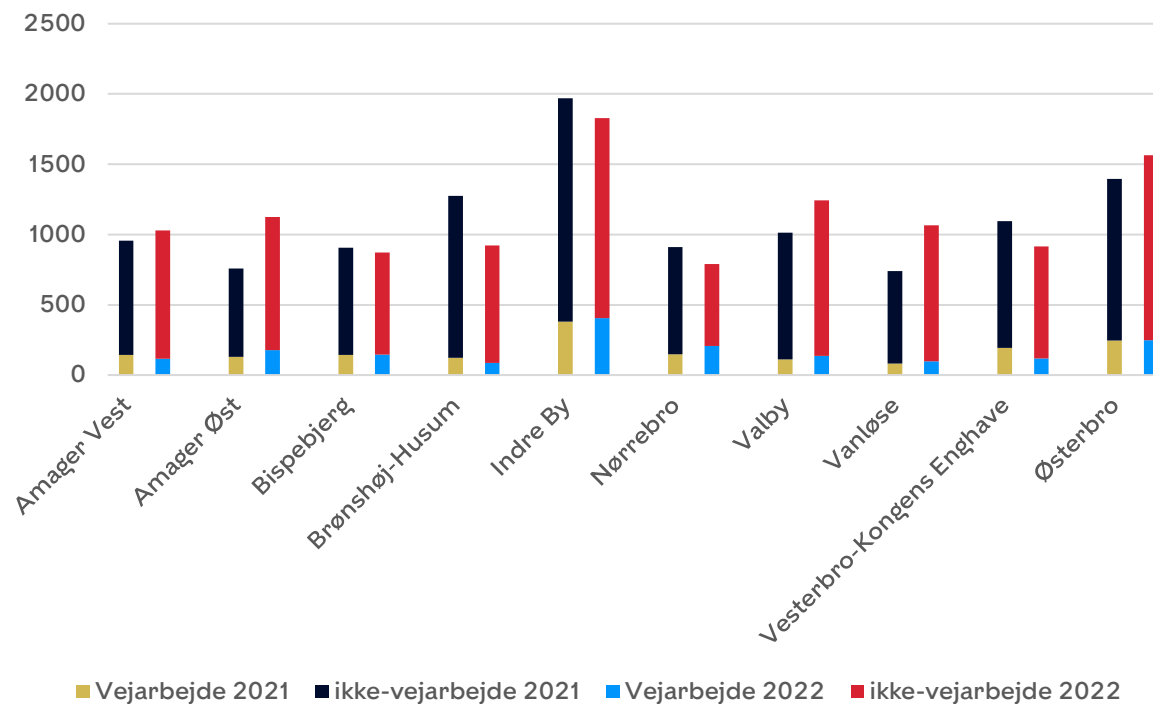

Gravearbejder kan omfatte mange typer af arbejder på vej. Svært at koordinere gravearbejder:

- Akutte udbedringer af ledningsnettet (el, vand, gas, varme)
- Nye tilslutninger, fx fibernet (forsyningspligt)
- Nødvendigt vedligehold af ledningsnettet

Parametre for vejarbejder

I forbindelse med vejarbejder tager forvaltningen forskellige hensyn, som har indflydelse på tidsforbruget. Eksempelvis:

- Sikkerhed
- Strategiske vejnet

Nedenstående vil i nogen omfang kunne justeres ift. hurtigere eksekvering:

- Hensyn til den trafikale fremkommelighed for fodgængere, cyklister og bilister
- Hensyn til den offentlige transport
- Natarbejde kontra arbejde om dagen



Koordinering og synergi

Alle genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter koordineres ift. øvrige aktører i byen

Nuværende praksis for koordinering:

- Koordinering /udvælgelse pba. intensiv arbejde og møder internt og med eksterne som opstartes ca. 3 år før anlæg
- Kvartalsvise møder med ledningsejere
- Hensyntagen til ikke at belaste én bydel for meget

Eksterne (primære)	Eksempler på Interne anlæg
Energinet	<i>Etablering af ladestandere, klimatilpasningsprojekter, supercykelstier, sikker skolevejprojekter, områdefornyelser, sorteringspunkter, træer, større byggerier, krydsombygninger m.fl.</i>
HOFOR - Bygas, fjernvarme og -køling, vand, spildevand og skybrud	
Movia	
Frederiksberg Kommune	
Tårnby Kommune	
Radius/Nexel	



Styrket koordinering

Forankring af den tværgående koordinering
ét sted i forvaltningen

- Etablere Single Point of Contact
- Sikre løbende opdatering af anlægsdata
- Udvikle udstilling af anlægsdata til gavn internt og eksternt, således de enkelte projekter får bedre forudsætninger for at kommunikere med borgerne
- Oprette abonnementsordning ift. ændringer af anlægsdata



Fælles opdateret data

