



% Omkostninger af totalbeløb

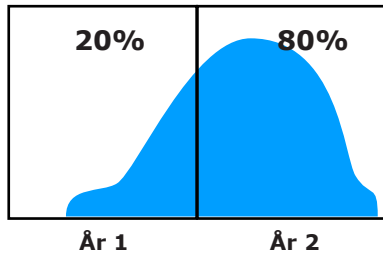


Enkelt projekt under 5 mio. kr.

Små projekter, der kun har én politisk behandling, hvori midlerne både bliver afsat og frigivet samtidig, har typisk dette afløb. Det er projekter, der er meget veldefinerede og med mindre behov for inddragelse af politikere og borgere. Særlige forhold som f.eks. brug af specielle vejrfølsomme materialer kan udskyde igangsætning og udførelsen af anlæg og dermed hele en processen ud i tredje år. Varigheden er ca. 1,5 år.

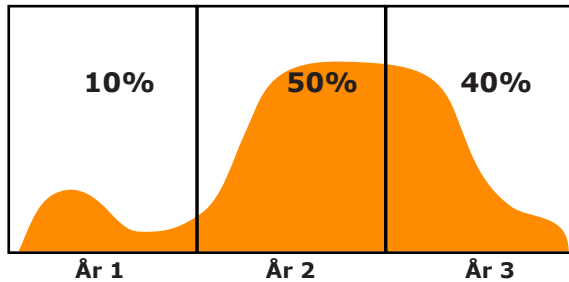


Enkelt projekt 5-10 mio. kr.

Mindre projekter, der er meget veldefinerede, eventuelt med forarbejde og borgerinddragelse udført af fagcentrene eller Områdeløft kan udføres efter to politiske behandlinger. Varigheden på disse projekter er ca. 3 år med denne periodisering.

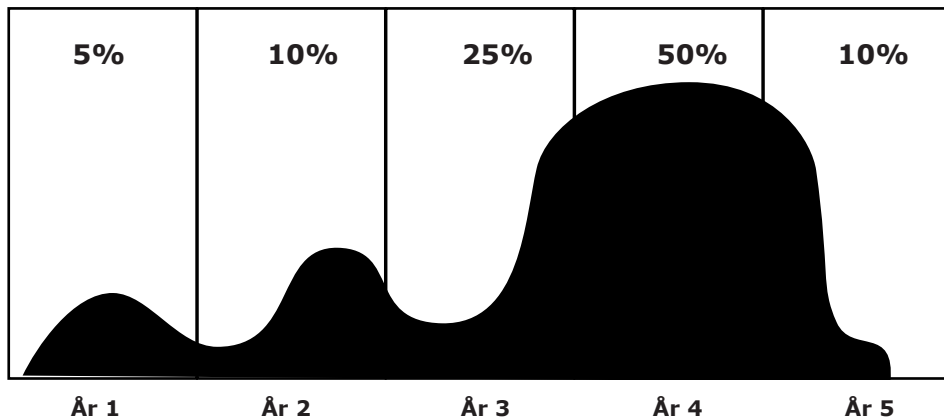

Komplekst projekt 5-30 mio. kr.

Mellemstore projekter, hvori der skal laves programmering og tidlig inddragelse af interessenter, borgere og politikere vil have et længere forløb. Denne type projekter vil ofte have mange forskellige interessenter og kræver bl.a. flere myndighedsbehandlinger. Varigheden af disse projekter er ca. 2-5 år afhængig af kompleksitet. Hovedparten af omsætningen vil ligge under udførelse af anlægget i slutningen af projektet. Forarbejdet og beslutningsprocessen varer længere tid end selve anlægsarbejdet.

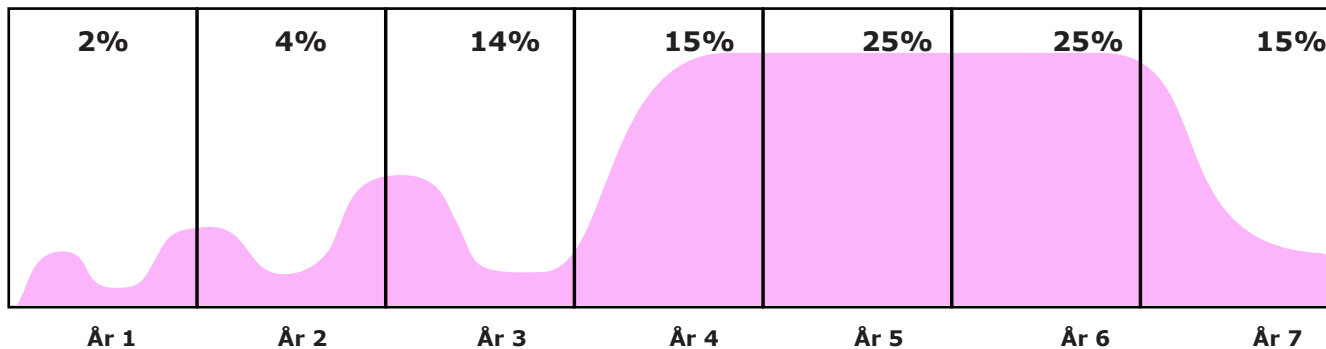

Bilag 1

Hvordan fordeles pengene på et anlægsprojekt?

Ved at analysere på projekter fra de sidste tre år, kan man se, hvordan penge bliver fordelt over tid, alt efter hvilken størrelse og kompleksitet anlægsprojekterne har. Analysen er baseret på såvel igangværende som afsluttede projekter.

Komplekst projekt over 30 mio. kr.

Store anlægsprojekter på over 30 mil. kr. vil typisk være delt i flere etaper og have mere end 4 politiske behandlinger inden, de er færdige. Den største del af forbruget ligger også her i den sidste halvdel af forløbet.
