



Til ØU

28-11-2011

Notat om status omkring 4 km pasningsgaranti

Sagsnr.
2011-132005

Baggrund

I budget 2012 er der afsat anlægsmidler for i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 grupper til udbygning til 90 pct. af spidsbelastningsbehovet.

Dokumentnr.
2011-857860

Der planlægges en udbygning til 100 pct. af spidsbelastningsbehovet. Der er derfor reserveret en pulje under Økonomiudvalget til de sidste 10 pct. I forbindelse med overførselssagen 2011 bliver det vurderet om der behov for at udmønte disse midler.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede d. 24. november 2011 prioriteringsplanen for KEJD. Børne- og Ungdomsforvaltningens implementeringsplan for daginstitutioner er et bilag til denne, og har været på Børne- og Ungdomsudvalgets aflæggebord d. 23. november 2011. Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om en nærmere gennemgang af dokumenterne på udvalgets møde den 7. December 2011, hvor Københavns Ejendoms direktør bl.a. vil gennemgå principperne i prioriteringsplanen og Børne- og Ungdomsforvaltningens direktions vil gennemgå principperne i implementeringsplanen for dagsinstitutioner.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af prioriteringsplanen/ implementeringsplanen forventede behandling i Økonomiudvalget d. 6. december 2011 bedt om Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering af muligheden for at leve op til en pasningsgaranti indenfor 4 km i 2013 i overensstemmelse med aftalen bag budgettet for 2012.

1599 København V

Telefon
3366 2078


Mobil
2184 8075

E-mail
anmark@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009381170

www.kk.dk

Diagram 1. Hvordan dækkes behovet ind af planlagte projekter.

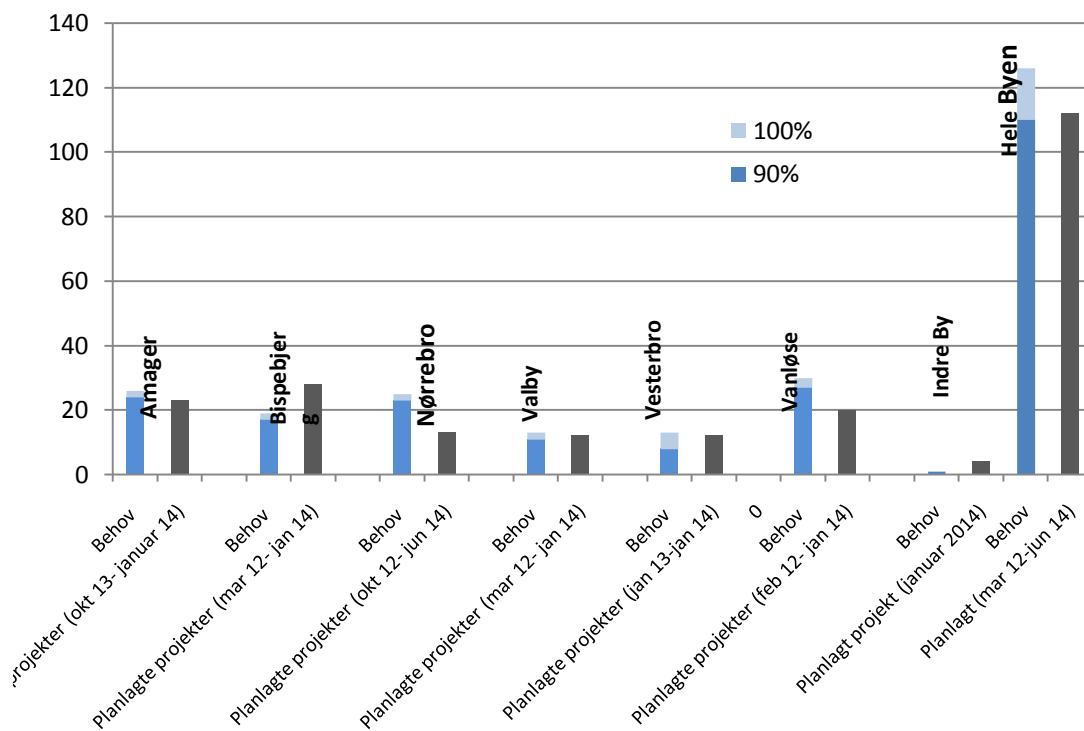

I ovenstående diagram ses, hvordan Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at det forventede behov for 0-5 års pladser på 90 pct. samt 100 pct (110 grupper og 126 grupper i perioden 2013-2015), jfr. behovsprognosen juni 2011 forventes dækket via planlagte projekter. Projekterne er fordelt på bydele, og der en konkret placering af de kommende grupper både på nye institutioner samt udbygning af eksisterende.

Det fremgår af ibrugtagningsperioderne for de planlagte projekter, at en del af behovet ligger før de planlagte projekter kan tages i brug. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at dette kortsigtede behov kan dækkes af midlertidig kapacitet, såsom stigning i private ordninger. Der er samtidig taget højde for at ekstra kapacitet i et distrikt kan benyttes til at dække behov i et naboladistrikt. Udbygning i Bispebjerg kan således dække behov på Nørrebro og Vanløse/Brønshøj, samtidig med at udbygning i Indre By kan dække behov i naboladistrikter, såsom Vesterbro og Nørrebro. Der er ikke behov for udbygning i distriktet, Østerbro, hvorfor dette område ikke fremgår i diagrammet. Opdateret behovsanalyse udkommer i primo december 2011, mens den årlige behovsprognose udarbejdes, når befolkningsprognosen for 2012 foreligger. Den kommende behovsprognose 2012 forventes at kunne fremlægges i juni 2012.

Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at i forbindelse med implementeringsplanen for 2012 anlægsmidlerne har KEJD indtil

videre indregnet en anlægstid på 27 måneder fra budgetvedtagelsen til de enkelte projekter kan tages i brug. Dette betyder, at langt de fleste institutioner står færdige i januar 2014.

Der vil i forbindelse med anlægsprojekteringen tages stilling til, hvad den konkrete ibrugtagningstidspunkt vil være for det enkelte projekt. Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen har en forventning om, at en række af daginstitutionsprojekterne har en kortere anlægstid end 27 måneder.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer dog, at en pasningsgaranti kan etableres inden for 4 km, selv hvis en 27 måneders byggetid bliver aktuel.

Det er dog under følgende forudsætninger:

- Planlagte tidlige opstarter etableres inden for et år. Der er i overførselssagen ("København i vækst") samt i budget 12 finansieret tidlig opstart af i alt 57 grupper.
- At etablerede tidlige opstarter kan opretholdes indtil de permanente pladser er etableret.
- At de allerede tidlige opstarter i Njalsgade kan forlænges.
- At en ny befolkningsprognose i foråret 2012 ikke viser uforudsete stigninger i børnetallet. Den månedlige monitorering i Børne- og Ungdomsforvaltningen af befolkningsudviklingen via CPR-træk fra november indikerer indtil videre, at befolkningsprognosen for 0-3årige svarer til den faktiske befolkningsudvikling.
