Overordnet tidsplan for planlægning af P-anlæg og byrum – fase 1
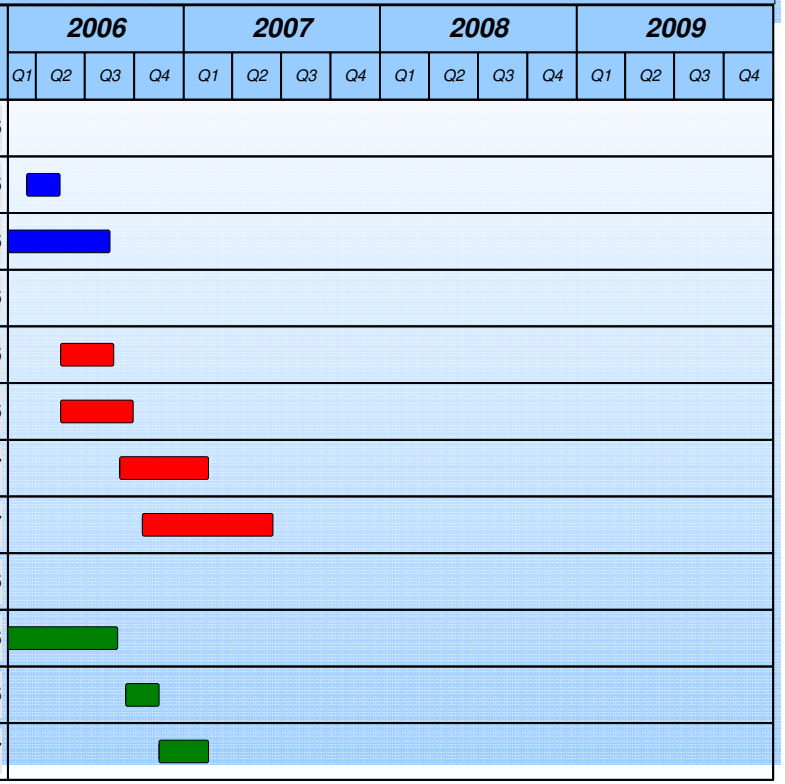
ID	Aktivitet	Start	Slut
1	**Lokaliseringsmuligheder**	02-01-2006	02-01-2006
2	Borgerdialog	15-03-2006	15-05-2006
3	Udarbejdelse af forslag til Fase 1	08-02-2006	16-08-2006
4	**Udbud & etablering**	08-02-2006	08-02-2006
5	Udbudsgrundlag privat initierede anlæg	17-05-2006	23-08-2006
6	Udbudsgrundlag for de 5 første kommunalt initierede anlæg	17-05-2006	28-09-2006
7	Udbudsgrundlag for de 5 næste kommunalt initierede anlæg	04-09-2006	15-02-2007
8	Udbudsgrundlag for de sidste kommunalt initierede anlæg i Fase 1	16-10-2006	15-06-2007
9	**Byrum & nedlæggelse af P-pladser**	08-02-2006	08-02-2006
10	Strategi for byrumsforbedringer	08-02-2006	30-08-2006
11	Borgerdialog om byrum	15-09-2006	15-11-2006
12	Valg af byrumsprojekter – fase 1	16-11-2006	15-02-2007
