Dato: 09.05.2006, rev. 16.05.2006

BISPEBJERGHJEMMET

HOVEDTIDSPLAN

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato
1			
2	Programmering / registrering	ma 01.05.06	fr 02.06.06
3	Programgodkendelse	ma 05.06.06	to 22.06.06
4	Forundersøgelser (geo, miljø, asbest, landinspektør m.v.)	ma 29.05.06	fr 07.07.06
5	Skema A; Projekt (dispositionsforslag / projektforslag)	fr 23.06.06	fr 18.08.06
6	Skema A + skema A ansøgning	ti 01.08.06	fr 18.08.06
7	Skema A; Myndighedsbehandling	fr 18.08.06	ma 18.12.06
8			
9	EU - Udbud; Prækvalifikation	ma 05.06.06	ti 25.07.06
10	Valg af tilbudsgivere	ti 25.07.06	fr 04.08.06
11	EU - Udbud; Hovedentreprise (partnering-udbud)	ma 07.08.06	ti 26.09.06
12	Samarbejdsaftale / betinget entreprisekontrakt	ti 26.09.06	ma 16.10.06
13			
14	Forprojekt (myndighedsprojekt)	ma 21.08.06	ma 06.11.06
15	Byggeandragende (ark. mht. hovedbyggetilladelse)	ma 30.10.06	ti 07.11.06
16	Byggeandragende-myndighedsbehandling (byggetilladelse)	ti 07.11.06	fr 16.02.07
17	Byggeandragende (ing.) (kloak, konstruktioner m.v.)	ma 25.09.06	fr 02.03.07
18	Grave- støbetilladelse + kloaktilladelse	ma 19.02.07	fr 20.04.07
19			
20	Hovedprojekt / detail projekt (hovedentreprenør deltager)	ma 06.11.06	fr 02.03.07
21			
22	Hovedentreprenør; kalkulationer mht. fastprisaftale	ma 16.10.06	fr 05.01.07
23	Skema B; Udarbejdelse	ma 18.12.06	fr 19.01.07
24	Skema B; Myndighedsbehandling	ma 22.01.07	fr 09.03.07
25	Hovedentreprisekontrakt (ikke betinget)	ma 12.03.07	ma 12.03.07
26			
27	Udflytning (november/december 2006)	on 01.11.06	fr 29.12.06
28	Byggeperiode (20 mdr.)	ma 16.04.07	ma 15.12.08
29	Indflytning (etapevis, 100% ibrugtagning medio dec. 2008)	ma 15.12.08	ma 15.12.08

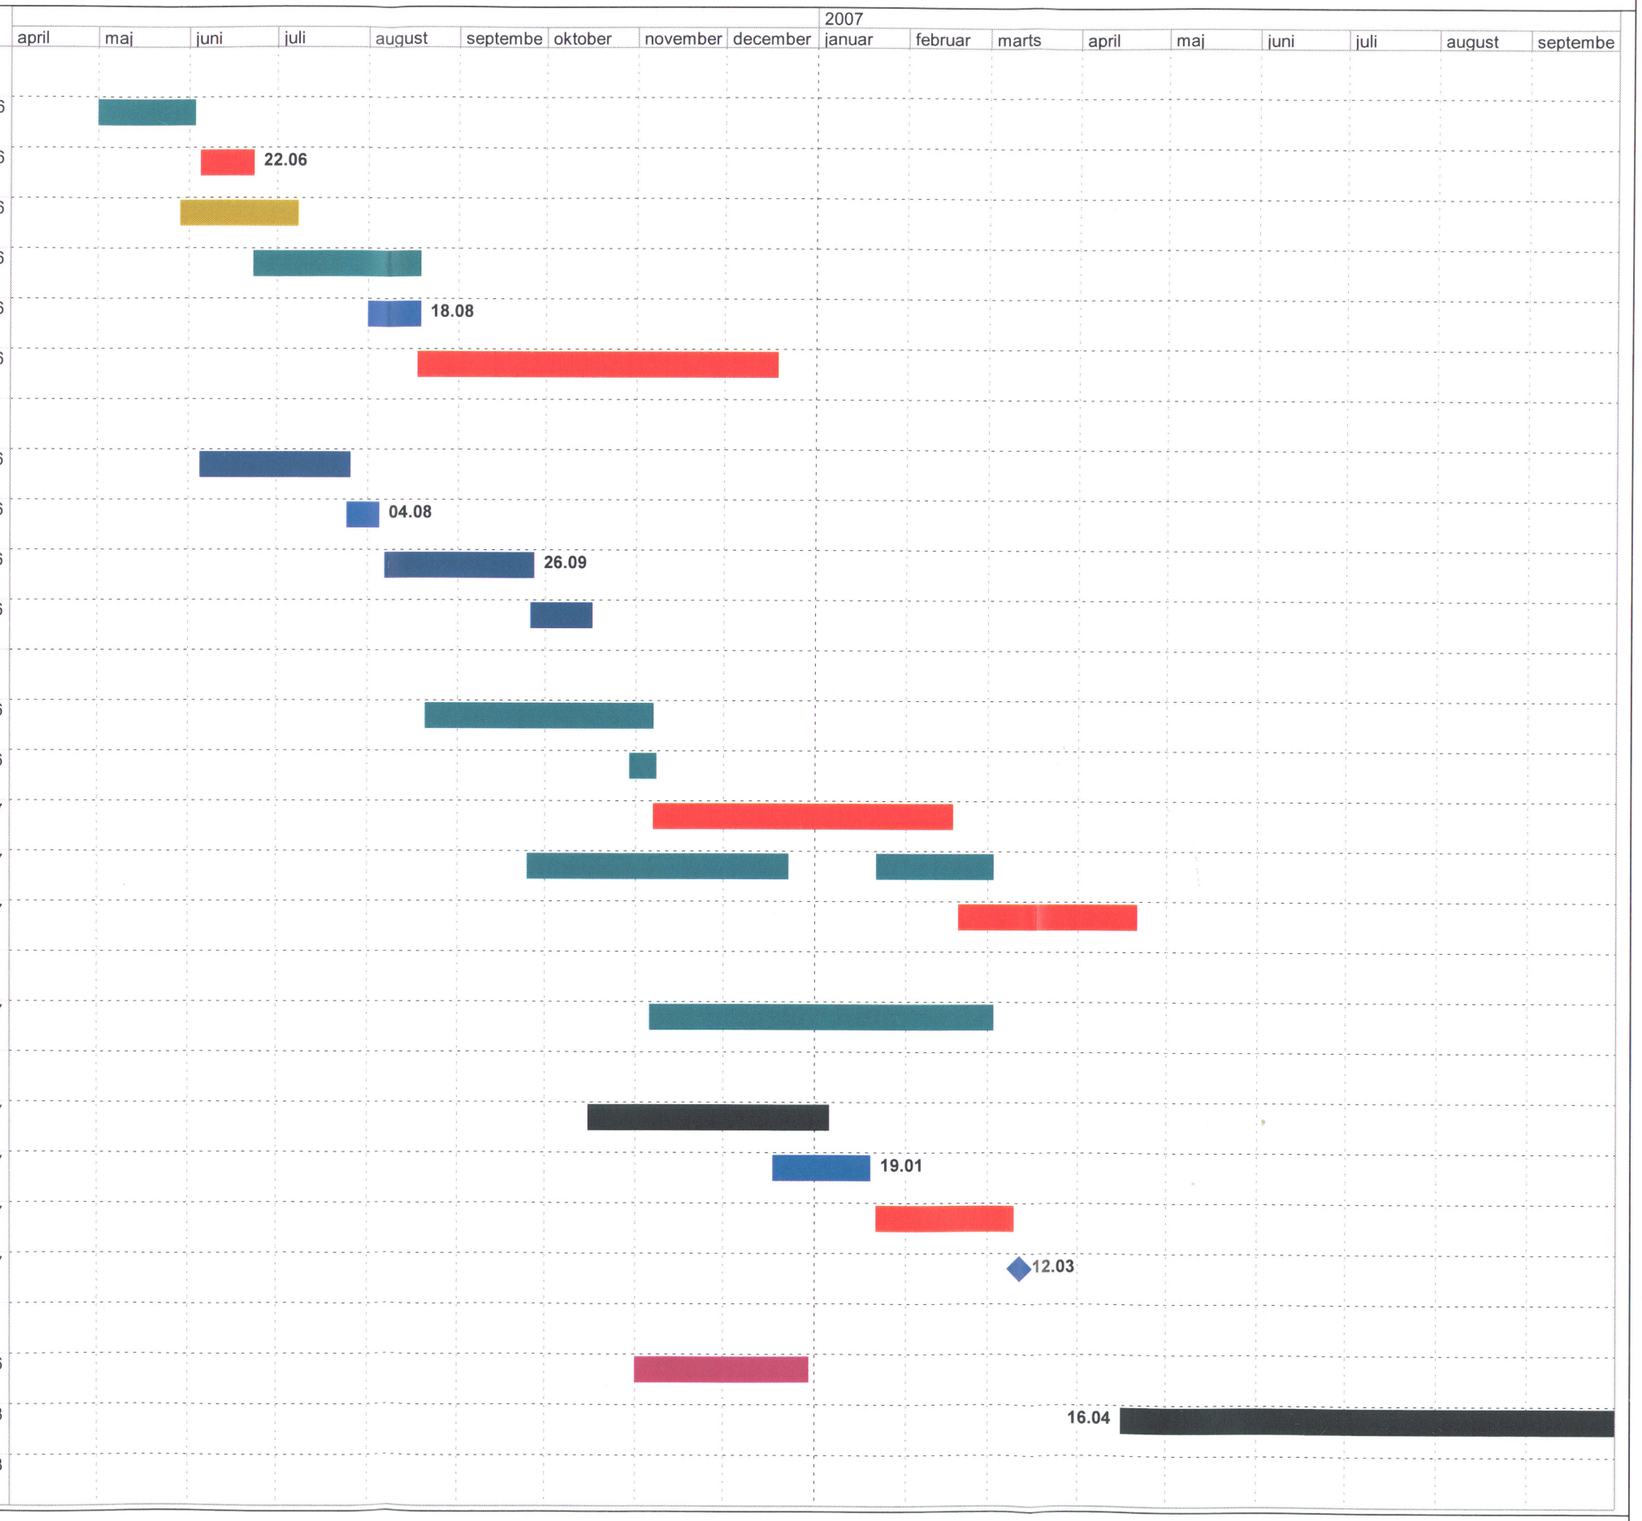

Fil: hovedtidsplan-002.mpp

Opgave [redacted]
