

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE

mellem GG Development 8 ApS
Co Gefion Group A/S
Østergade 1, 2
1100 København K
Cvr. Nr. 38240552
(herefter benævnt GG)

og Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V
(herefter benævnt KK)

GG og KK benævnes også "Part"; samlet "Parterne".

Baggrund

Nærværende aftale er indgået i anledning af den påtænkte vedtagelse af lokalplan "Femøren Station" og på baggrund af planlovens bestemmelser i § 21b om udbygningsaftaler om infrastruktur.

Lokalplanen omfatter matr.nr. 4246, 4247, 4248 og 4249 Sundbyøster, København og muliggør at GG kan opføre deres byggeprojekt bestående af hotel og ungdomsboliger, samt en dagligvarebutik, fitnesscenter eller lignende og udadvendte funktioner, såsom café og restaurant, der alle etableres efter en ombygning og udvidelse af de eksisterende fire erhvervsbygninger beliggende inden for de nævnte matrikler. Herefter benævnt Byggeprojektet.

GG har med henblik på at opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i området opfordret KK til at indgå nærværende udbygningsaftale, jfr. bilag A.

I udbygningsaftalen forpligter GG sig bl.a. til at etablere nærmere beskrevne infrastrukturanlæg bestående af etablering af en offentlig cykelsti på Jorisvej og dennes forbindelse til Hedegaardsvej og omlægning af vejarealet under broen samt etablering af fire parkeringspladser i den nordlige side af Hedegaardsvej og et beplantningsbælte.

Parterne har på baggrund heraf bestemt følgende:

§ 1 Infrastrukturanlæg

GG forpligter sig til i forbindelse med Byggeprojektets gennemførelse iht. bestemmelserne i lokalplan "Femøren Station" at etablere følgende fysiske infrastrukturanlæg ("Anlæggene") på matr.nr. 4246, 4247, 4248 og 4249 Sundbyøster, København samt umatrikulerede offentlige vejarealer, beliggende såvel inden for lokalplanområdet som uden for lokalplanområdet:

Anlæggene:

Anlæg 1

På Hedegaardsvej omlægges vejareal under broen, hvor der anlægges 2 cykelstier på ca. 2,25 m og en midterhelle/krydsningshelle på 2 m. Såfremt GG anlægger Anlæg 1 før ikrafttræden af Bynet 2019 (forventeligt i juli 2019), skal busstoppestedet på nordsiden af Hedegaardsvej flyttes midlertidigt i forbindelse med etablering af Anlæg 1.

Anlæg 2

Langs Hedegaardsvej etableres mellem Jorisvej og Engvej et beplantningsbælte med plantebede til mindst 7 fuldkronede træer. Integreret i beplantningsbæltet etableres fire offentlige parkeringspladser i den nordlige side af Hedegaardsvej langs Byggeprojektet.

Anlæg 3

På Jorisvej anlægges i overensstemmelse med lokalplanen en 4 meter bred dobbeltrettet offentlig cykelsti op mod metrotracéet, sammen med en 1 meter bred skillerabat ud mod et 2,3 meter bredt parkeringsspor. I enden mod Hedegaardsvej anlægges derudover 45 cykelparkeringspladser.

Skitseprojekt over Anlæggene vedlægges som bilag B.

Arbejdet skal tilrettelægges og udføres efter nærmere aftale med KK og efter de krav og anvisninger, der stilles af relevante myndigheder.

Inden påbegyndelse af etablering af Anlæggene skal et detailprojekt godkendes af KK.

Anlæggene udføres i god håndværksmæssig kvalitet, så de kan godkendes af KK og i overensstemmelse med god byggeskik og efter KKs anvisninger.

Anlæggene skal være offentligt tilgængelige.

§ 2

Tidsplan & etableringsfrist

For at sikre en hensigtsmæssig udførelse og færdiggørelse af alle arbejder aftaler Parterne en tidsplan.

Anlæggene skal være etableret senest samtidig med meddelelse om ibrugtagningstilladelse til Byggeprojektet eller dele heraf. Såfremt der meddeles midlertidig ibrugtagningstilladelse, regnes fristen fra denne dato.

§ 3

Dagbod

GG ifalder dagbod ved overskridelse af den i § 2 nævnte etableringsfrist.

Dagboden beregnes som 2 promille pr. forsinket arbejdsdag af de anlægsomkostninger inkl. bygherreomkostninger, der oprindeligt stilles garanti for, jf. § 6.

§ 4

Overtagelse af infrastrukturanlæggene og krav

Når Anlæggene er færdiganlagt af GG i overensstemmelse med aftalens § 1 samt de nærmere krav i lokalplanen Femøren Station og samtlige fornødne myndighedstilladelser foreligger, gennemføres der en afleveringsforretning af Anlæggene. Der udarbejdes afleveringsprotokol, som underskrives og godkendes af Parterne.

Ved afleveringsforretningen overdrager entreprenøren Anlæggene til GG. GG overdrager derefter vederlagsfrit Anlæggene til KK, når eventuelle mangler konstateret af Parterne ved afleveringen er udbedret, og udbedringen er godkendt af Parterne.

GG forestår afleveringsforretning samt 1 års eftersyn i forhold til entreprenøren og fører tilsyn med, at entreprenøren udbedrer fejl og mangler. KK deltager i gennemgangen af Anlæggene forud for afleveringsforretning og 1 års eftersyn. GG har pligt til at sikre, at KKs konstaterede mangler ved Anlæggene inkluderes i entreprenørens mangelfhjælpning. KK deltager endvidere i afleveringsforretning og eftersyn samt eventuel efterfølgende gennemgang efter udbedring af mangler konstateret ved afleveringen. Når fejl og mangler er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK, nedskriver GG garantien over for entreprenørens garantistiller.

Anlæg 3 (Dobbeltrettede offentlige cykelsti) er beliggende på GGs matr. nr. 4246, 4247, 4248 og 4249 Sundbyøster, København, jf. bilag B og GG skal i forbindelse med KKs overtagelse af Anlæg 3 samtidig vederlagsfrit overdrage de arealer, hvorpå Anlæg 3 er beliggende til KK. Arealerne skal udskilles i matriklen som offentlige vejarealer iht. vejloven og GG sørger for og bekoster den matrikulære berigtigelse heraf.

Efter KKs overtagelse af Anlæggene påhviler drift og vedligehold KK.

KK overtager ingen eventuel momsreguleringsforpligtelse.

§ 5

Krav

GG er forpligtet til at sikre, at GGs entreprenører og rådgivere stiller garanti i henhold til AB 92, ABT 93 og ABR 89 (eller AB18, ABT18 og ABR18 såfremt disse nye standardvilkår er trådt i kraft) over for GG, samt at KK kan indtræde i garantierne efter afholdelse af 1 års eftersyn, når fejl og mangler er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK.

GG er forpligtet til at sikre, at de entreprenører, der etablerer Anlæggene for GG er forpligtet til at deltage i aflevering samt 1 og 5 års eftersyn i henhold til AB92, ABT 93 kan gøres ansvarlig for (AB18 og ABT18) og foretage udbedringer af de fejl og mangler, entreprenøren i henhold til AB92, ABT 93 (AB18 og ABT18) kan gøres ansvarlig for.

I perioden fra KKs overtagelse af Anlæggene og indtil 1 års eftersynet og eventuelle mangler er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK hæfter GG stadig over for KK for eventuelle fejl og mangler ved Anlæggene, herunder eventuelle projekteringsfejl, rådgiverfejl og udførelsesfejl mv.

Når fejl og mangler i forbindelse med 1 års eftersynet er udbedret, og udbedringen er godkendt af KK, overdrager GG sine rettigheder ifølge entrepriseaftalerne og rådgiveraftalerne til KK, herunder garantistillelser og GG er herefter endeligt frigjort over for KK. KK skal således være berettiget til at gøre ethvert mangelkrav gældende direkte mod entreprenøren og rådgiveren. KK vil dog fortsat efter behov kunne indkalde GG til at deltage i et 5 års eftersyn.

§ 6 Garantistillelse

GG stiller senest samtidig med indlevering af ansøgning om byggetilladelse til Byggeprojektet på matr.nr. 4246, 4247, 4248 og 4249 Sundbyøster, København, sikkerhed overfor KK for sine forpligtelser i henhold til denne aftale. Sikkerhedsstillelsen stilles i form af bankgaranti (anfordringsgaranti) fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab.

Et estimat over anlægsomkostningerne inkl. bygherreomkostninger forbundet med GGs forpligtelser i henhold til aftalens § 1 er vedlagt som bilag C. Estimatet lægges til grund ved regningen af sikkerhedens størrelse, medmindre estimatet på tidspunktet for indlevering af byggetilladelse ikke kan anses for retvisende af KK. I så fald udarbejder GG nyt estimat over anlægsomkostningerne inkl. bygherreomkostninger, der attesteres af et rådgivende ingeniørfirma og godkendes af KK.

Garantistillelsen nedskrives til 10 %, når Anlæggene er færdiganlagt og overdraget til KK samt afhjælpning af eventuelle mangler er godkendt af KK.

Når der har været afholdt 1 års eftersyn, og eventuelle mangler er udbedret og udbedringen er godkendt af KK og GG har overdraget sine rettigheder iht. entrepriseaftalerne og rådgiveraftalerne, frigives garantien.

Såfremt Anlæggene afleveres forskudt er KK indforstået med forholdsmæssigt at nedskrive garantistillelsen på ovennævnte vilkår.

§ 7 Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse.

§ 8 Betingelser

Nærværende aftale er fra KKs side betinget af endelig politisk vedtagelse i Borgerrepræsentationen.

Nærværende aftale er fra begge Parter side betinget af, at aftalen vedtages i uændret form i Borgerrepræsentationen samtidig med Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af det tilhørende lokalplanforslag uden væsentlige ændringer af betydning for de til denne aftale knyttede matrikler.

§ 9 Udbud

Parterne har vurderet, at tilbudsloven ikke finder anvendelse og at værdien af bygge- og anlægsarbejderne på nuværende tidspunkt ikke vurderes at overstige tærskelværdien for EU-udbud.

Såfremt det på et senere tidspunkt måtte vise sig, at værdien af bygge- og anlægsarbejderne overstiger tærskelværdien for EU-udbud, er GG forpligtet til at overholde de udbudsretlige regler, som er hjemlet ved Rådets Direktiv 2014/24 (Udbudsdirektivet).

GG forpligter sig til at erstatte ethvert tab, som KK måtte lide som følge af GG's eventuelle overtrædelser af EU-udbudsreglerne, herunder pålagt erstatning til tredjemand, pålagt økonomisk sanktion samt dækning af modparts og egne sagsomkostninger i forbindelse med en sag ved Klagenævnet for Udbud eller en domstol.

§ 10 Overdragelse af forpligtelser

GG kan alene med KK's accept overdrage sine forpligtelser efter nærværende aftale. KK kan alene afvise at meddele accept, såfremt dette er begrundet i relevante forhold af juridisk, økonomisk eller lignende karakter. KK kan begære de oplysninger og den dokumentation fra GG, som er nødvendig til belysning af erhververens forhold.

§ 11 Klage/søgsmål vedrørende plangrundlaget

Påklages de til nærværende aftale knyttede endeligt vedtagne planer, og træffer klageinstansen/domstolene afgørelse om ophævelse af planen, ophæves nærværende aftale mellem parterne.

Træffer klageinstansen/domstolene afgørelse om delvis ophævelse af planen, kan hver part kræve en genforhandling af aftalen, med henblik på, at parterne i videst muligt omfang opnår den retsstilling, som ville være gældende, såfremt lokalplanen fortsat havde været gældende i sin helhed. Fører genforhandlingen ikke til enighed indenfor en periode af 6 måneder regnet fra en parts begæring om genforhandling, er en part alene berettiget til at træde tilbage fra den

Den 12. oktober 2018

del af aftalen, som fortsat vil være væsentligt berørt af den delvise ophævelse af planen, efter at den anden parts genforhandlingstilbud er taget i betragtning.

Såfremt den delvise ophævelse af planen er af et omfang og karakter, som er af væsentlig betydning for aftalen som helhed, kan en part dog træde tilbage fra aftalen i sin helhed.

§ 12 Offentliggørelse

Nærværende aftale offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser herom. Der kan i øvrigt meddeles aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven.

BILAG:

Bilag A: Opfordring af 10. november 2017 fra GG om indgåelse af udbygningsaftale med KK.

Bilag B: Principskitse dateret 11. april 2018.

Bilag C: Estimat af 18. april måned 2018 over omkostninger til Anlæggene inkl. bygherreomkostninger.

København, den

/ - 2018

/ - 2018

GG Development 8 ApS

Københavns Kommune

Christina Aagesen

Fra: Camilla Drachmann Gram [cdg@gefiongroup.com]
Sendt: 10. november 2017 14:10
Til: Jakob Matzen; Mads Laursen
Cc: Thomas W. Færch
Emne: Udbygningsaftale Engvej

Hej Jakob og Mads

I relation til lokalplanen på Engvej samt vores møde i mandags, tilkendegives hermed vores ønske om at indgå en udbygningsaftale med kommunen ang. trafikale forhold omkring vores ejendom.

Hvad er processen herfra i relation til dette?

Med venlig hilsen / Best regards

Camilla Drachmann Gram
Projektudviklingsdirektør / Development Director

M +45 22 27 76 52



Gefion
GROUP

Gefion Group A/S • CVR nr. 3704 2560
Østergade 1, 2. sal • 1100 København K
T +45 70 23 20 20 • gefiongroup.com



Gefion Group

Femøren St.

Udbygningsaftale

Projektoversigt

Status: Skitseprojekt


Udarbejdet: SBP/CM

Målforhold: 1:1000

Dato: 11.04.2018

Bilag nr.:

1

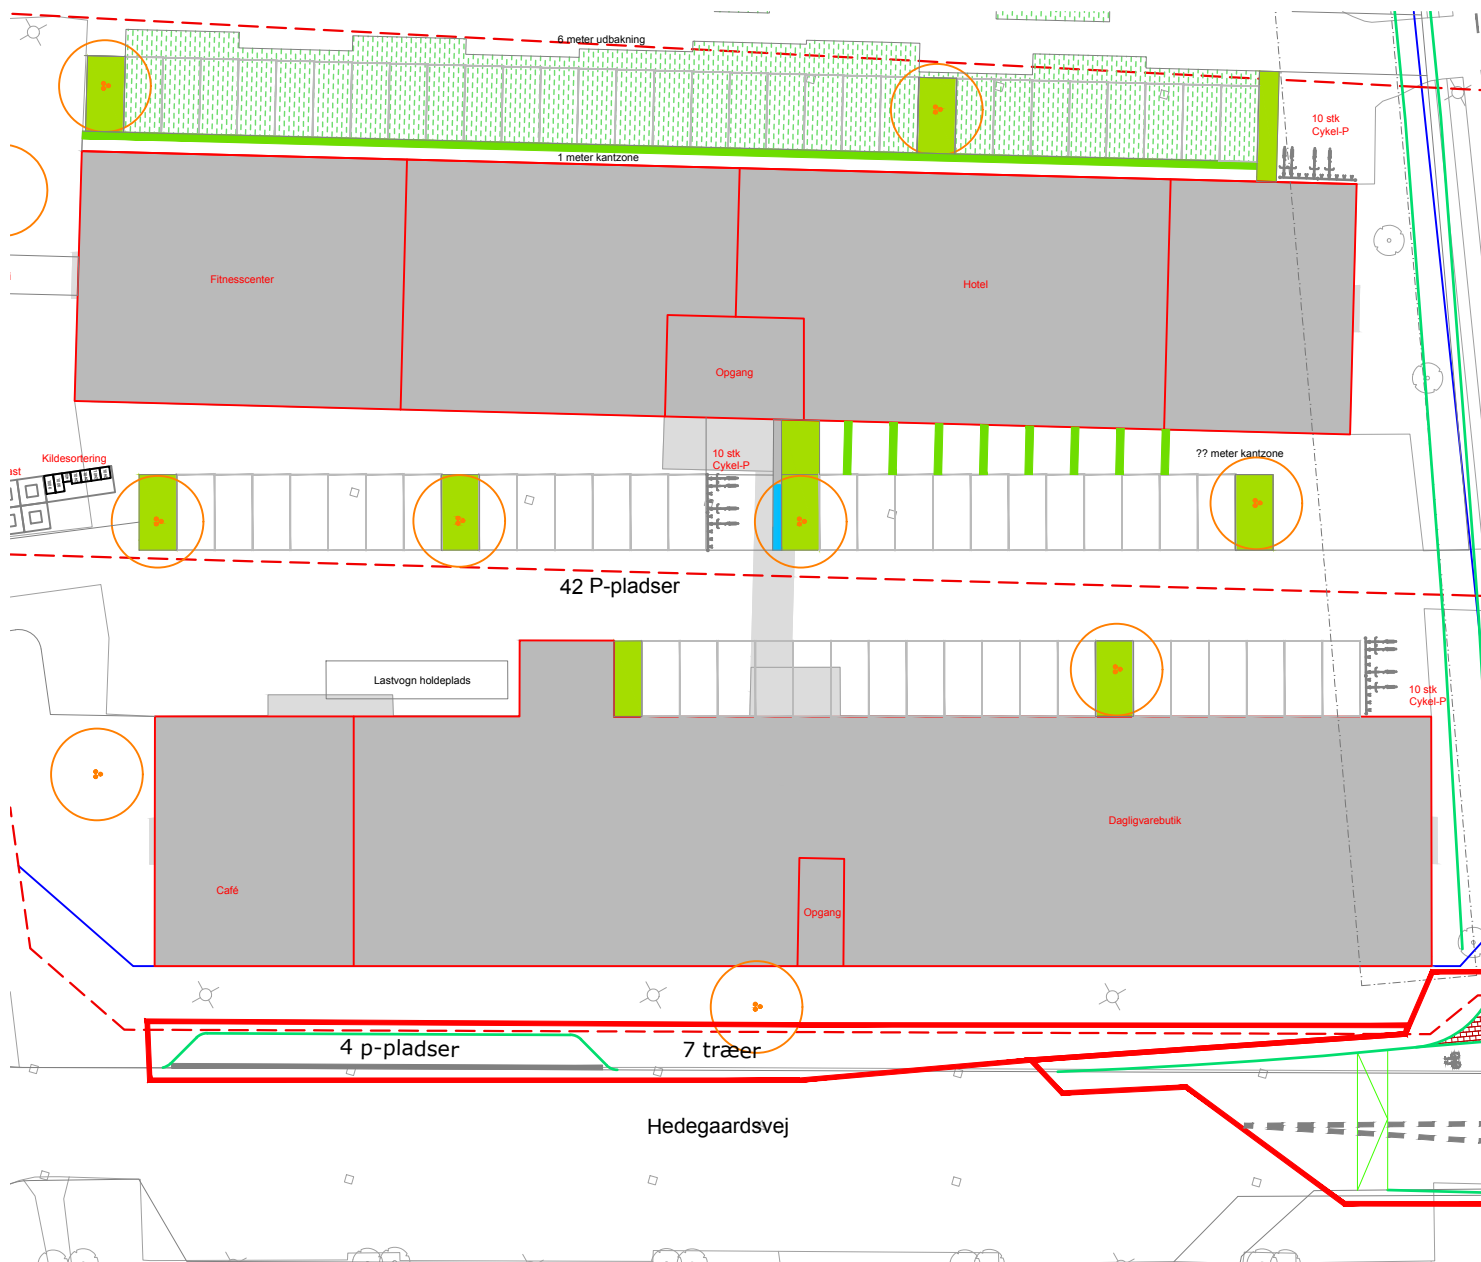


Gefion Group

Femøren St.

Udbygningsaftale - Anlæg 2

Status: Skitseprojekt - Ej til udførelse
 Udarbejdet: SBP/CM
 Målforshold: 1:500
 Dato: 11.04.2018

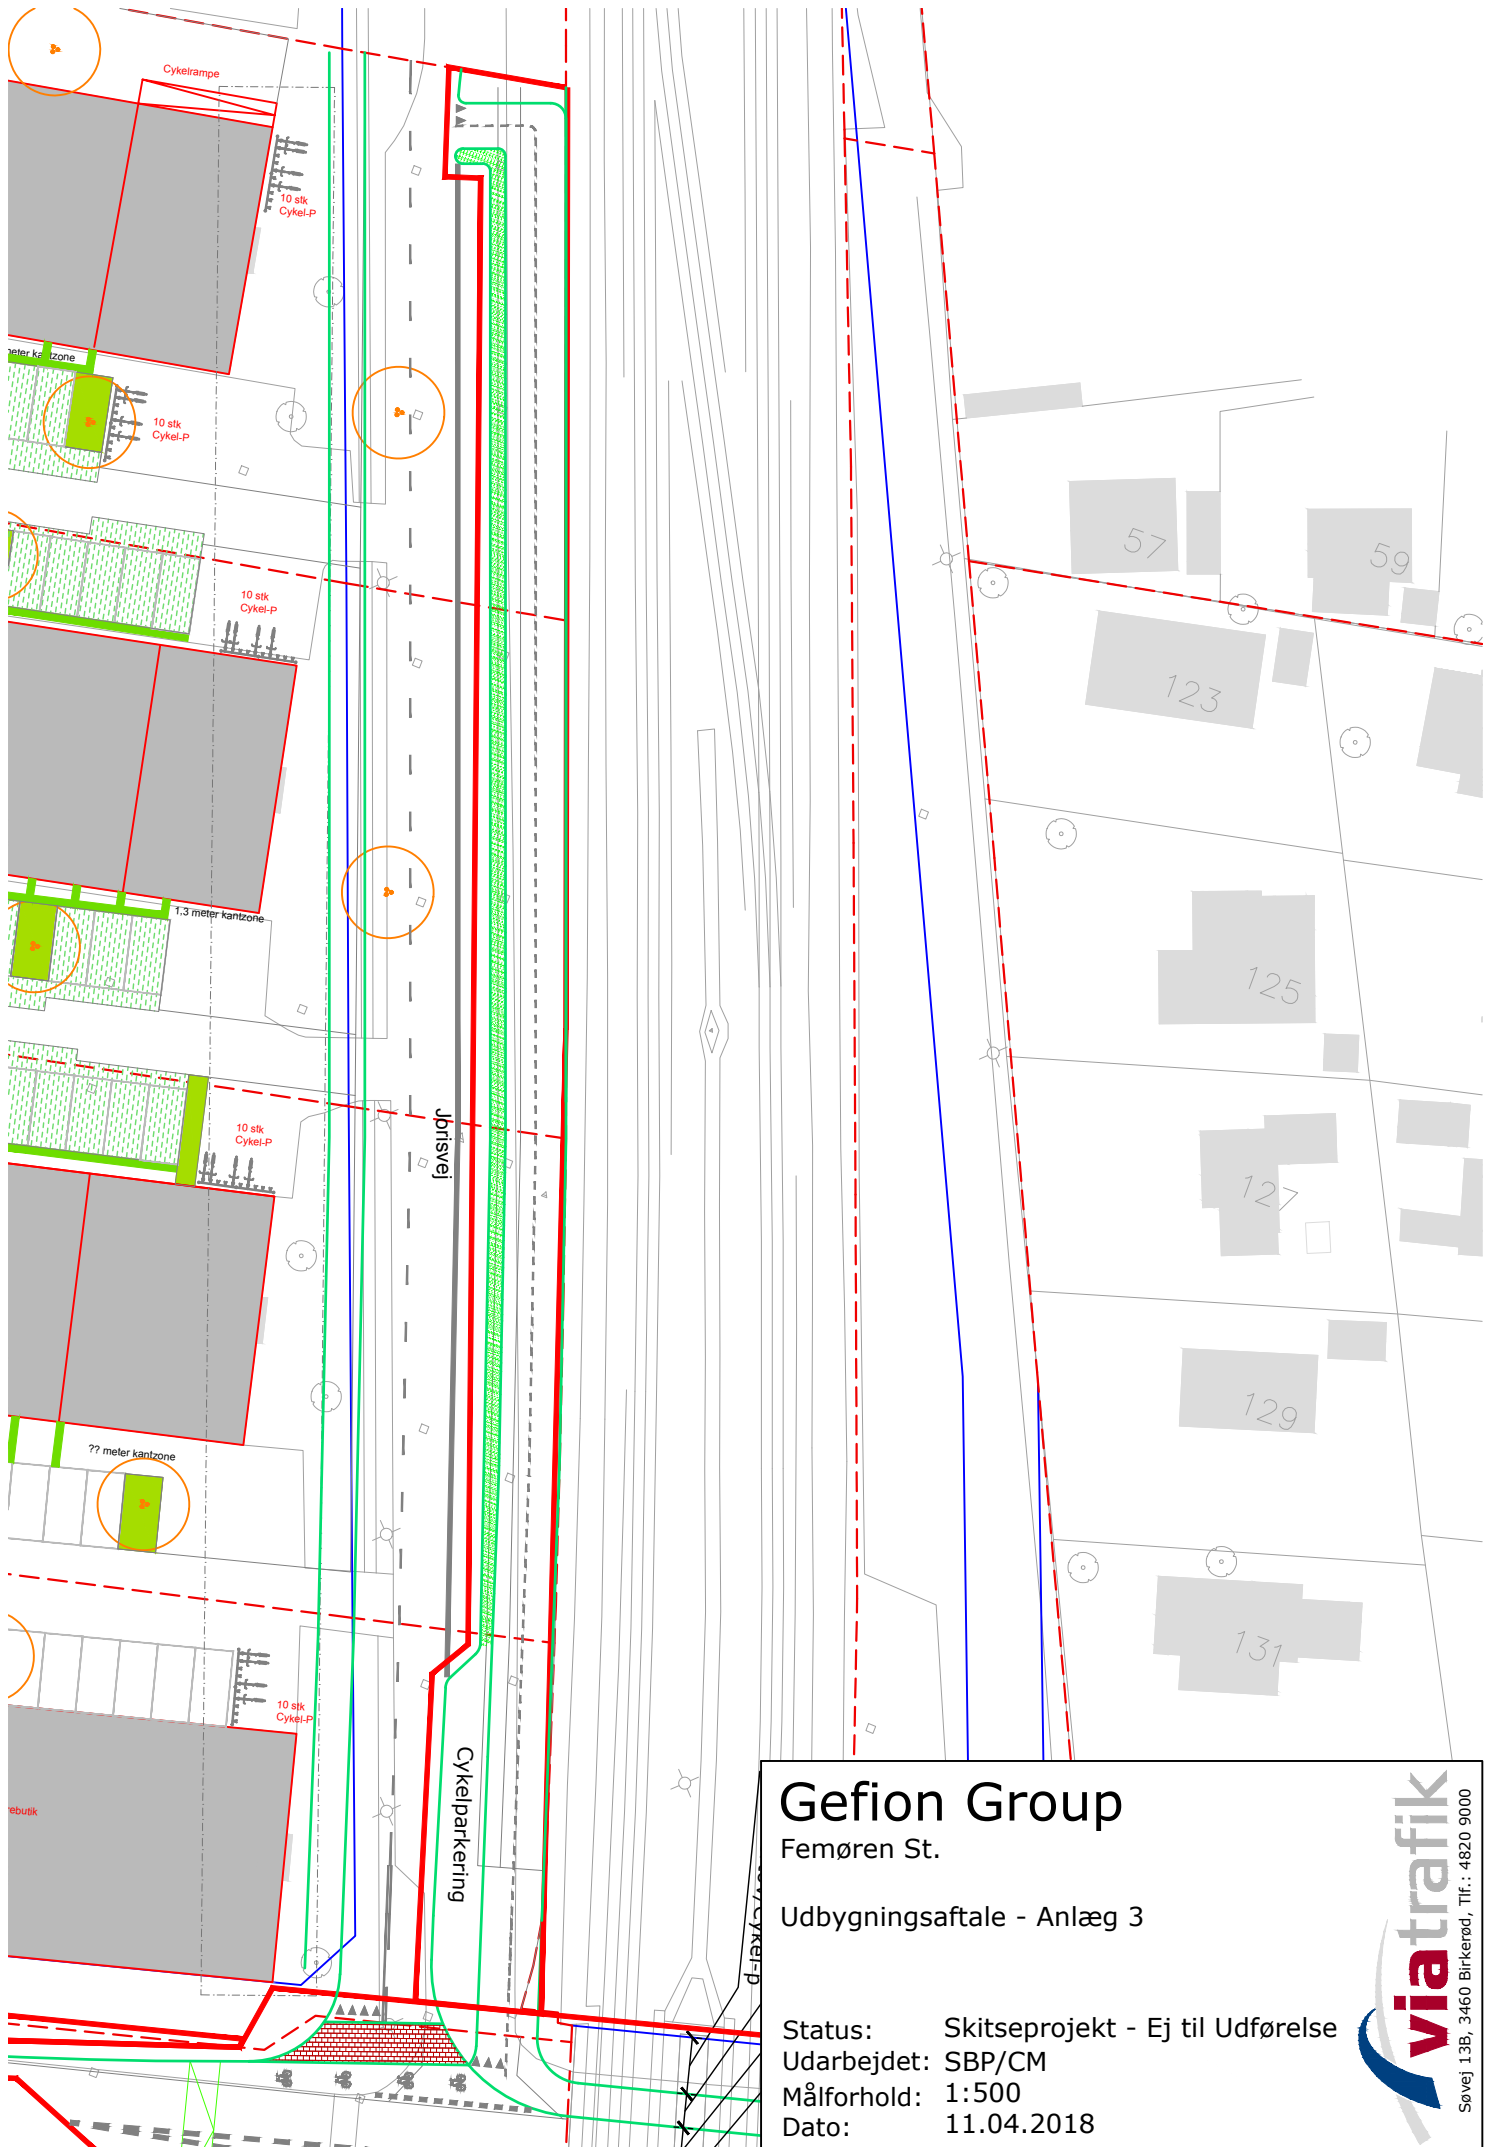

Gefion Group

Femøren St.

Udbygningsaftale - Anlæg 3

Status: Skitseprojekt - Ej til Udførelse

Udarbejdet: SBP/CM

Målforhold: 1:500

Dato: 11.04.2018

Femøren St – Gefion Group

Udbygningsaftale

Anlægsoverslag

NOTAT
18.04.2018
Rev. 05
TQV/DEL

1

Indledning

Overslaget er beregnet ud fra foreliggende skitse udbygningsaftale anlæg 1, 2 og 3.

Priserne er baseret på vore erfaringspriser, prisniveau primo 2018 og indeholder udgifter til arbejdsplads, trafikregulering, opbrydningsarbejder, jordarbejder, vejafvanding, belægningsarbejder, beplantningsarbejder, inventar, afmærkningsmateriel, belysning, rådgivning og opmåling. Alle priser er angivet ekskl. moms.

Notatet indeholder forudsætninger og overslag for udbygningsaftale anlæg 1, 2 og 3. Overslaget er udarbejdet på baggrund af skitser af Via Trafik:

Udbygningsaftale - anlæg 1, dateret d. 11.04.2018

Udbygningsaftale - anlæg 2, dateret d. 11.04.2018

Udbygningsaftale - anlæg 3, dateret d. 11.04.2018

Overslaget tager afsæt i erfaringspriser fra lignende arbejder, og bør regnes igen i takt med at projektet konkretiseres eller yderligere forudsætninger foreligger.

Projektet ligger indenfor kortlagt areal til vidensniveau, V1 og V2. Det betyder, at der er konstateret jordforurening. Erfaringsmæssig skal der udarbejdes en jordhåndteringsplan samt en §8 ansøgning som skal godkendes i både kommunens- og regionens miljøafdelinger. Omfang heraf kendes først i detailprojektfasen, dog kan vi oplyse at behandlingstid hos myndighed ligger på op til 3 måneder.

1.1

Generelle forudsætninger

Følgende indgår IKKE i overslaget

- udgifter til eventuelle forundersøgelser i form af fx miljøundersøgelser, evt. §8 ansøgning eller anden miljøansøgning og geotekniske undersøgelser
- Ledningsomlægninger (el, data, tele, fjernvarme og kloak)
- Nyt slidlag på tilstødende vejarealer, eksisterende kørebaner genanvendes i muligt omfang, dog gøres opmærksom på at asfaltbelægningen på Jorisvej er i elendig forfatning. Udgifter til opretning af denne er ikke indeholdt i anlægsoverslaget.
- Arealerhvervelse.
- Vinterforanstaltninger
- Udskiftning af blødbund
- Bortskaffelse af kraftig forurenet jord i nævneværdigt omfang.

Følgende forudsætninger ligger til grund for overslaget

- At der anvendes standardmaterialer.
- At omkostninger til byggeplads er baseret på at byggepladsen kan anvende nærtliggende arealer uden udgift for bygherre eller entreprenør.
- At der er omkostninger til etablering, flytning og vedligehold af midlertidig afspærring og afmærkning, således at trafikken kan opretholdes på et acceptabelt serviceniveau.
- At overskydende asfalt- og betonmaterialer, herunder fx betonsten bortskaffes til kontrolleret modtagestation.
- At overskudsjord bortskaffes til godkendt modtagestation inklusive modtage- og deponeringsafgift.
- At overskudsjord er i forureningsklasse 2-3.
- At ny afvanding kan tilsluttes eksisterende nærliggende offentligt afvandingsanlæg.
- At eksisterende granitbelægningssten kan genanvendes.
- uforudsigelige udgifter, der normalt udgør omkring 20% på dette planlægningsniveau
- udgifter til opmåling
- rådgivning eller andre projekteringsudgifter

2 Anlægsoverslag

Beregningen omfatter tegningerne anlæg 1,2 og 3, dateret 11. april 2018

2.1 Udgift for anlæg 1 – Krydset Jorisvej/Hedegaardsvej

Det forudsættes, specifikt for dette projekt:

- Der ikke ændres på overkørslen på Hedegaardsvej, øst for broen.

Udgift for anlæg 1	Delaktivitet	Pris i kr. eksklusive moms	
			Sum
Entreprenørudgift	Byggeplads, trafikafvikling, KS mv.	350.000	
	Rydning- opbrydnings- inventar og jordarbejde	230.000	
	Afvandingsarbejder	125.000	
	Asfaltarbejder	450.000	
	Befæstelses- og brolægningssarbejder	330.000	
	Skilte- og afmærkningsarbejder	50.000	
	Belysningsarbejder	150.000	
Sum		1.685.000	
	Uforudsigelige udgifter (~20%)	315.000	
Sum			2.000.000
Andre omkostninger	Ledningsomlægninger	Ikke medregnet	
	Forundersøgelser (miljø- og geoteknik)	Ikke medregnet	
	Opmåling v/ landinspektør	75.000	
	Rådgivning	300.000	
Sum		375.000	
	Uforudsigelige udgifter (20%)	75.000	
			450.000
Total			2.450.000

2.2

Udgift for anlæg 2 – Etablering af p-lomme på Hedegaardsvej

Det forudsættes, specifikt for dette projekt:

- At der ikke skal suppleres yderligere belysning og eksisterende belysning kan sideflyttes
- At arealet fra bagkant fortov til facade ikke indgår i overslaget
- At der ikke reetableres noget fortov.
- Træer leveres i str. 18-20 i stammeomfang. 1 års vedligeholdelse indgår ikke i overslaget.

Udgift for anlæg 2	Delaktivitet	Pris i kr. eksklusive moms	
			Sum
Entreprenørudgift	Byggeplads, trafikafvikling, KS mv.	80.000	
	Rydning- opbrydnings- inventar og jordarbejder	110.000	
	Afvandingsarbejder	40.000	
	Asfaltarbejder	60.000	
	Befæstelses- og brolægningssarbejder	40.000	
	Skilte- og afmærkningsarbejder	10.000	
	Belysningsarbejder	50.000	
	Træer	105.000	
Sum		495.000	
	Uforudsigelige udgifter (~20%)	100.000	
Sum			595.000
Andre omkostninger	Ledningsomlægninger	Ikke medregnet	
	Forundersøgelser (miljø- og geoteknik)	Ikke medregnet	
	Opmåling v/ landinspektør	20.000	
	Rådgivning	80.000	
Sum		100.000	
	Uforudsigelige udgifter (20%)	20.000	
			120.000
Total			715.000

2.3 Udgift for anlæg 3 – Jorisvej

Det forudsættes, specifikt for dette projekt:

- Alle kantsten udføres i kløvet granitmaterialer
- Hævet flade indgår i tegning 1
- At der etableres muldareal i skillerabat og asfalt ved cykelparkering
- Belysningsmaster placeres pr. 30 meter.
- Der udlægges nyt slidlag på dobbeltrettet cykelsti og p-lommen på Jorisvej.

Udgift for anlæg 3	Delaktivitet	Pris i kr. eksklusive moms	
			Sum
Entreprenørudgift	Byggeplads, trafikafvikling, KS mv.	250.000	
	Rydning- opbrydnings- inventar og jordarbejder	215.000	
	Afvandingsarbejder	125.000	
	Asfaltarbejder	350.000	
	Befæstelses- og brolægningssarbejder	230.000	
	Skilte- og afmærkningsarbejder	30.000	
	Belysningsarbejder	200.000	
	Cykelstativ	50.000	
Sum		1.450.000	
	Uforudsigelige udgifter (~20%)	300.000	
Sum			1.750.000
Andre omkostninger	Ledningsomlægninger	Ikke medregnet	
	Forundersøgelser (miljø- og geoteknik)	Ikke medregnet	
	Opmåling v/ landinspektør	75.000	
	Rådgivning	260.000	
Sum		335.000	
	Uforudsigelige udgifter (~20%)	65.000	
			400.000
Total			2.150.000

2.4 Samlet overslag

Samlet udgifter for anlæg 1,2 og 3	Delaktivitet	Pris i kr. eksklusive moms	
			Sum
	Udbygningsaftale - anlæg 1	2.450.000	
	Udbygningsaftale - anlæg 2	715.000	
	Udbygningsaftale - anlæg 3	2.150.000	
Total			5.315.000
